



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksp47@ksplo.ru

06.12.2023 № 01-23-11/2023

На № _____ от _____

Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенину


Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 9 областного закона от 14.10.2011 № 77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений государственных учреждений среднего профессионального образования (на выборочной основе)».

Приложение: Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений государственных учреждений среднего профессионального образования (на выборочной основе)» с приложениями на 97 л. (с оборотом), в 1 экз.

С уважением,

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области




М.А. Ляхова

Ларина Наталья Леонидовна (812) 272-37-33, 3515

«Утверждаю»

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М.А. Ляхова

«04» декабря 2023 г.

**Заключение о результатах
экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования
средств областного бюджета Ленинградской области, направленных
в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений
государственных учреждений среднего профессионального
образования (на выборочной основе)»**

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Постановление Законодательного собрания Ленинградской области
от 09.11.2022 № 556.

Пункт 12 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана
работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2023 год,
утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской
области от 16.12.2022 № 01-09-53.

Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
от 01.03.2023 № 01-13-10.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Средства областного бюджета Ленинградской области, направленные
в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений
государственных учреждений среднего профессионального образования
(на выборочной основе).

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской
области, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и
сооружений государственных учреждений среднего профессионального
образования (на выборочной основе).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
- государственные учреждения среднего профессионального образования (на выборочной основе).

Исследуемый период:

2020 – 2022 годы.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 03 апреля 2023 года по 01 декабря 2023 года, в том числе:

с 17 по 20 июля 2023 года, с 10 по 11 октября 2023 года с выездом на объект: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум»;

с 18 по 28 июля 2023 года с выездом на объект: комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

В ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений государственных учреждений среднего профессионального образования (на выборочной основе)» (далее – ЭАМ, Мероприятие) был проведен анализ общего объема средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020-2022 годах (далее – исследуемый период) на ремонт и содержание зданий и сооружений государственных автономных и бюджетных учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области (далее – ГАБУ ЛО СПО), исследованы процедуры определения объема и предоставления средств на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, достаточность правового регулирования указанных процедур, соблюдение законодательства при использовании средств областного бюджета Ленинградской области, направленных на ремонт зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, проведена оценка качества контроля комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет) за использованием средств, направленных в исследуемом периоде ГАБУ ЛО СПО на ремонт и содержание зданий и сооружений.

Перечень исследованных в ходе Мероприятия материалов приведен в приложении 1 к заключению.

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о Комитете¹ Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя подведомственных государственных организаций Ленинградской области в соответствии с Порядком осуществления органами исполнительной власти Ленинградской области функций и полномочий учредителя государственного учреждения Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 13.07.2011 № 211. В исследуемом периоде Комитет осуществлял функции и полномочия учредителя 25 (с 30.04.2021 – 23) ГАБУ ЛО СПО.

Так, до 30.04.2021 Комитет в исследуемом периоде осуществлял функции и полномочия учредителя государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ленинградской области (далее – ГБПОУ ЛО) «Волховский колледж транспортного строительства» (далее – ГБПОУ ЛО «ВКТС»), «Волховский алюминиевый колледж» (далее – ГБПОУ ЛО «ВАК») и «Волховский политехнический техникум» (далее – ГБПОУ ЛО «ВПТ»).

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.10.2019 № 733-р ГБПОУ ЛО «ВКТС» реорганизовано путем присоединения к нему ГБПОУ ЛО «ВАК» и ГБПОУ ЛО «ВПТ» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ² 30.04.2021). В соответствии с распоряжением Комитета от 04.03.2021 № 501-р ГБПОУ ЛО «ВКТС» переименовано в ГБПОУ ЛО «Волховский многопрофильный техникум» (далее – ГБПОУ ЛО «ВМТ», Волховский многопрофильный техникум, Учреждение).

Указанные изменения отражены в Изменениях в Устав Учреждения, утвержденных распоряжением Комитета от 06.07.2021 № 1902-р. Запись о внесении изменений в ЕГРЮЛ внесена 14.07.2021.

В исследуемом периоде на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО были предусмотрены средства областного бюджета Ленинградской области в общей сумме 1 081 371,5 тыс. руб., в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»³ и «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»⁴ в сумме 1 027 931,5 тыс. руб. и 53 440,0 тыс. руб. соответственно (распределение данных средств по перечисленным государственным программам Ленинградской области приведено на диаграмме 1).


¹ Положение о комитете общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 06.03.2017 № 47.

² Единый государственный реестр юридических лиц.

³ Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 (далее – государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»), где Комитет является ответственным исполнителем государственной программы.

⁴ Государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406 (далее – государственная программа Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»), где Комитет является участником государственной программы.

диаграмма 1

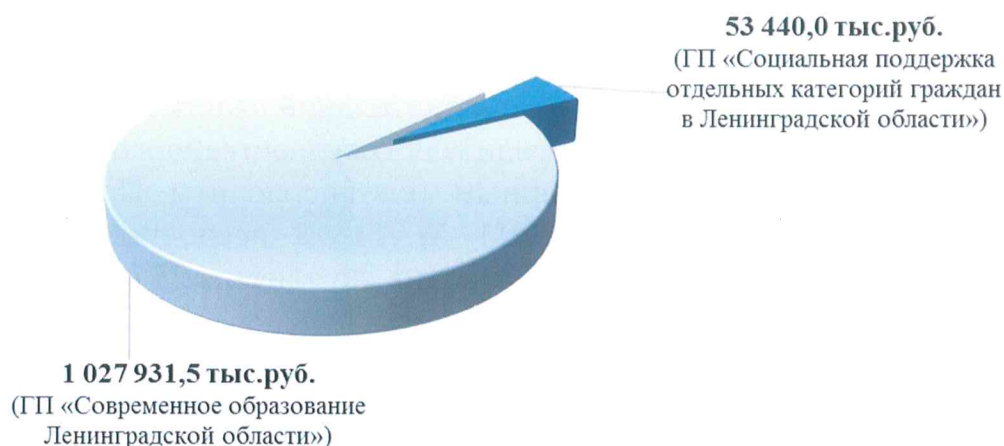

Из них:

- в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» (в разрезе лет):

в 2020-2021 гг. - мероприятия «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» - в сумме:

- в 2020 году – 418 475,0 тыс. руб.;
- в 2021 году – 291 175,1 тыс. руб.;

в 2022 году – комплекса мероприятий, направленного на повышение уровня материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, в том числе осуществление ремонтных работ в организациях профессионального образования и капитального ремонта спортивных сооружений и стадионов; оснащение оборудованием, комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы II «Обеспечение условий развития современного образования в Ленинградской области» в сумме 318 281,4 тыс. руб.;

- в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» (в разрезе лет):

в 2020-2021 гг. – основного мероприятия «Мероприятия по приспособлению объектов для доступа инвалидов и маломобильных групп населения» подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» в сумме:

- в 2020 году - 18 000,0 тыс. руб.;
- в 2021 году - 16 720,0 тыс. руб.;

в 2022 году – мероприятий по приспособлению объектов социальной сферы для доступа инвалидов комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов»

подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области» в сумме 18 720,0 тыс. руб.

Информация о финансировании в 2020 – 2022 гг. государственных программ Ленинградской области приведена на диаграммах 2 и 3.

диаграмма 2

ГП «Современное образование
Ленинградской области»





диаграмма 3

(тыс. руб.)

ГП «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Ленинградской
области»

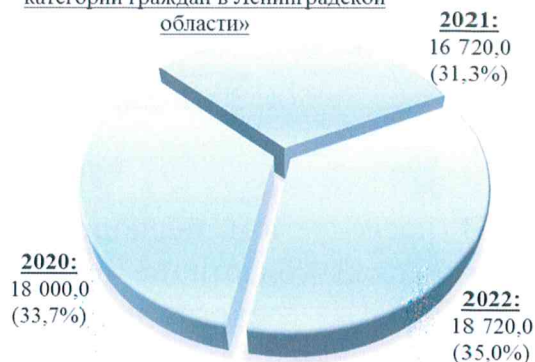

Исполнение Комитетом расходов областного бюджета Ленинградской области на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 2020-2021 гг. составило 100,0%, в 2022 г. - 99,3% (316 070,3 тыс. руб.), что обусловлено возвратом ГАБУ ЛО СПО в Комитет остатков средств субсидий, образовавшихся за счет экономии по результатам проведенных конкурсных процедур, на основании дополнительных соглашений об уменьшении размеров предоставленных субсидий на иные цели.


Исполнение Комитетом расходов областного бюджета Ленинградской области на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 2020-2022 гг. составило 100,0%.

Информация об утвержденных и исполненных Комитетом в 2020-2022 гг. объемах расходов областного бюджета Ленинградской области на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО в разрезе вышеперечисленных государственных программ и направлений расходования⁵ представлена в приложении 2 к заключению, а также на диаграмме 4.

⁵ Отражаемых по дополнительным кодам расходов (доп. КР).

Диаграмма 4

(тыс. руб.)

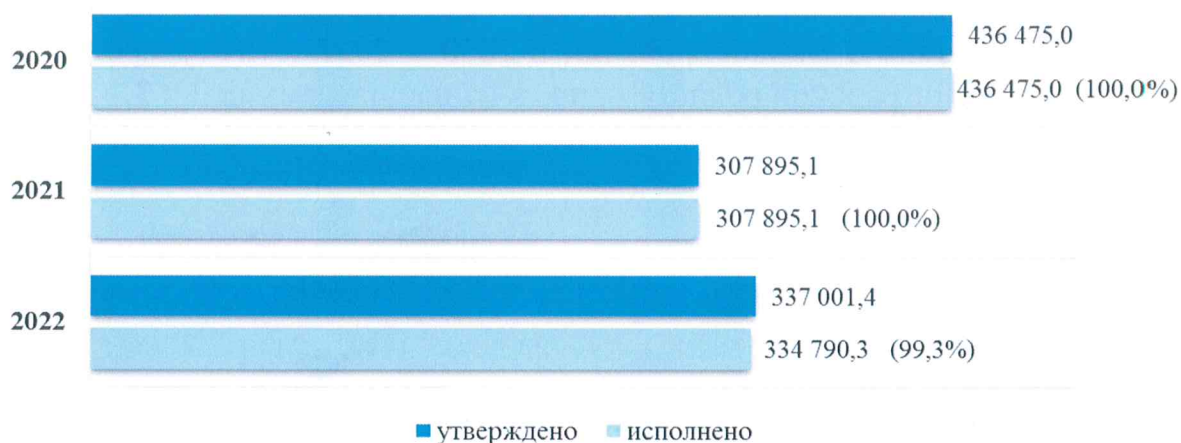

В исследуемом периоде предусмотренные в областном бюджете Ленинградской области на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО средства предоставлялись Комитетом ГАБУ ЛО СПО в форме субсидий на иные цели (далее – СИЦ), информация о предоставленных СИЦ в разрезе лет исследуемого периода, ГАБУ ЛО СПО и заключенных соглашениях представлена в приложении 3 к заключению.


В 2020 году Комитетом с ГАБУ ЛО СПО были заключены 48 соглашений о предоставлении СИЦ на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО (далее – СИЦ РС) на общую сумму 436 475,0 тыс. руб., из них:

– в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» - 10 соглашений на общую сумму 18 000,0 тыс. руб.,

– в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» - 38 соглашений на общую сумму 418 475,0 тыс. руб. (информация о предоставленных СИЦ РС и заключенных соглашениях представлена на диаграмме 5).

диаграмма 5

(тыс. руб.)

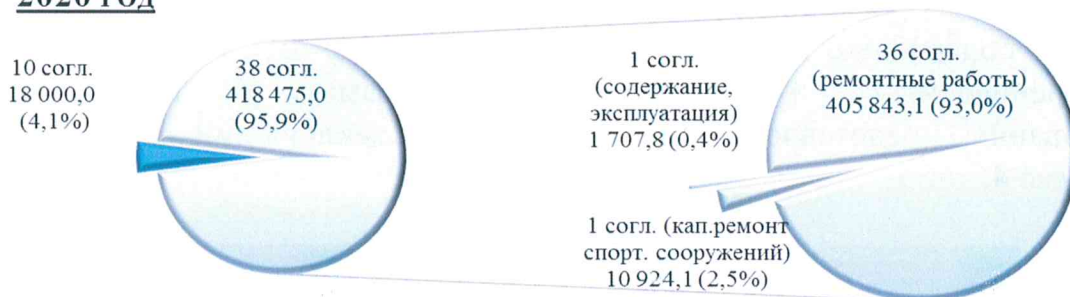2020 год

- ГП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
- ГП «Современное образование Ленинградской области»

В 2021 году Комитетом с ГАБУ ЛО СПО были заключены 35 соглашений о предоставлении СИЦ РС на общую сумму 307 895,1 тыс. руб., из них:


в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» - 9 соглашений на общую сумму 16 720,0 тыс. руб.,

в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» - 26 соглашений на общую сумму 291 175,1 тыс. руб. (информация о предоставленных в 2021 году СИЦ РС и заключенных соглашениях представлена на диаграмме 6).

диаграмма 6

(тыс. руб.)

2021 год

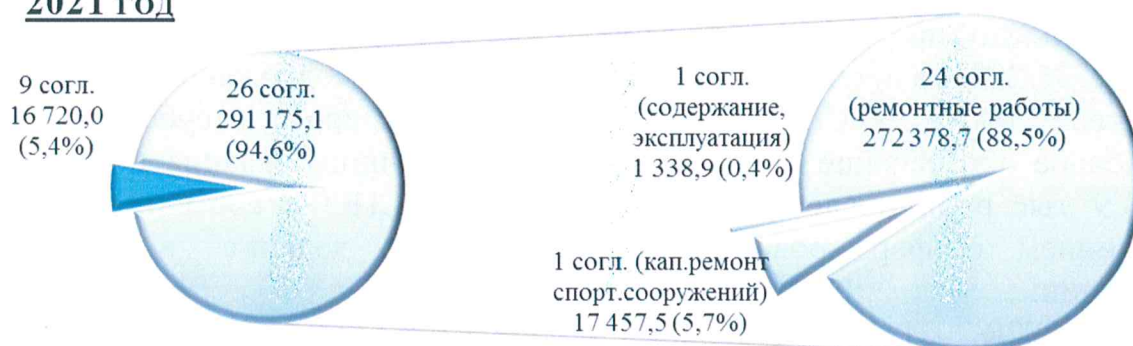

- ГП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
- ГП «Современное образование Ленинградской области»


В 2022 году Комитетом с ГАБУ ЛО СПО были заключены 33 соглашения о предоставлении СИЦ РС на общую сумму 334 790,3 тыс. руб., из них:

в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» - 7 соглашений на общую сумму 18 720,0 тыс. руб.,

в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» - 26 соглашений на общую сумму 316 070,3 тыс. руб. (информация о предоставленных ГАБУ ЛО СПО в 2022 году СИЦ и заключенных соглашениях представлена на диаграмме 7).

диаграмма 7

(тыс. руб.)

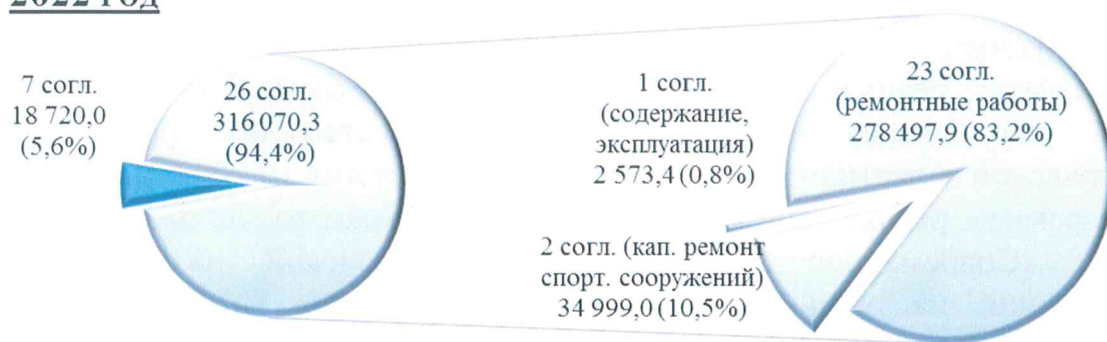2022 ГОД

- ГП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»
- ГП «Современное образование Ленинградской области»

Согласно представленной Комитетом информации от 28.04.2023 № 03-12836/2023⁶ в проверяемом периоде на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО также были направлены средства субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 33 043,9 тыс. руб., предоставленных ГАБУ ЛО СПО в соответствии с Положением о формировании государственного задания⁷ в рамках реализации:

- в 2020-2021 гг. - основного мероприятия «Обеспечение баланса спроса и предложений на профессиональное образование» подпрограммы VI «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»;

- в 2022 году - комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ профессионального образования» подпрограммы II «Обеспечение условий развития современного образования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

Анализ объемов предоставленных и израсходованных субсидий ГАБУ ЛО СПО в 2020-2022 гг.⁸ свидетельствует о следующем.

В 2020 году общий объем субсидий ГАБУ ЛО СПО составил 2 670 882,5 тыс. руб., из них 1 654 712,1 тыс. руб., или 62,0%, составили субсидии на выполнение государственного задания и 1 016 170,4 тыс. руб., или 38,0%, - СИЦ.

Доля СИЦ РС, предоставленных Комитетом ГАБУ ЛО СПО, составила 16,3 % (436 475,0 тыс. руб.) в общем объеме субсидий и 43,0% в общем объеме СИЦ.

⁶ Вх. № 01-18-53/2023-0-1 от 02.05.2023.

⁷ Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543.

⁸ Приведен в приложении 4 к заключению.

Информация о предоставленных ГАБУ ЛО СПО в 2020 году СИЦ в разрезе целей предоставления представлена на диаграмме 8⁹.

диаграмма 8

(тыс. руб.)

2020 год



В 2021 году общий объем субсидий ГАБУ ЛО СПО составил 2 576 470,3 тыс. руб., из них 1 754 316,6 тыс. руб., или 68,1%, составили субсидии на выполнение государственного задания и 822 153,7 тыс. руб., или 31,9%, - СИЦ.


Доля СИЦ РС, предоставленных Комитетом ГАБУ ЛО СПО, составила 12,0 % (307 895,1 тыс. руб.) в общем объеме субсидий и 37,4 % в общем объеме СИЦ.

Информация о предоставленных ГАБУ ЛО СПО в 2021 году СИЦ в разрезе целей предоставления представлена на диаграмме 9.

диаграмма 9

(тыс. руб.)

2021 год



В 2022 году общий объем субсидий ГАБУ ЛО СПО составил 2 712 228,5 тыс. руб., из них 1 809 782,3 тыс. руб., или 66,7%, составили субсидии на выполнение государственного задания и 902 446,2 тыс. руб., или 33,3%, - СИЦ.

⁹ Сокращения в диаграммах: СГЗ – субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; ГБУ – государственные бюджетные учреждения; ГАУ – государственные автономные учреждения, «иное» - иные направления расходования СИЦ, не относящиеся к содержанию имущества и проведению ремонтных работ.


Доля СИЦ РС, предоставленных Комитетом ГАБУ ЛО СПО, составила 12,3% (334 790,3 тыс. руб.) в общем объеме субсидий и 37,1 % в общем объеме СИЦ.

Информация о предоставленных ГАБУ ЛО СПО в 2022 году СИЦ в разрезе целей предоставления представлена на диаграмме 10.

диаграмма 10

(тыс. руб.)

2022 год

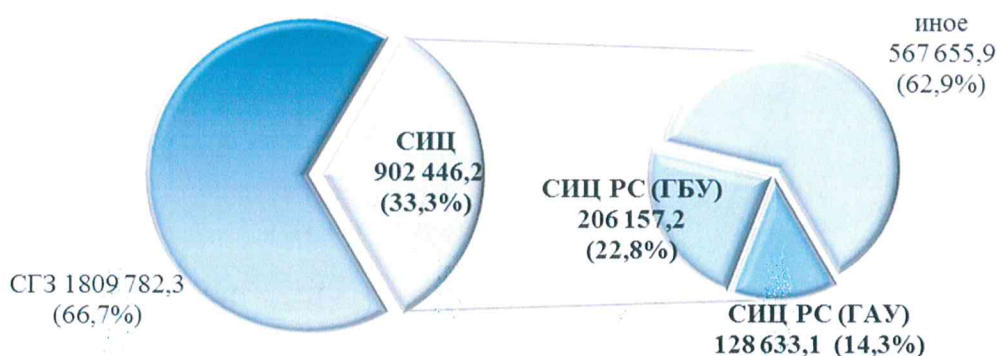

Таким образом, можно сделать вывод, что в исследуемом периоде сложилась тенденция сокращения доли СИЦ РС в общем объеме предоставленных СИЦ (в 2020 году – 43,0 %, в 2021 году – 37,4 %, в 2022 году – 37,1 %).

Информация об использовании ГАБУ ЛО СПО субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели в разрезе ГАБУ ЛО СПО и по годам представлена на диаграммах 11-13.

диаграмма 11

(тыс. руб.)

2020 год

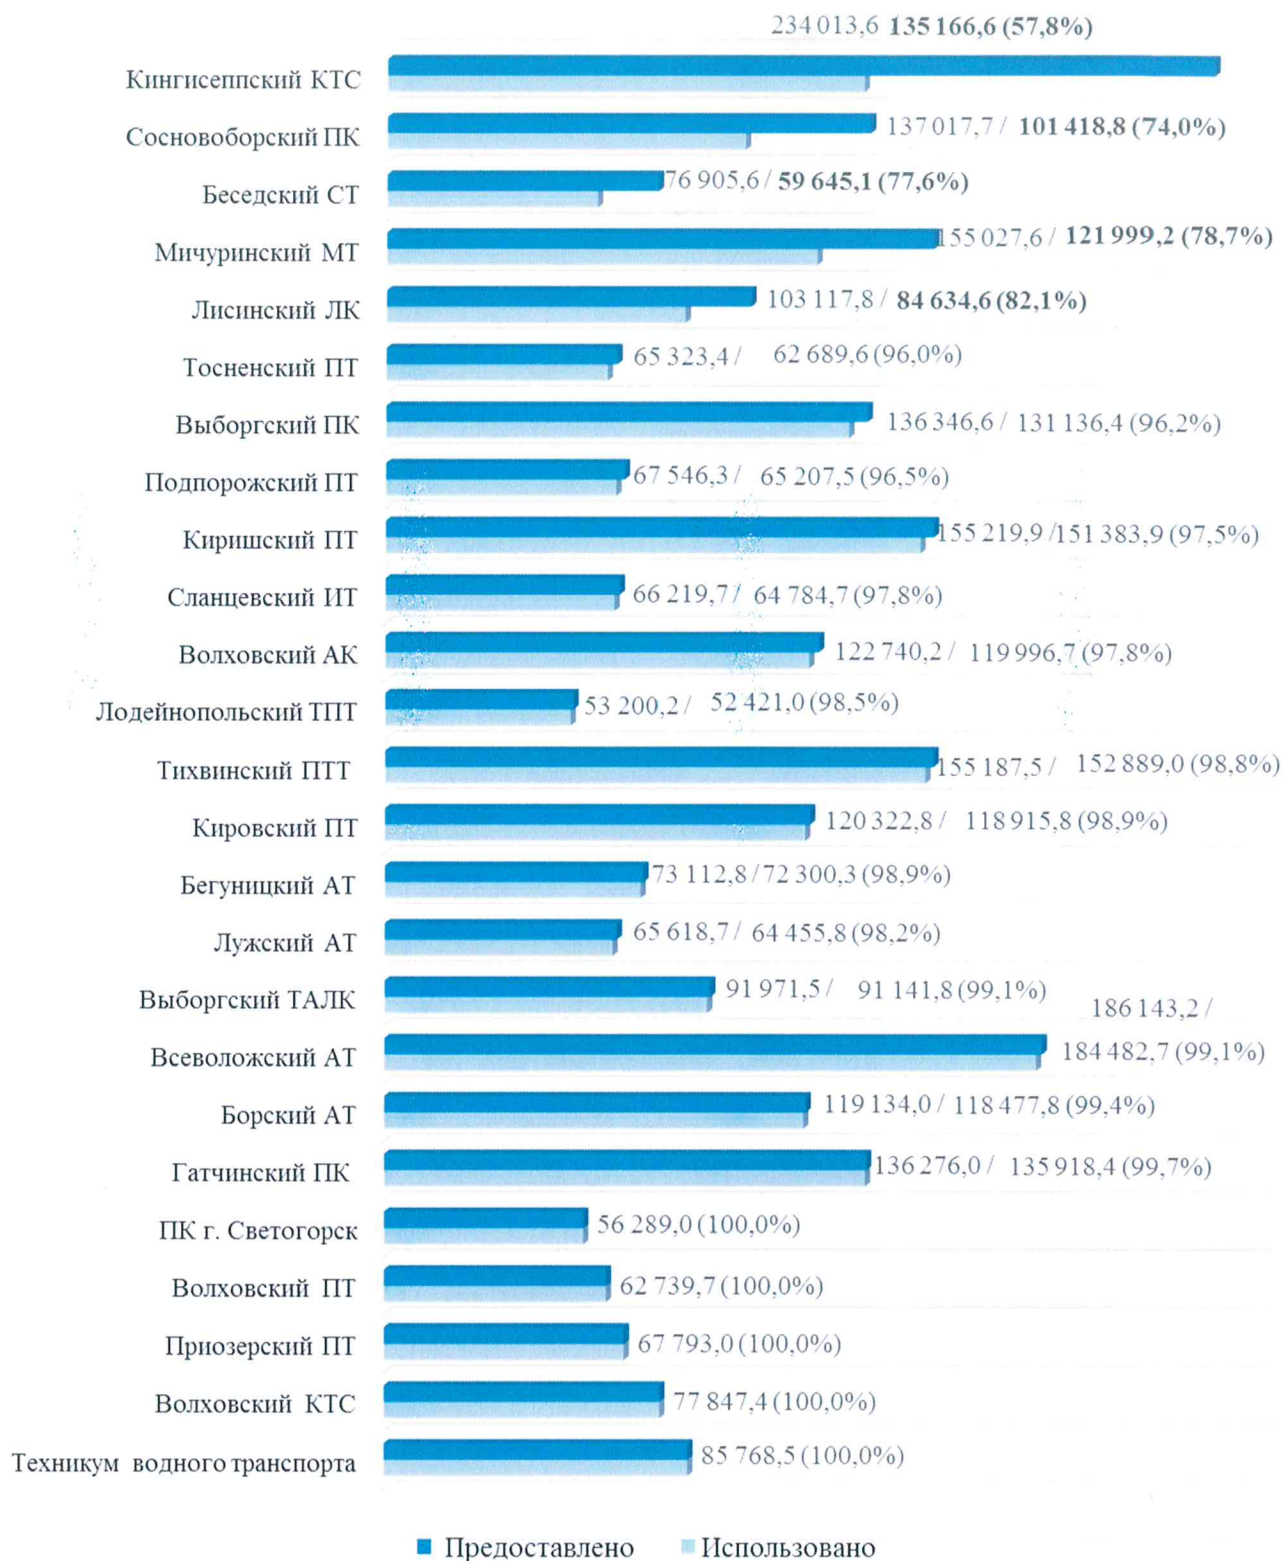


диаграмма 12

(тыс. руб.)

2021 год


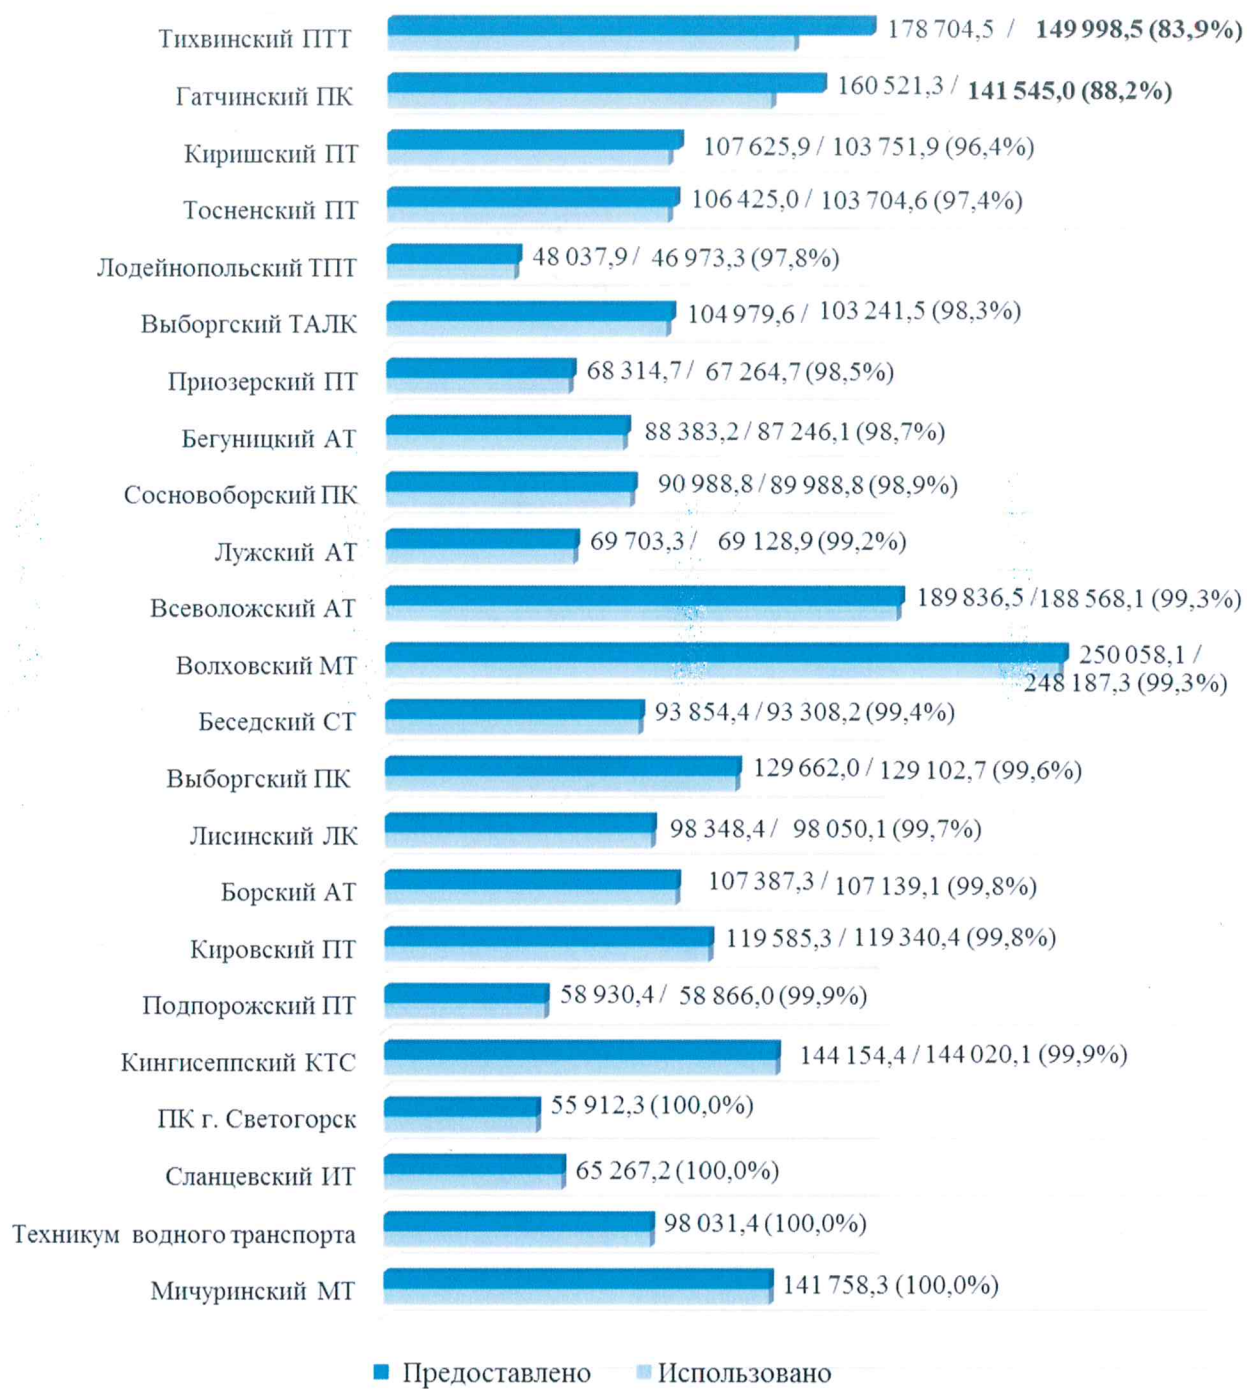


диаграмма 13

(тыс. руб.)


2022 год

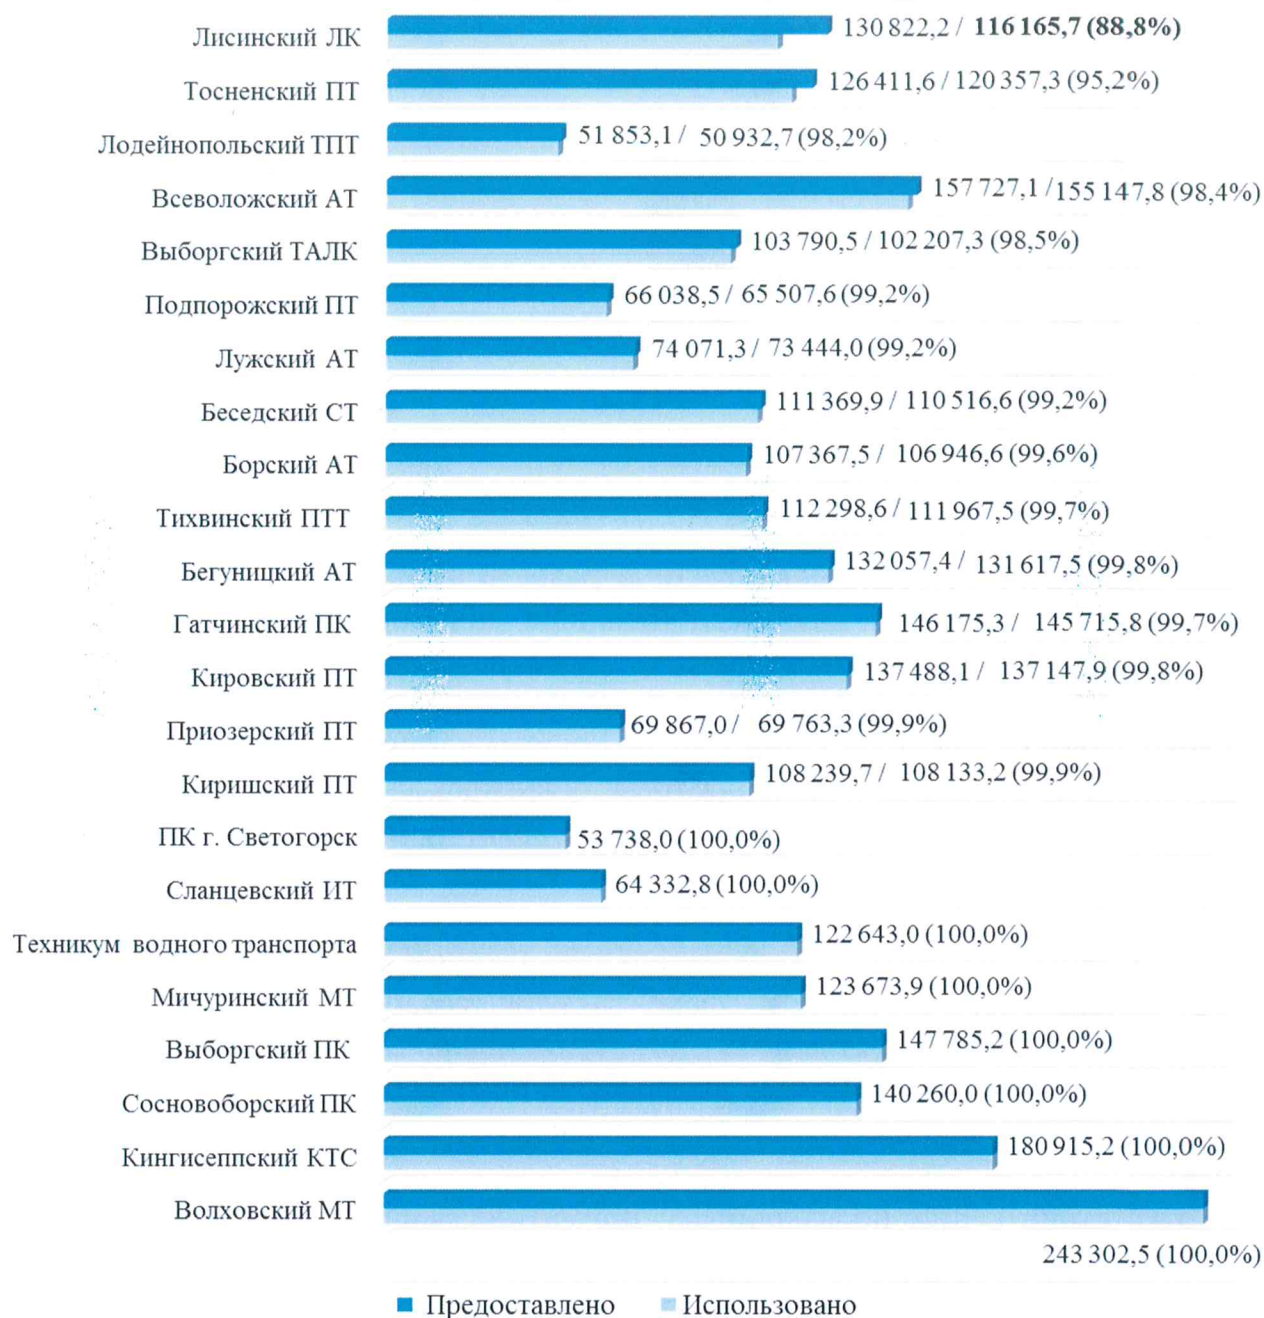

Обращает на себя внимание низкий уровень расходования в 2020 году ГАБУ ЛО СПО предоставленных им в 2020 году СИЦ РС (64,6 %), в 2021 и 2022 гг. ГАБУ ЛО СПО обеспечено расходование 85,5 % и 98,4 % предоставленных им СИЦ РС (анализ представлен на диаграмме 14).

диаграмма 14

(тыс. руб.)

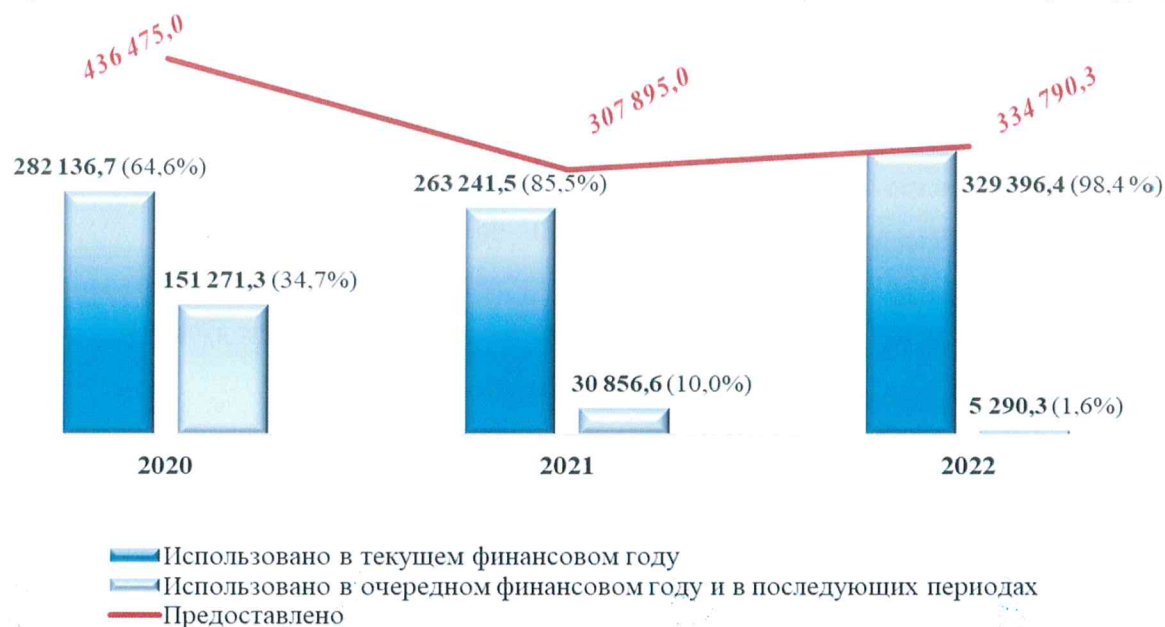

Соответствующие показатели в разрезе автономных и бюджетных учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области могут свидетельствовать о более высоком уровне финансовой дисциплины и мотивации расходования СИЦ РС в целом у автономных учреждений (уровень расходования не снижался ниже 76,1 %, а в 2022 году достиг 99,9 %), тогда как бюджетные учреждения в 2020 году в целом направили на ремонт и содержание зданий и сооружений 49,8 % предоставленных им средств, в 2021 и 2022 гг. – 88,5 % и 97,4 % соответственно.

Следует отметить, что Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), который, за исключением части 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, не распространяет свое действие на осуществление закупок автономными учреждениями, и принятыми в соответствии с ним подзаконными нормативными актами урегулирована большая часть вопросов в сфере закупок по сравнению с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно которому полномочиями по регулированию значительной части указанных вопросов наделены непосредственно заказчики¹⁰, что может повлиять на количество


¹⁰ В частности, как следует из части 2 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчиком самостоятельно устанавливаются правила, регулирующие порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок конкурентными способами, порядок и

осуществленных в течение текущего финансового года закупок и, соответственно, на объем использованных средств.

Информация об исполнении ГАБУ ЛО СПО предоставленных им в 2020-2022 гг. СИЦ РС в разрезе автономных и бюджетных учреждений представлена на диаграмме 15.

диаграмма 15

(тыс. руб.)

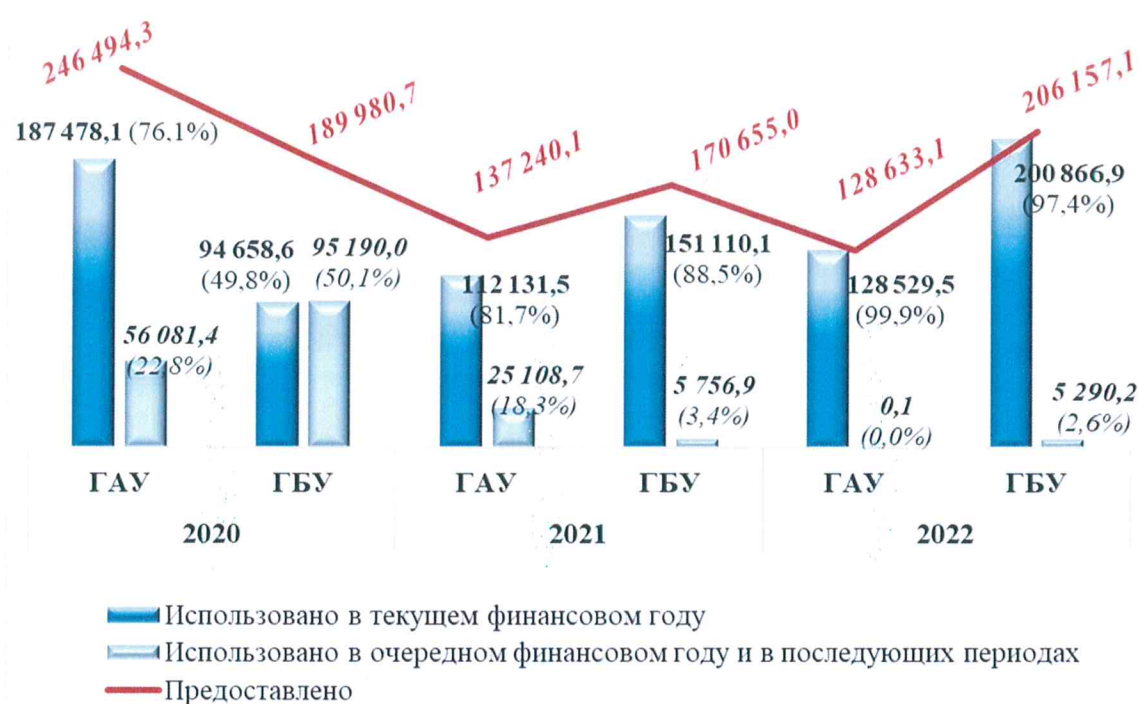

В то же время детальный анализ в разрезе учреждений показывает, что в отдельных автономных учреждениях среднего профессионального образования Ленинградской области доля СИЦ РС в объеме предоставленных СИЦ в 2020 году, а также уровень использования СИЦ РС в 2020 году ниже среднего показателя.

Так, ниже всего данные показатели – в ГБПОУ ЛО «Техникум водного транспорта» (10,7 %), Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области (далее – ГАПОУ ЛО) «Лужский агропромышленный техникум» (17,0 %), ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж» (22,0 %), выше всего – в ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» (74,8%) и ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» (70,7 %). При этом первые три ГАБУ ЛО СПО полностью израсходовали полученные средства, тогда как у ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» и ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» сложился низкий уровень расходования предоставленных им СИЦ – 27,2 % и 33,1 %. Также в 2020 году ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум», ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ ЛО «Мичуринский



условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

многопрофильный техникум» не обеспечили использование предоставленных СИЦ РС (0 %), кроме того, отмечаются низкие показатели расходования СИЦ РС у ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» - 45,7 % от предоставленных СИЦ и ГБПОУ ЛО, «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» - 45,8 %.

Подробная информация об исполнении в 2020 году ГАБУ ЛО СПО предоставленных им в 2020 году СИЦ РС представлена на диаграмме 16.

диаграмма 16

(тыс. руб.)

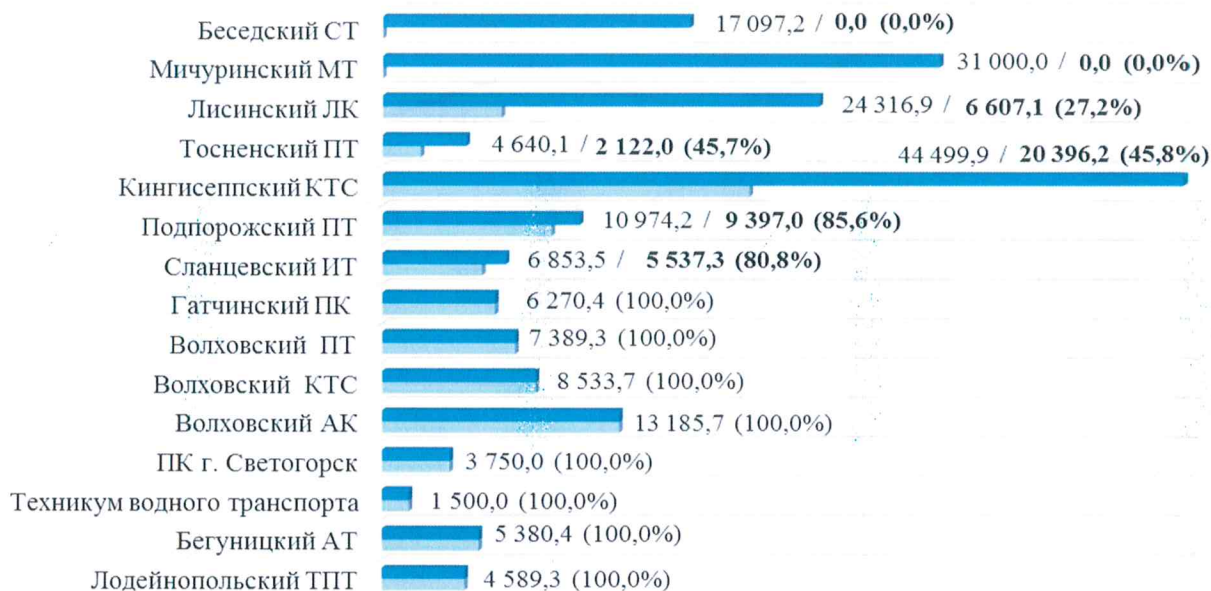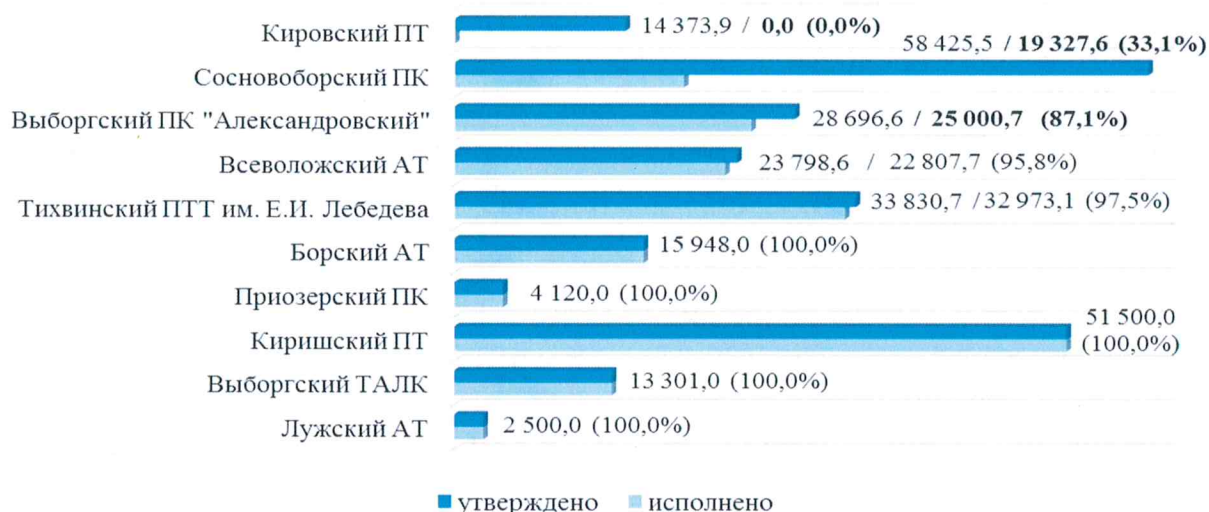ГБУ**ГАУ**



В 2021 году доля СИЦ РС в объеме предоставленных СИЦ ниже всего в ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» (3,1 %), в ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» (8,4 %), выше - ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» (74,9 %), ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум»

им. Е.И. Лебедева» (60,7 %), ГБПОУ ЛО «Политехнический колледж» г. Светогорск (60,6 %). Низкие показатели использования предоставленных СИЦ РС у ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» (30,2 %), ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» (61,4 %) и ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» (66,7 %).

Подробная информация об исполнении в 2021 году ГАБУ ЛО СПО предоставленных им в 2021 году СИЦ РС представлена на диаграмме 17.

диаграмма 17

(тыс. руб.)

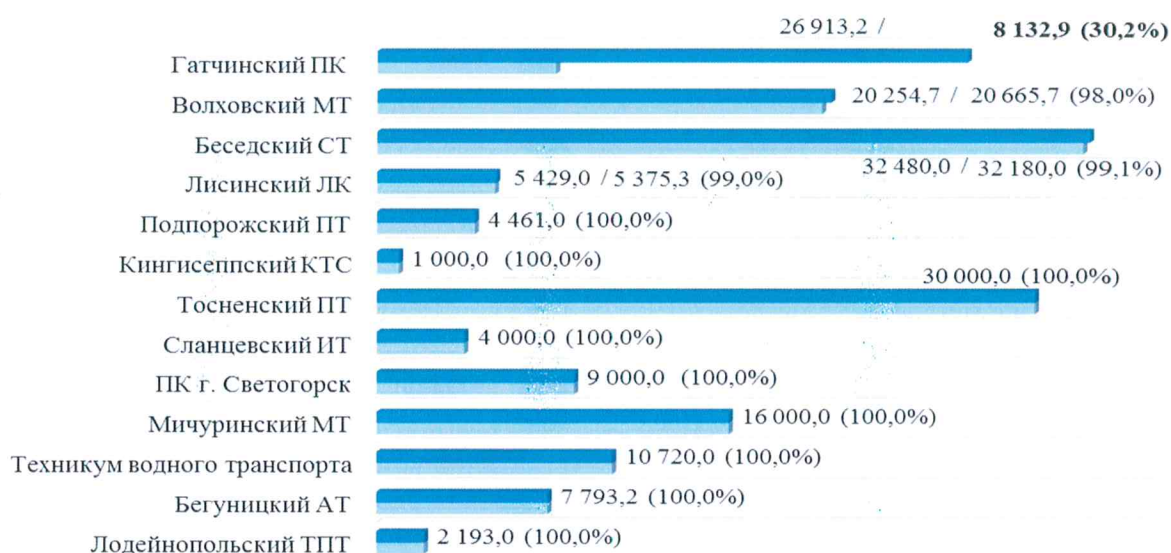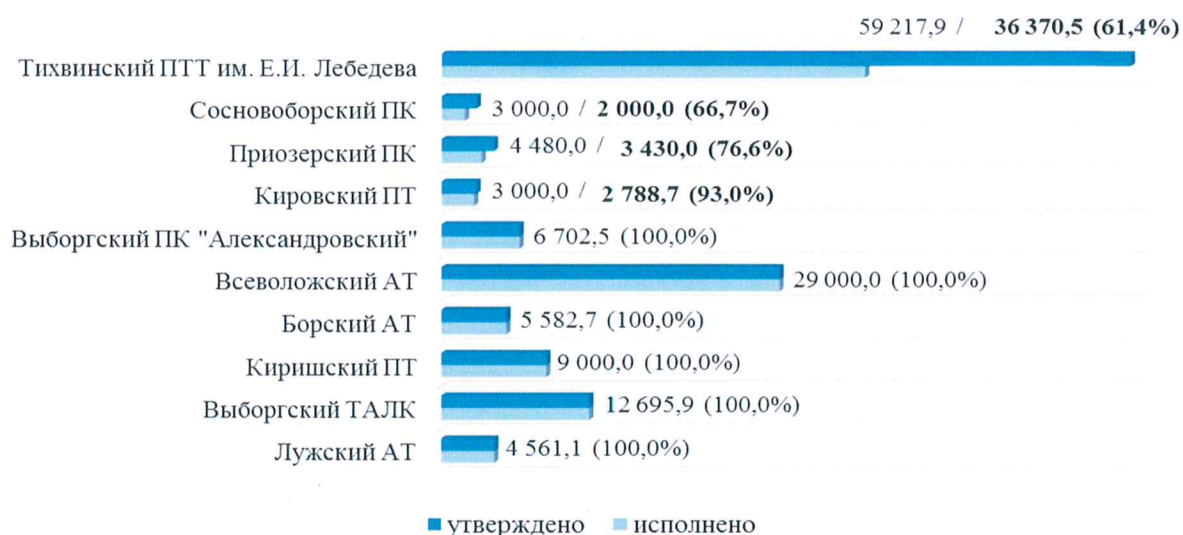ГБУ**ГАУ**



В 2022 году менее 10 % в объеме предоставленных СИЦ сложилась доля СИЦ РС в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» (3,5 %), ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум» (5,7 %), ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум» (6,3%), выше всего этот показатель в ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» (75,2%), ГАПОУ ЛО

«Выборгский политехнический колледж «Александровский» (67,2%), ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» (66,4 %), в ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» (63,3 %). Из перечисленных ГАБУ ЛО СПО не обеспечено использование предоставленной СИЦ РС ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» (90,4%), ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж» (97,9 %), остальные обеспечили 100 % расходование предоставленных им средств.

Подробная информация об исполнении в 2022 году ГАБУ ЛО СПО предоставленных им в 2022 году СИЦ РС представлена на диаграмме 18.

диаграмма 18

(тыс. руб.)

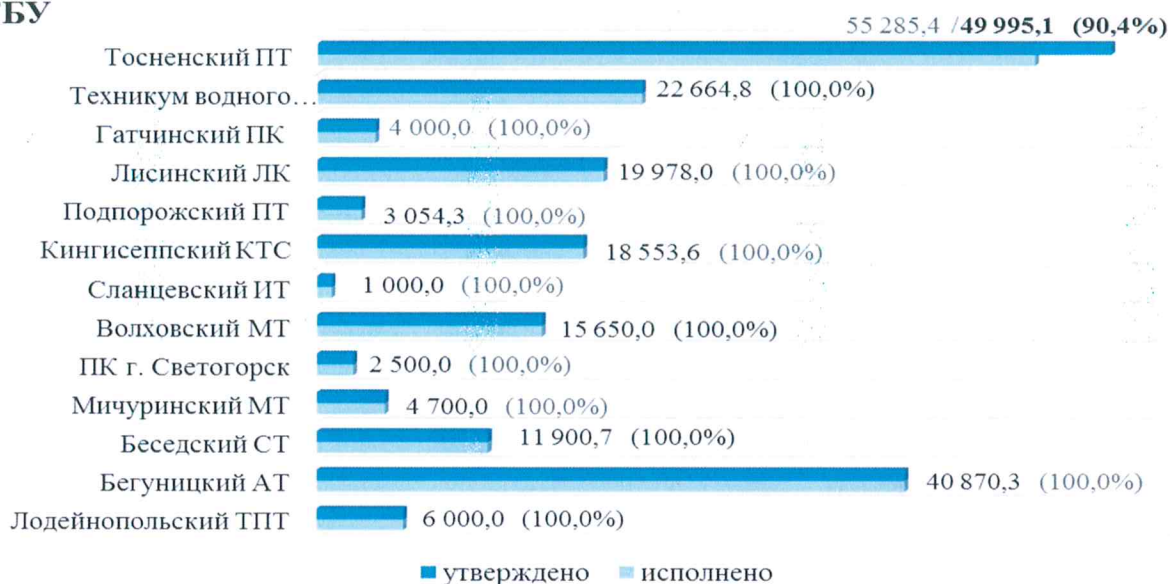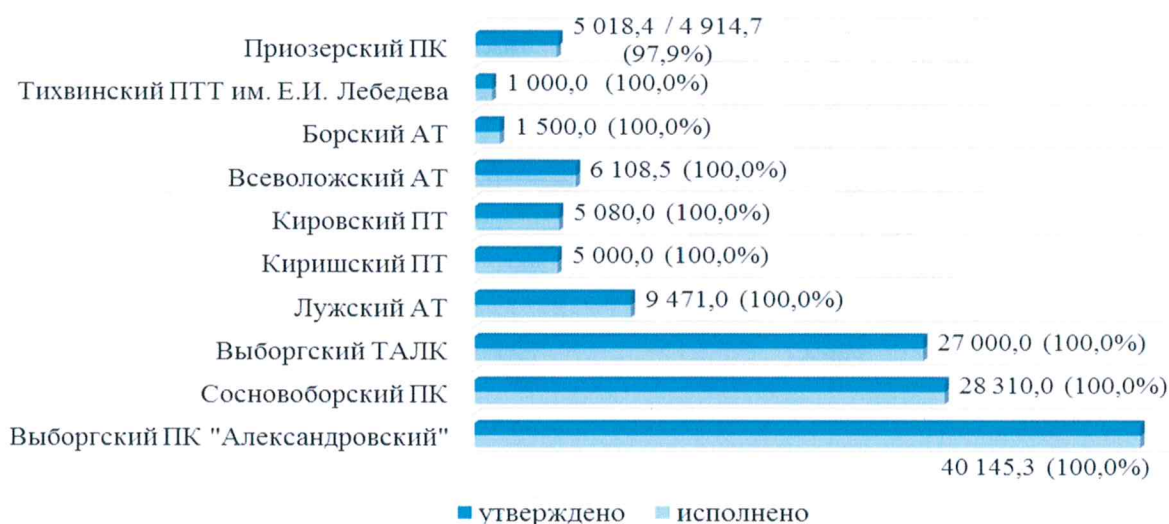ГБУ**ГАУ**

Анализ исполнения ГАБУ ЛО СПО СИЦ РС в разрезе лет и направлений расходования приведен в приложении 5 к заключению.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о недостатках организации программных мероприятий, в рамках которых осуществляется

ремонт и содержание зданий и сооружений, как со стороны Комитета, так и ГАБУ ЛО СПО, которым не удастся обеспечить планомерность и своевременность расходования средств областного бюджета Ленинградской области.

В рамках Мероприятия проведена оценка достаточности правового регулирования организации определения объема средств областного бюджета Ленинградской области на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, в ходе которой установлено следующее.

Предоставление Комитетом ГАБУ ЛО СПО СИЦ РС осуществляется в следующем порядке¹¹:

- представление ГАБУ ЛО СПО заявок на предоставление субсидии (совместно с прилагаемыми к ней документами, обосновывающими необходимость осуществления ремонтных работ и их стоимость)¹²;
- рассмотрение заявок ГАБУ ЛО СПО на заседаниях созданной для этих целей комиссии¹³, решения которой закрепляются в протоколах и с проектом распоряжения Комитета, утверждающего получателя субсидии (с указанием размера субсидии), представляются на утверждение председателю Комитета;
- издание распоряжения Комитета о предоставлении субсидии;
- заключение между Комитетом и подведомственным ему государственным учреждением соглашения о предоставлении субсидии.

¹¹ В 2020 году – в соответствии с Порядком рассмотрения заявок государственных бюджетных и автономных учреждений на предоставление субсидий на приобретение оборудования и на проведение капитального ремонта, утвержденным приказом Комитета от 28.01.2013 № 05 (далее – Порядок № 05) и Порядком и сроками рассмотрения заявок государственных бюджетных и автономных организаций на предоставление субсидий на иные цели, утвержденным приказом Комитета от 21.05.2015 № 21 (далее – Порядок № 21), утратившими силу с 01.01.2021 в связи с изданием приказа Комитета от 30.12.2020 № 59; Порядком и сроками рассмотрения заявок государственными организациями, подведомственными комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на предоставление средств областного бюджета на реализацию мероприятий по проведению ремонтных работ в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области», утвержденным распоряжением Комитета от 19.01.2018 № 87-р (далее – Порядок № 87-р).

С 01.01.2021 – в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета от 30.12.2020 № 59 (далее – Порядок № 59).

¹² В 2020 году – в сроки представления бюджетных заявок на очередной финансовый год и плановый период (пункт 2 Порядка № 21). С 01.01.2021 – заявки учреждений на предоставление субсидий представляются в Комитет в том числе для формирования проекта бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период (пункт 2.2 Порядка № 59).

¹³ До 01.01.2021 – комиссия по рассмотрению заявок государственных бюджетных и автономных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на предоставление субсидий на иные цели (в соответствии с приказами Комитета от 28.01.2013 № 05 и от 21.05.2015 № 21), комиссия по рассмотрению заявок государственных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на предоставление средств областного бюджета на реализацию мероприятий по проведению ремонтных работ в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области» (в соответствии с распоряжением Комитета от 19.01.2018 № 87-р), с 01.01.2021 – комиссия по рассмотрению заявок организаций на предоставление субсидий на иные цели (далее по всему периоду 2020-2022 гг. – Комиссия).

Следует отметить, что приказы Комитета от 28.01.2013 № 05 и от 21.05.2015 № 21 дублировали друг друга в части норм, регулирующих вопросы предоставления субсидий на проведение капитального ремонта и приобретение основных средств. При этом вопросы, относящиеся к предоставлению субсидий на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, и проведение их текущего ремонта в рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», правовыми актами Комитета урегулированы не были.

С 01.01.2021 предоставление СИЦ Комитетом регулируется приказом Комитета от 30.12.2020 № 59, которым утверждены:

- Порядок № 59, в приложении 1 к которому содержится перечень субсидий на иные цели, предоставляемых государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет (далее – Перечень СИЦ),

- Порядок и сроки рассмотрения заявок на предоставление субсидий на иные цели государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет,

- Положение о комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий на иные цели государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет.

Перечисленные выше документы не содержат требований к содержанию протокола, которым оформляются решения Комиссии, в том числе отсутствуют требования о закреплении в протоколе информации о рассмотренных заявках учреждений на предоставление СИЦ (реквизиты заявок, конкретное наименование заявленных работ и их стоимость, прилагаемые к заявкам документы – обоснования, расчеты и пр.), что препятствует:

- анализу соответствия сумм и направлений (видов работ, услуг), отраженных ГАБУ ЛО СПО в заявках на предоставление СИЦ, суммам СИЦ, указанным в протоколах решений Комиссии и распоряжениях Комитета о предоставлении СИЦ, суммам и направлениям (видам работ, услуг), указанным в соглашениях о предоставлении СИЦ и приложениях к ним;

- оценке обоснованности исполнения государственных контрактов (договоров), заключенных за счет средств СИЦ;

- оценке целевого характера расходования средств СИЦ.

1. По результатам анализа перечисленных выше приложений к приказу Комитета от 30.12.2020 № 59 выявлено несоответствие их отдельных положений общим требованиям к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, *утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203* (вступило в силу с 01.01.2021), и иным правовым актам, а также внутренние противоречия содержащихся в них норм (приведены в приложении 6 к заключению).

2. Предусмотренные пунктом 4.5 Порядка № 59 нормативные правовые акты Комитета, утверждающие порядок и сроки принятия Комитетом решения:

- о предоставлении учреждениями информации о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на иные цели на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели (в части необходимости установления нормы потребности),

- об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий на иные цели,

в Комитете отсутствуют.

3. Пунктом 25 Общих требований к *определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденных приказом Минпросвещения России от 22.09.2021 № 662¹⁴*, предусмотрено, что *затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги, по решению органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, наделенного полномочиями определять и утверждать базовые нормативы затрат, могут*

¹⁴ Применяется с 26.11.2021, до данной даты действовали общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденные приказом Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235.

включать в себя в том числе затраты на текущий ремонт и содержание недвижимого имущества в расчете на единицу оказания государственной (муниципальной) услуги.

В то же время в Порядке расчета и утверждения нормативных затрат на оказание государственных услуг, базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг, и корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам по организациям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Порядок № 630-р), утвержденном распоряжением Комитета от 01.03.2016 № 630-р (действует в редакции распоряжения Комитета от 28.11.2018 № 2623-р) на основании постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543¹⁵, затраты на текущий ремонт не входят в нормативные затраты на оказание государственных услуг в подведомственных Комитету государственных учреждениях Ленинградской области.

Одновременно в разделе 2 приложения 1 к Порядку № 59 (Перечень СИЦ) «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» установлены наименования СИЦ, в т.ч. на:

- проведение работ по капитальному ремонту и(или) реставрации объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности;
- реализацию мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством);
- проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством);
- оплату расходов по содержанию имущества, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ);
- проведение текущего ремонта зданий, помещений, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ).

Мероприятия по текущему ремонту зданий, помещений, непосредственно связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), данным перечнем не предусмотрены.

Таким образом, *затраты на текущий ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), правовыми актами Комитета не отнесены ни к затратам на оказание государственных услуг в подведомственных*

¹⁵ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области».

Комитету государственных учреждений Ленинградской области, ни к затратам на мероприятия, для реализации которых учреждениям предоставляются СИЦ, вследствие чего источник финансирования указанных расходов в законодательстве не закреплён, правовыми актами Ленинградской области не установлен, что, в свою очередь, свидетельствует об осуществлении указанных расходов за счёт средств областного бюджета Ленинградской области в отсутствие правового регулирования.

4. Согласно подпункту «а» пункта 2.2 Порядка № 59 заявка на предоставление субсидии включает в том числе пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления бюджетных средств, содержащую качественные и количественные показатели предоставления субсидии на иные цели. Требования к содержанию данных показателей Порядком № 59 не установлены (в частности, отсутствуют требования к представлению информации о дате предыдущего ремонта, фотофиксации объекта, иной информации, содержащей обоснование необходимости ремонта), не урегулирован порядок действий при представлении заявки в неполном составе или с наличием ошибок (в частности, вопросы отказа в предоставлении субсидии (за исключением случаев признания заявки необоснованной) и возврата заявки без рассмотрения, сроки исправления недостатков в документах).

Требования к отчетности, установленные разделом 3 Порядка № 59, не содержат обязанности получателей субсидии представлять в составе отчета о достижении результата предоставления субсидии и показателей документы, подтверждающие достижение показателей (заключенные государственные контракты (договоры), акты выполненных работ, иные документы, подтверждающие исполнение заказчиком своих обязательств), что приводит к невозможности осуществления Комитетом как главным распорядителем бюджетных средств надлежащего контроля как при рассмотрении документов соискателей предоставления субсидий, так и в части проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Следует отметить, что контроль за достижением получателями субсидий значений результатов предоставленных субсидий на основании отчетов, предоставляемых получателями субсидии, без сопоставления с документами, подтверждающими достижение показателей, не исключает предоставление получателями субсидий недостоверных сведений.

Таким образом, отношения, связанные с предоставлением и использованием субсидий для осуществления ремонта и содержания зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, урегулированы не в полном объеме.

В рамках Мероприятия в целях исследования организации определения объема средств областного бюджета Ленинградской области на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, организации их предоставления был проведен выборочный анализ заявок на СИЦ РС,

предоставленных объектами Мероприятия, указанными в приложении 7 к заключению, и документов к ним, протоколов Комиссии и распоряжений Комитета о предоставлении СИЦ РС в исследуемом периоде, 44 соглашений с 8 ГАБУ ЛО СПО о предоставлении СИЦ РС на общую сумму 571 062,8 тыс. руб.¹⁶, в том числе:

- в 2020 году – 18 соглашений на общую сумму 221 805,6 тыс. руб.;
 - в 2021 году – 15 соглашений на общую сумму 181 829,3 тыс. руб.;
 - в 2022 году – 11 соглашений на общую сумму 167 427,9 тыс. руб.,
- в ходе которого установлены следующие недостатки.

1. Установленный правовыми актами Комитета¹⁷ порядок представления и рассмотрения заявок ГАБУ ЛО СПО на предоставление СИЦ *нарушен* в части:

- *не соблюдения* 6 ГАБУ ЛО СПО¹⁸ срока представления заявок на предоставление субсидий, установленного пунктом 2.2 Порядка № 59¹⁹;
- *отсутствия либо представления с ошибками документов*, которые в силу пункта 2.2 Порядка № 59 надлежало представить совместно с заявками (расчет, финансово-экономическое обоснование размера субсидии, пояснительная записка, перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов, дефектная ведомость и т.п., далее - Приложения)²⁰ (подробная информация в разрезе ГАБУ ЛО СПО, не представивших либо оформивших с нарушениями и недостатками документы, приведена в приложении 10 к заключению);
- *рассмотрения* на заседаниях Комиссии вопроса *о предоставлении субсидии без соответствующей заявки*²¹ *либо заявок*, представленных без Приложений;
- *представления* ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» и ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» *заявок на предоставление СИЦ РС в ценах, не являющихся актуальными* на дату подачи заявки;
- *издания Комитетом распоряжений о предоставлении СИЦ РС в отсутствие протоколов Комиссии:*

в 2020-2022 годах - на реализацию мероприятий по приспособлению объектов для доступа инвалидов и маломобильных групп населения (далее

¹⁶ Перечень соглашений приведен в приложении 8 к заключению в разрезе ГАБУ ЛО СПО и по годам.

¹⁷ Порядки №№ 05, 21, 87-р, 59.

¹⁸ По перечню, приведенному в приложении 9 к заключению.

¹⁹ Заявки должны быть представлены в сроки, установленные для составления проекта бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период.

²⁰ Аналогичные требования установлены пунктом 7 Порядка определения объема и условия предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 № 522²⁰ (далее – Порядок № 522).

²¹ Протокол заседания Комиссии № 3 от 04.06.2020, на котором принято решение рекомендовать выделение ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» субсидии на иные цели на 2020 год в размере 11 308,0 тыс. руб. Обоснование необходимости проведения ремонтных работ представлено 06.07.2020 исх. № 01-8/777 (с прилагаемым актом обследования от 26.06.2020), распоряжение Комитета № 1369-р о предоставлении учреждению субсидии в указанном размере издано 07.08.2020.

– МГН) в зданиях и сооружениях ГАБУ ЛО СПО в рамках государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»;

в 2022 году - на реализацию мероприятий по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений (в части ремонта и содержания зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО) в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»,

что нарушает требования пункта 7 Порядка № 05, пункта 4.2 Порядка № 21, пункта 6 Порядка № 87-р и пункта 4.2 Порядка № 59.

Выявлено несоответствие размеров СИЦ РС, указанных в отдельных распоряжениях Комитета о предоставлении СИЦ РС в 2020 году, размеру субсидий, указанному в протоколах Комиссии или заявках подведомственных учреждений, что противоречит пунктам 10.1 и 12 Порядка № 522 (перечень разночтений приведен в приложении 11 к заключению).

Из изложенного следует, что нарушения Комитетом и ГАБУ ЛО СПО порядка представления и рассмотрения заявок на предоставление СИЦ носили системный характер.

2. Отдельные СИЦ РС предоставлены ГАБУ ЛО СПО:

- в размере, не соответствующем размеру, указанному в соответствующих распоряжениях Комитета, что нарушает требования пункта 5 Порядка № 21 и пункта 5 Порядка № 59²² (перечень приведен в приложении 12 к заключению);

- в отсутствие заявок, предусмотренных пунктом 7 Порядка № 522 (в 2020 году):

ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» - по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» от 24.03.2020 № 165 на сумму 4 190,12 тыс. руб.;

ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» - по соглашению о предоставлении субсидии на иные цели на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы

²² Согласно которому предоставление субсидий на иные цели осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета.

Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» от 07.12.2020 № 478 на сумму 10 525,6 тыс. руб.²³;

- на проведение ремонтных работ, виды которых не соответствовали видам работ, указанным в заявках ГАБУ ЛО СПО на предоставление СИЦ РС, то есть фактически СИЦ РС предоставлены без заявок на их предоставление и соответствующих документов, подтверждающих обоснование необходимости проведения работ (информация приведена в приложении 13 к заключению).

3. По результатам анализа исполнения соглашений о предоставлении СИЦ РС, заключенных Комитетом с ГАБУ ЛО СПО – объектами ЭАМ (приведен в приложениях 14-16 к заключению), установлено, что исполнение в полном объеме²⁴ в текущем финансовом году достигнуто по 28 соглашениям из 44, что составляет 63,6 % от общего их количества, из них:

- в 2020 году полностью использованы средства СИЦ РС по 6 из 18 соглашений (33,3 %);

- в 2021 году полностью использованы средства СИЦ РС по 12 из 15 соглашений (80,0 %);

- в 2022 году полностью использованы средства СИЦ РС по 10 из 11 соглашений (90,9 %).

В ходе исследования заключенных объектами ЭАМ соглашений о предоставлении СИЦ РС установлены следующие недостатки организации исполнения соглашений и расходования ГАБУ ЛО СПО средств СИЦ РС.

3.1. *Низкое качество планирования и подготовки заявок и прилагаемых к ним документов.* Так, при реализации ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» соглашения № 297 от 26.03.2021²⁵ экономия по результатам проведения закупок на 2 из 3 видов предусмотренных соглашением ремонтных работ составила 30,4 % и 24,2 % соответственно.

Аналогичная ситуация сложилась в ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум», где при реализации соглашения от 15.02.2022 № 226 образовалась экономия в размере 5 290,3 тыс. руб., или 22,8% от предусмотренного объема ремонтных работ.

3.2. *Нарушение условий соглашения о предоставлении СИЦ РС,* регулирующих направления предоставления субсидии на иные цели, установленные Порядком № 59, и предоставлении получателем субсидии отчетности.

²³ Представленные Комитетом в ходе Мероприятия заявки учреждения от 09.12.2020 №№ 01 8/13687 и 01-8/1368 (без приложений) не могут быть приняты в качестве предусмотренных пунктом 7 Порядка № 522 заявок, поскольку представлены позднее заключения соглашения о предоставлении субсидии.

²⁴ Без учета образовавшихся за счет экономии остатков, возвращенных в областной бюджет Ленинградской области.

²⁵ Соглашение № 297 о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели от 26.03.2021.

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в соответствии с заключенным с Комитетом соглашением № 347 от 08.04.2021²⁶ (далее – Соглашение № 347) средства СИЦ РС были направлены на проведение текущего ремонта в помещениях 2 этажа учебного корпуса²⁷ и актового зала²⁸. 17.12.2021 указанные ремонтные работы завершены²⁹. Оплата данных работ осуществлена 21.12.2021³⁰. После завершения ремонтных работ и их оплаты к Соглашению № 347 без соответствующего решения Комиссии 28.12.2021 заключено дополнительное соглашение № 1, которым ранее установленные направления расходования заменены на работы по «проведению текущего ремонта средств автоматической пожарной сигнализации» стоимостью 300,0 тыс. руб.³¹ При этом размер СИЦ РС в Соглашении № 47 в редакции дополнительного соглашения № 1 сохранен без изменения в сумме 30 000,0 тыс. руб.

На 01.01.2022 средства СИЦ РС в сумме 300,0 тыс. руб. израсходованы не были. Распоряжением Комитета от 31.01.2022 № 165-р учреждению разрешено использовать остатки субсидии в размере 300,0 тыс. руб. по целевому назначению на мероприятия, предусмотренные в 2021 году. Работы были произведены и оплачены в 2022 году³².

Таким образом, при заключении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 347 должностными лицами Комитета и ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» допущена грубая техническая ошибка в части указания недостоверного направления расходования средств СИЦ РС, повлекшая представление недостоверной отчетности и нарушение условий Соглашения № 347 о предоставлении отчетности³³;

²⁶ Соглашение № 347 о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели от 08.04.2021, предмет: предоставление субсидии в целях проведения мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области». Сумма субсидии: 30 000,0 тыс. руб.

²⁷ Предоставлены на текущий ремонт помещений, связанных с оказанием государственной услуги по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в рамках государственного задания, что не соответствует направлениям предоставления субсидии на иные цели, установленным Порядком № 59.

²⁸ Приложение № 1 к Соглашению № 347.

²⁹ Контракт № 01-2021-ЭА 26.07.2021 между ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» и ООО «Промышленно-строительная компания «СОГЛАСИЕ 2» на выполнение работ по текущему ремонту под размещение площадки ЦОПП на сумму 29 700,0 тыс. руб., Акт № 1 приемочной комиссии поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), акт сдачи объекта в эксплуатацию от 17.12.2021.

³⁰ Платежное поручение № 442784 от 21.12.2021.

³¹ Контракт № 13-М-2022 от 22.02.2022 между ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» и ООО «КМК-Сервис», акт № 400-03 от 01.03.2022.

³² Оплата по контракту № 13-М-2022 от 22.02.2022 произведена платежным поручением от 03.03.2022 № 517747 на сумму 300,0 тыс. руб.

³³ Пунктом 4.3.4 Соглашения № 347 предусмотрено, что получатель субсидии обязан не позднее 5 рабочих дней, следующих за кварталом, в котором получена субсидия, представлять в Комитет отчет

3.3. В соглашениях о приобретении имущества и(или) проведении ремонтных работ в целях реализации мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов и МГН в учреждениях профессионального образования³⁴:

от 31.03.2021 № 313 на сумму 2 240,0 тыс. руб. с ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»;

от 31.03.2021 № 316 на сумму 2 480,0 тыс. руб. с ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»;

от 31.03.2021 № 326 на сумму 2 000,0 тыс. руб. с ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»;

от 15.04.2022 № 400 на сумму 2 109,0 тыс. руб. с ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»

отсутствует конкретизация направления работ, не установлен перечень приобретаемого имущества и(или) ремонтных работ как непосредственно в тексте соглашений, так и в приложениях № 1 (перечень субсидий), № 2 (график перечисления субсидии) и № 2.1 (значение результатов предоставления субсидии) (в 2021-2022 гг.) к ним³⁵. В распоряжениях Комитета, на основании которых заключены перечисленные соглашения³⁶, данная конкретизация также отсутствует.

Конкретизация видов работ отсутствует также в соглашениях о предоставлении субсидии на проведение ремонтных работ в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»:

от 22.03.2021 № 266 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.09.2021) на сумму 29 000,0 тыс. руб. с ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»,

от 15.02.2022 № 260 (в редакции дополнительного соглашения № 260/4 от 05.12.2022) на сумму 19 978,0 тыс. руб. с ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж».

Конкретизация описания работ также отсутствует в соглашениях № 535 от 30.07.2021 на сумму 1 338,9 тыс. руб. и № 465 от 20.05.2022 на сумму 2 573,4 тыс. руб., заключенных с ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский» на предоставление субсидий на иные цели (направлением расходования, согласно приложениям к соглашениям, указано «расходы на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности»).

о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии.

³⁴ В рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

³⁵ Предусмотрено направление средств субсидии: «расходы на организацию мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования».

³⁶ От 29.03.2021 №№ 790-р, 795-р, 796-р, от 14.04.2022 № 706-р.

3.4. Нарушение установленного статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации принципа адресности и целевого характера бюджетных средств.

Комитетом³⁷ заключено соглашение № 221 от 09.04.2020 (далее – соглашение № 221)³⁸, согласно которому ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский» предоставлена субсидия на иные цели в размере 26 696,6 тыс. руб. (предусмотрена по главе 068, разделу подразделу 0704, целевой статье 5260313770, виду расходов 622, доп. КР 52060303³⁹, КОСГУ 241), в том числе на выполнение архитектурной подсветки зданий учебного и учебно-производственного корпуса сметной стоимостью 3 696,0 тыс. руб., в то время как данные работы не относятся к ремонтным⁴⁰.

Указанные работы проведены на основании контракта № 8 от 16.11.2020⁴¹ на сумму 3 166,9 тыс. руб., заключенного между ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский» и ООО «Строитель».

Таким образом, средства СИЦ в сумме 3 166,9 тыс. руб. направлены на цели, не соответствующие отражаемым по доп. КР 52060303.

3.5. ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева» (далее – ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева») ремонтные работы на сумму 2 000,0 тыс. руб.⁴², в том числе по приспособлению жилого помещения для проживания инвалидов и МГН,

³⁷ На основании распоряжения Комитета от 31.03.2020 № 668-р.

³⁸ В редакции дополнительных соглашений № 1 от 23.07.2020 и № 2 от 30.12.2020.

³⁹ Наименование кода целевой статьи: «Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений» (приложение 1 к Указаниям о порядке применения бюджетной классификации областного бюджета Ленинградской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета финансов Ленинградской области от 26.12.2019 № 18-02/02-37 (далее – Указания)). Наименование дополнительного кода расходов: «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» (приложение 3 к Указаниям).

⁴⁰ Текущим ремонтом здания является ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей (ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утвержден приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312) (далее – ВСН 58-88(р)). В приложении 7 к ВСН 58-88 (р) приведен рекомендуемый перечень основных работ по текущему ремонту зданий и объектов, в котором устройство наружного освещения (подсветки здания) не поименовано.

К текущему ремонту, как правило, относят устранение мелких неисправностей, выявляемых в ходе повседневной эксплуатации основного средства, при котором объект практически не выбывает из эксплуатации, а его технические характеристики не меняются, работы по систематическому и своевременному предохранению основных средств от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий (письмо Минстроя России от 27.02.2018 № 7026-АС/08).

⁴¹ Контракт № 8 от 16.11.2020 на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Лицей» (архитектурно-художественная подсветка уличных фасадов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Крепостная, д. 35/27, и по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Русская женская школа со службами» (архитектурно-художественная подсветка уличных фасадов), расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, Ленинградский пр., д. 6. Работы выполнены в 2021 году.

⁴² СИЦ предоставлена на основании соглашения от 09.04.2020 № 208 (далее – Соглашение № 208).

заявленные⁴³ к проведению по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Центролитовская, д. 5, предусмотренные распоряжением Комитета от 08.04.2020 № 709-р по адресу: Ленинградская область, г. Луга, Медведское шоссе, д. 2, фактически проведены по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, Учебный городок, д. 4.

Перечень приобретаемого имущества и работ Соглашением № 208 не установлен. Как следует из отчета ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева», ремонтные работы для проживания инвалидов и МГН осуществлены в 2021 году за счет остатков субсидии 2020 года, предоставленной по Соглашению № 208. Конкретный адрес выполнения данных работ в отчете не приведен.

Как следует из представленных Комитетом акта о приемке выполненных работ № 2 от 08.02.2021 и справки о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 08.02.2021⁴⁴, ремонтные работы по приспособлению для доступа инвалидов и МГН в помещение проведены в квартире № 12 здания общежития ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева» по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, Учебный городок, д. 4.

3.6. Из подтвержденных к использованию⁴⁵ в 2020 году остатков средств субсидии, предоставленной ГБПОУ «Мичуринский многопрофильный техникум» в 2019 году на общую сумму 34 428,1 тыс. руб., в т.ч.: 13 228,1 тыс. руб. – на ремонтные работы; 21 200,0 тыс. руб. – на капитальный ремонт спортплощадок, в 2020 году не были израсходованы средства в сумме 5 182,7 тыс. руб.⁴⁶

В 2020 году Комитетом ГБПОУ «Мичуринский многопрофильный техникум»⁴⁷ была предоставлена субсидия в размере 31 000,0 тыс. руб. на проведение ремонтных работ⁴⁸, средства которой в 2020 году также не были использованы (остаток неиспользованных средств составил 25 898,1 тыс. руб.).

Комитетом в нарушение пунктов 2.2.6 соглашений №№ 677 и 229⁴⁹ подтверждены учреждению к использованию⁵⁰ в 2021 году средства СИЦ сверх фактической потребности, в том числе по соглашениям:

№ 677 – в сумме 21 200,0 тыс. руб. (при фактическом остатке на 01.01.2021 5 182,7 тыс. руб.);

№ 229 – в сумме 31 000,0 тыс. руб. (при фактическом остатке на 01.01.2021 25 898,1 тыс. руб.).

⁴³ Заявка от 27.03.2020 № 127 ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева».

⁴⁴ Представлены совместно с ответом от 27.09.2023 № 18-37365/2023 на запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области о предоставлении пояснений.

⁴⁵ Распоряжение Комитета от 21.01.2020 №83-р.

⁴⁶ По соглашению № 677 о предоставлении субсидии на иные цели на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов» от 16.12.2019 на сумму 21 200,0 тыс. руб. (далее – Соглашение № 677).

⁴⁷ Распоряжение Комитета от 04.02.2020 № 229-р.

⁴⁸ По соглашению № 229 от 14.04.2020 на сумму 31 000,0 тыс. руб. (далее – Соглашение № 229).

⁴⁹ Пункты 2.2.6 Соглашений №№ 677 и 229: «В течение пяти рабочих дней со дня поступления от Получателя обращения о подтверждении потребности использования остатков Субсидии, не использованной на 1 января очередного финансового года, на те же цели, издавать правовой акт о подтверждении указанной потребности».

⁵⁰ Распоряжение Комитета от 01.02.2021 № 226-р.

Согласно представленной в Комитет информации ГБПОУ «Мичуринский многопрофильный техникум» о расходовании остатков СИЦ, предоставленной в соответствии с Соглашением № 677, средства субсидии в размере 21 200,0 тыс. руб. освоены полностью, в том числе в 2020 году – 16 017,3 тыс. руб., в 2021 году – 5 182,7 тыс. руб.

В 2021 году средства СИЦ, предоставленные по Соглашению № 229, были израсходованы в сумме 14 981,0 тыс. руб., неиспользованный остаток средств составил 16 019,0 тыс. руб.

Распоряжением Комитета от 31.01.2022 № 165-р на основании письма ГБПОУ «Мичуринский многопрофильный техникум» от 11.01.2022 № 01-03/5 разрешен к использованию в 2022 году остаток средств субсидии в сумме 16 019,0 тыс. руб., предоставленной по Соглашению № 229.

Согласно представленной в 2022 году учреждением в Комитет информации (без даты и номера) о расходовании остатков субсидии на иные цели, предоставленной в 2020 году по Соглашению № 229, средства субсидии в сумме 31 000,0 тыс. руб. освоены в полном объеме, в том числе: 14 981,0 тыс. руб. – в 2021 году; 16 019,0 тыс. руб. – в 2022 году.

Использование средств СИЦ в течение длительного времени, учитывая изменение цен на товары (работы, услуги) вследствие инфляции и, соответственно, необходимость осуществлять закупки по цене выше запланированной изначально, влечет риски их неэффективного использования.

Следует отметить, что отчеты о расходах и достижении значений результатов предоставленной в 2019 году СИЦ за 2019 и 2020 годы и о предоставленной СИЦ по Соглашению № 229 за 2020 год учреждением в Комитет не представлены.

В целях оценки законности и эффективности использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений ГБПОУ ЛО «ВМТ», проведен визуальный осмотр зданий и сооружений ГБПОУ ЛО «ВМТ», анализ документов, представленных в Комитет для предоставления СИЦ РС, соглашений, явившихся основанием для предоставления СИЦ РС, документов о расходовании средств СИЦ РС.


Общий объем СИЦ РС, предоставленных ГБПОУ ЛО «ВМТ» в исследуемом периоде (заключено 10 соглашений о предоставлении СИЦ РС), составил 65 424,5 тыс. руб. (диаграмма 19⁵¹), в т.ч.

- в 2020 году – 29 108,7 тыс. руб.;
- в 2021 году – 20 665,7 тыс. руб.;
- в 2022 году – 15 650,1 тыс. руб.;

⁵¹ Сокращения, приведенные в диаграмме: ВМТ – ГБПОУ ЛО «ВМТ», ВАК – ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж», ВКТС – ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транспортного строительства», ВПТ – ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техникум».

Диаграмма 19

(тыс.руб.)

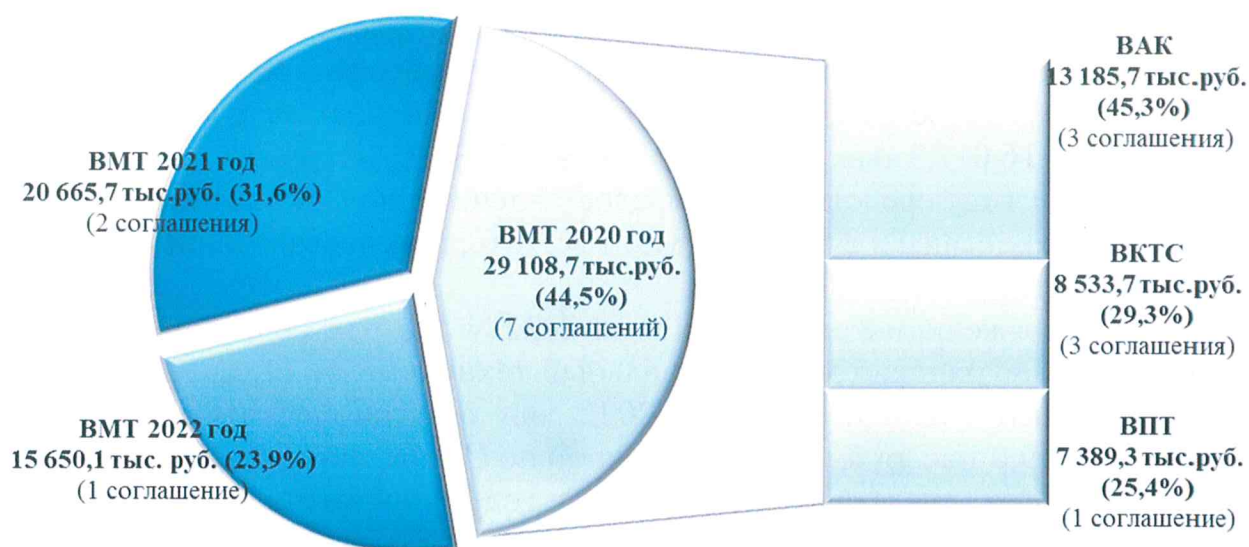

Информация о заключенных ГБПОУ ЛО «ВМТ» в 2020-2022 гг. соглашениях о предоставлении СИЦ РС приведена в таблице 1.

Таблица 1

(тыс.руб.)

Распоряжение		Соглашение			Виды работ (мероприятия)	Примечание
Дата	№	Дата	№	Сумма		
2020 год						
04.02.2020	206-р	17.02.2020	70	2 400,00	Текущий ремонт слесарной мастерской	
04.02.2020	206-р	11.06.2020	325	6 785,70 ⁵²	Ремонт помещений и планирование прилегающей территории	
08.04.2020	714-р	09.04.2020	205	4 000,00	Приспособление объектов для доступа инвалидов и МГН	
11.12.2020	2093-р	14.12.2020	479	546,00	Покраска забора. Ремонт комнат общежития.	
17.12.2020	2167-р	17.12.2020	509	387,70	Текущий ремонт комнат общежития.	
04.02.2020	232-р	31.03.2020	187	7 600,00	Текущий ремонт столовой	
04.02.2020	224-р	09.04.2020	223	7 389,30	Текущий ремонт фасада, кровли, помещений	
Итого				29 108,70		
2021 год						
30.12.2020	2286-р	24.05.2021	447	17 665,71	Ремонтные работы в организациях профессионального образования	Изначально по распоряжению 3 колледжа, на сумму 21 665,71 тыс. руб.
21.05.2021	1376-р					Изменение КБК, суммы и получателя субсидии - ВКТС
31.01.2022	165-р					О подтверждении остатка субсидии в сумме на 2022 год 411,01 тыс. руб.

⁵² Неиспользованный остаток составил 263,3 тыс. руб.

29.03.2021	793-р	17.05.2021	395	5 000,0 ⁵³	Приспособление объектов для доступа инвалидов и МГН	
28.05.2021	1527-р	16.06.2021	д/с 1	3 000,0 ⁵⁴		Изменение суммы
Итого:				20 665,71		
2022 год						
01.02.2022	184-р	15.02.2022	235	18 000,0 ⁵⁵	Проведение мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках комплекса процессных мероприятий «развитие инфраструктуры системы профессионального образования»	
		05.08.2022	д/с 235/1	-		Уточнение объемов ремонтных работ
02.11.2022	2127-р ⁵⁶	15.11.2022	д/с 235/2	15 650,05 ⁵⁷		Изменение суммы до 15 650,05 тыс. руб.
Итого:				15 650,05		
Всего:				65 424,46		

За счет средств СИЦ РС в исследуемом периоде было заключено 93 договора (контракта) (реестр поставщиков, с которыми ГБПОУ ЛО «ВМТ» заключались контракты (договоры) (далее - Реестр поставщиков), приведен в приложении 17 к заключению).

Анализ Реестра поставщиков выявил следующее.

С отдельными поставщиками в течение 2020-2022 годов заключались договоры на суммы, не превышающие 600 тыс. руб., на осуществление однородных работ по одним и тем же адресам в период, не превышающий 3 месяцев.

Так, например

- с ИП⁵⁸ Булкиным В.М. ГБПОУ ЛО «ВПТ» в период с 17.06.2020 по 30.07.2020 (т.е. в течение 2 месяцев) были заключены 4 договора на ремонт помещений по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26, цена которых варьировалась от 30,0 тыс. руб. до 597,8 тыс. руб., в период с 11.11.2020 по 10.12.2020 - еще 3 договора на ремонт помещений по тому же адресу на общую сумму 931,1 тыс. руб.;

- с ООО «РемДом» в период с 09.11.2020 по 22.12.2020 (т.е. в течение 2 месяцев) ГБПОУ ЛО «ВПТ» были заключены 3 договора на ремонт

⁵³ Размер субсидии в первоначальной редакции соглашения.

⁵⁴ Размер субсидии с учетом дополнительного соглашения к соглашению.

⁵⁵ Размер субсидии в первоначальной редакции соглашения.

⁵⁶ Распоряжение от 02.11.2022 № 2127-р о внесении изменений в распоряжение от 01.02.2022 № 184-р содержит ошибки: 1. В приложении № 2 указано распоряжение № 2126-р; 2. Сумма в п. 31 по ГБПОУ ЛО «ВМТ» указана неверно – в размере 15 780,45 тыс. руб.

⁵⁷ Размер субсидии с учетом дополнительного соглашения к соглашению.

⁵⁸ Индивидуальный предприниматель.

помещений (кабинетов №№ 11,13,14,25) г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 на общую сумму 868,9 тыс. руб.;

- с ИП Тишкиным А.Л. ГБПОУ ЛО «ВКТС» в период с 10.06.2020 по 14.08.2020 были заключены 3 договора на ремонт помещений и входного крыльца по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4 на общую сумму 1 127,2 тыс. руб., еще 2 договора, датированные 24.11.2020 и 04.12.2020, на ремонт помещений по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Володарского, д. 5а были заключены на общую сумму 626,9 тыс. руб.; ГБПОУ ЛО «ВАК» были заключены 2 договора с датой заключения 20.02.2020 и 21.02.2020 на ремонт помещений по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 34 на сумму 591,7 тыс. руб. и 522,6 тыс. руб. соответственно;

- с ИП Паляевой Е.Ю. ГБПОУ ЛО «ВАК» были заключены 2 договора с датой заключения 20.02.2020 и 21.02.2020 на ремонт слесарного кабинета по адресу: г. Волхов, Кировский проспект, д. 34 на сумму 573,6 тыс. руб. и 569,3 тыс. руб. соответственно;

- с ИП Бирюлиным В.И. ГБПОУ ЛО «ВАК» были заключены 2 договора с датой заключения 22.06.2020 и 15.07.2020 на ремонт помещения гардероба и входной группы по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 34 на сумму 599,8 тыс. руб. и 569,9 тыс. руб. соответственно;

- с ООО «РемДом» ГБПОУ ЛО «ВМТ» в период с 25.06.2021 по 20.07.2021 были заключены 3 договора на ремонт помещений по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 34 (аудитории 103 и 104) на суммы 570,88 тыс. руб. и 568,56 тыс. руб. соответственно, на ремонт помещения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 на сумму 488,82 тыс. руб.;

- с ООО «ВСП «Электроком» ГБПОУ ЛО «ВМТ» в период с 26.04.2022 по 23.05.2022 (т.е. в течение 1 месяца) были заключены 5 договоров на электротехнические (электромонтажные) работы по адресам: Ленинградская область, г. Волхов: Кировский пр. 34 и ул. Лукьянова, д. 5, цена которых варьировалась от 53,37 тыс. руб. до 354,5 тыс. руб.;

- с ООО «Александра» ГБПОУ ЛО «ВМТ» в период с 11.04.2022 по 30.06.2022 (т.е. в течение одного квартала) были заключены 5 договоров на замену оконных блоков в помещениях по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13, и г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 14а, цена которых варьировалась от 163,04 тыс. руб. до 594,6 тыс. руб.;

- с ИП Гадировым В.А. (КФХ) ГБПОУ ЛО «ВМТ» в период с 09.06.2022 по 13.06.2022 были заключены 2 договора на разнородные работы (устройство покрытия из брусчатки, устройство водостока), производимые по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 34, на суммы 599,0 тыс. руб. и 585,0 тыс. руб. соответственно;

- с ИП Тишкиной А.В. 28.06.2022 ГБПОУ ЛО «ВМТ» были заключены 2 договора на ремонт помещений (аудиторий и тренажерного зала) по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 на суммы 598,77 тыс. руб. и 597,32 тыс. руб. соответственно;

- с ИП Бирюлиным В.И. 07.06.2022 и 30.06.2022 были заключены 2 договора на ремонт помещений (кабинет директора, коридор) по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 34. на суммы 248,2 и 599,08 тыс. руб. соответственно.

Из правоприменительной практики контрольных органов и судов следует, что заключение в течение непродолжительного времени контрактов (договоров) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку одноименных товаров, работ, услуг, содержащих идентичные условия и направленных на достижение единой хозяйственной цели, может быть признано искусственным дроблением закупки.

Формулировка «дробление закупки» применяется и запрет на ее совершение содержится в положениях отдельных подзаконных нормативных правовых актах Российской Федерации (в т.ч. в ведомственных), таких как, например, Типовом положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд бюджетных учреждений, автономных учреждений, унитарных предприятий, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (пункт 7), утвержденном приказом Минобрнауки России от 30.03.2022 № 275.

Данная формулировка применяется также и в нормативных правовых актах органов исполнительной власти Ленинградской области, которыми утверждены реестры (карты) коррупционных рисков, возникающих при осуществлении закупок, в части описания возможной коррупционной схемы⁵⁹.

Формулировка «дробление закупок» в приведенном выше значении применяется в том числе в судебной практике, территориальными управлениями Федеральной антимонопольной службы применяются такой же подход при рассмотрении вопросов об осуществлении однородных закупок у единственного поставщика.

Учитывая изложенное, допустимо сделать вывод, что в практике судов и государственных органов в сфере закупок понятие «дробление закупок» применяется в значении «совершение неконкурентным способом в течение короткого промежутка времени (до трех месяцев) сделок между одними и теми же заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупкам однородных товаров, работ, услуг».

В отношении таких контрактов Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) отметил, что они образуют единую сделку,

⁵⁹ Например, приказы Леноблкомимущества от 27.10.2020 № 29, Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 24.11.2020 № 39, комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 03.03.2023 № 01-03/23-92.

искусственно раздробленную на несколько контрактов для ухода от проведения конкурентных процедур и формального соблюдения ограничений, установленных в Федеральном законе № 44-ФЗ (постановление ВС РФ от 07.10.2019 № 73-АД19-2, определение ВС РФ от 19.01.2022 № 309-ЭС21-26228, определение ВС РФ от 29.04.2022 № 308ЭС22-5137, аналогичная позиция содержится в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19.01.2023 № Ф03-6706/2022, постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 28.08.2023 № Ф06-6021/2023).

Следует отметить, что жалобы заинтересованных лиц на дробление закупок, осуществленных конкурентными способами, признавались территориальными управлениями ФАС России необоснованными⁶⁰.

Частью 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ установлен запрет на совершение заказчиками любых действий, которые противоречат требованиям данного Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

В пункте 75 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что применительно к статьям 166 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации под публичными интересами, в частности, следует понимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной среды. Сделка, при совершении которой был нарушен явно выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как посягающая на публичные интересы.

Таким образом, контракт (договор), заключенный в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ без проведения конкурса или аукциона, может быть признан ничтожной сделкой на основании пункта 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. В ходе анализа использования СИЦ РС, предоставленных на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», установлено следующее.

2020 год

1.1. В рамках соглашения от 09.04.2020 № 223⁶¹ о предоставлении СИЦ на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» (далее – Соглашение № 223) в целях реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы

⁶⁰ Решения Ростовского УФАС России от 16.02.2022 № 061/06/42-141/2022, Томского УФАС России от 10.03.2023 № 070/07/3-175/2023, Дагестанского УФАС России от 11.05.2023 № 005/06/106-1174/2023.

⁶¹ С учетом дополнительного соглашения от 10.11.2020 № 1.

профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в сумме 7 389,3 тыс. руб. Комитетом ГБПОУ ЛО «ВПТ» средства СИЦ в сумме 945,4 тыс. руб. предоставлены на текущий ремонт помещений, связанных с оказанием государственной услуги по реализации образовательных программ среднего профессионального образования в рамках государственного задания, что *не соответствует направлениям предоставления субсидии на иные цели, установленным пунктом 2 Порядка № 522.*

Для целей реализации мероприятия, определенного в пункте 1.1 Соглашения № 223, ГБПОУ ЛО «ВПТ» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заключено 18 государственных контрактов (договоров), из них без применения конкурентных способов определения поставщика – 16.

В результате выполнения работ по текущему ремонту зданий, помещений ГБПОУ ЛО «ВПТ», включенных в план мероприятий проведения ремонтных работ (приложение 4 к Соглашению № 223), в 2020 году использовано средств СИЦ в сумме 5 060,3 тыс. руб., или 68,5 %, что на 2 329,0 тыс. руб. меньше сметной стоимости, указанной в приложении 4 к Соглашению № 223, и на 1 744,7 тыс. руб. меньше стоимости работ, указанной в государственных контрактах (договоре)⁶².

Остаток СИЦ, предоставленной ГБПОУ ЛО «ВПТ» в 2020 году по Соглашению № 223, составил 2 329,0 тыс. руб., однако ГБПОУ ЛО «ВПТ» представило в Комитет отчет о реализации мероприятия⁶³ от 29.12.2020 № 8, согласно которому СИЦ использована полностью⁶⁴, целевые показатели⁶⁵ достигнуты, отразив таким образом в отчете недостоверную информацию.

В нарушение пунктов 2.4.5 и 2.4.10 Соглашения № 223 неизрасходованные средства СИЦ, предоставленной по Соглашению № 223, ГБПОУ ЛО «ВПТ» в 2020 году, не обращаясь в Комитет и не заключая дополнительного соглашения к Соглашению № 223 об изменении направлений расходования и условий использования субсидии, самостоятельно определило дополнительные направления расходования СИЦ, заключив 12 договоров на проведение ремонтных работ на общую сумму 2 329,0 тыс. руб.

При этом изготовление и установка оконного блока в препараторской кабинета 11 учебного корпуса, текущий ремонт кабинетов № 11, 13, 14 в учебном корпусе ГБПОУ ЛО «ВПТ», в также ремонт кабинета № 107 в здании ГБПОУ ЛО «ВПТ»⁶⁶ на общую сумму 654,3 тыс. руб., т.е.

⁶² Государственный контракт от 18.06.2020 № 5513 с ООО «ЭНКОМ», государственный контракт от 27.07.2020 № 85222 с ООО «ГЕРМЕС», договор от 09.11.2020 № 51 с ООО «РемДом».

⁶³ По форме согласно приложению 3 к Соглашению № 223.

⁶⁴ В сумме 7 389,3 тыс. руб.

⁶⁵ Текущий ремонт 6 помещений.

⁶⁶ Договор от 21.07.2020 № 25/07-20 с ИП Кудрявцевым С.А., договоры от 15.12.2020 № 56 и от 22.12.2020 № 60 с ООО «РемДом», договор от 03.03.2020 № 09/20 с ИП Булкиным В.М. соответственно.

помещений, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках государственного задания, *не соответствуют направлениям предоставления СИЦ, установленным пунктом 2 Порядка № 522.*

Следует также подчеркнуть, что 7 из 12 договоров были заключены *до* заключения дополнительного соглашения от 10.11.2020 №1, в связи с чем сроки их заключения не препятствовали включению соответствующих работ в дополнительное соглашение № 1.

Договоры от 17.02.2020 № 08/20 и от 03.03.2020 № 09/20 с ИП Булкиным В.М. на выполнение работ по ремонту коридора в здании ГБПОУ ЛО «ВПТ» на сумму 342,8 тыс. руб. и ремонту кабинета № 107 в здании ГБПОУ ЛО «ВПТ» на сумму 50,0 тыс. руб. соответственно *заключены и работы выполнены*⁶⁷ *также до заключения* Соглашения № 223.

1.2. В рамках соглашения от 31.03.2020 № 187 о предоставлении СИЦ на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» (далее – Соглашение № 187) в целях реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» Комитетом ГБПОУ ЛО «ВКТС» предоставлены средства в сумме 7 600,0 тыс. руб. на ремонт 5 помещений в столовой ГБПОУ ЛО «ВКТС».

Для целей реализации мероприятия, определенного в пункте 1.1 Соглашения № 187, ГБПОУ ЛО «ВПТ» заключено 5 государственных контрактов (договоров), из них без применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 4.

1.2.1. Для целей реализации мероприятия, определенного в пункте 1.1 Соглашения № 187, ГБПОУ ЛО «ВКТС» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с ИП Тишкиным А.Л. заключен государственный контракт от 10.07.2020 № 1007/20 на выполнение работ по ремонту столовой ГБПОУ ЛО «ВКТС» на сумму 6 180,6 тыс. руб., что на 1 419,4 тыс. руб. меньше сметной стоимости, указанной в приложении 4 к Соглашению № 187.

После приемки выполненных работ⁶⁸ с ИП Тишкиным А.Л. заключен договор от 01.10.2020 № 22 на выполнение работ по изготовлению и монтажу линии раздачи в столовой ГБПОУ ЛО «ВКТС» на сумму 64,0 тыс. руб.

В соответствии с актом выполненных работ от 09.10.2020 № 1 работы выполнены на сумму 64,0 тыс. руб., при этом, согласно копии платежного поручения от 27.10.2020 № 335748⁶⁹, оплата работ по договору от 01.10.2020 № 22 за счет СИЦ произведена в сумме 27,1 тыс. руб., документы, подтверждающие кассовый расход на сумму 36,9 тыс. руб. за счет СИЦ, не

⁶⁷ Акт выполненных работ от 02.03.2020 № 1 (КС-2).

⁶⁸ Акт выполненных работ от 01.09.2020 № 23 (КС-2) на сумму 6 180,6 тыс. руб.

⁶⁹ Представлена ГБПОУ ЛО «ВМТ».

представлены, согласно пояснениям ГБПОУ ЛО «ВМТ» от 22.09.2023 № 959 остаток расчетов по акту выполненных работ от 09.10.2020 № 1 в сумме 36,9 тыс. руб. произведен за счет внебюджетных средств⁷⁰.

Таким образом, на выполнение работ по текущему ремонту столовой ГБПОУ ЛО «ВКТС» в 2020 году направлены средства СИЦ, предоставленной на основании Соглашения № 187, в сумме 6 207,7 тыс. руб.

Согласно пояснениям ГБПОУ ЛО «ВМТ» от 22.09.2023 № 959 оплата за выполненные работы по государственному контракту от 10.07.2020 № 1007/20 с ИП Тишкиным А.Л. по ремонту столовой ГБПОУ ЛО «ВКТС» произведена в сумме 6 153,5 тыс. руб. (т.е. в объеме, уменьшенном на сумму штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ), что на 27,1 тыс. руб. меньше суммы, указанной в акте выполненных работ от 01.09.2020 № 23 (КС-2), а сумма поступивших штрафных санкций (27,1 тыс. руб.) принята к учету как остаток неиспользованной субсидии на иные цели при наличии обязательств в соответствии с государственным контрактом от 10.07.2020 № 1007/20 в сумме 6 180,6 тыс. руб. (акт выполненных работ от 01.09.2020 № 23 (КС-2)), что не соответствует позиции Министерства финансов Российской Федерации, изложенной в письмах от 24.11.2014 № 02-06-10/59651⁷¹ и 02.04.2020 № 09-07-07/26162⁷².

1.2.2. Вследствие *ошибочно определенной* ГБПОУ ЛО «ВКТС» суммы остатка (1 419,4 тыс. руб., т.е. на 27,1 тыс. руб. больше фактического остатка в сумме 1 392,3 тыс. руб.) в направленном в соответствии с пунктом 2.4.10 Соглашения № 187 в Комитет обращении⁷³ о наличии потребности в использовании остатка СИЦ, предоставленной по Соглашению № 187, на выполнение ремонтных работ в помещениях колледжа *Комитетом* дополнительным соглашением от 15.10.2020 № 1 к Соглашению № 187 (далее – ДС №1) на сумму остатка СИЦ 1 419,4 тыс. руб. актуализированы целевые показатели (приложение 2 к ДС №1) и план мероприятий (приложение 1 к ДС №1), количество помещений, планируемых к ремонту в ГБПОУ ЛО «ВКТС», увеличено с 5 до 7 помещений, в том числе перечень планируемых к ремонту помещений дополнен:

- аудитория 1-205 учебного корпуса № 1⁷⁴ (объем расходов 817,5 тыс. руб.), т.е. помещением, связанным с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках государственного задания, что *не соответствует*

⁷⁰ Платежное поручение от 27.10.2020 № 335750.

⁷¹ Согласно которому средства, полученные бюджетным учреждением в виде неустойки по договорам, в том числе некассовым методом, являются доходами бюджетного учреждения и не подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

⁷² Согласно которому средства, полученные бюджетным учреждением в виде штрафов по договорам, являющиеся доходами бюджетного учреждения, подлежат отражению на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами бюджетных учреждений, открытом учреждению в органе Федерального казначейства.

⁷³ Исх. от 12.10.2020 № 86.

⁷⁴ Используется для оказания государственной услуги по реализации образовательных программ среднего профессионального образования.

направлениям предоставления субсидии на иные цели, установленным пунктом 2 Порядка № 522;

- лестничной клеткой учебного корпуса № 1 (объем расходов 601,9 тыс. руб.).

При этом факт использования СИЦ, предоставленной на ремонт аудитории 1-205 учебного корпуса № 1, на ремонт иного помещения в здании ГБПОУ ЛО «ВКТС» в 2020 году, документально и фактически не подтвержден, поскольку:

- документы, подтверждающие заключение договоров на проведение ремонта перечисленных помещений, а также выполнение этих работ и кассовый расход за счет СИЦ на сумму 1 419,4 тыс. руб., не представлены⁷⁵;

- при осмотре помещений ГБПОУ ЛО «ВКТС», отремонтированных в 2020 году за счет СИЦ, предоставленной в соответствии с Соглашением № 187, выявлено, что в аудитории 1-205 учебного корпуса № 1 ремонт не производился⁷⁶.

1.2.3. Кроме того, ГБПОУ ЛО «ВМТ» представило отчет о реализации мероприятия (без реквизитов), согласно которому СИЦ использована полностью⁷⁷, целевые показатели⁷⁸ достигнуты, отразив таким образом в отчете недостоверную информацию.

В качестве подтверждения целевого использования остатка СИЦ, предоставленной по Соглашению № 187, ГБПОУ ЛО «ВМТ» по запросу Контрольно-счетной палаты Ленинградской области представило (исх. от 22.09.2023 № 959) 4 договора на общую сумму 1 844,3 тыс. руб., заключенные и оплаченные в период с 20.03.2020 по 28.08.2020, т.е. до заключения ДС №1, вследствие чего не представляется возможным сделать вывод о том, что указанные расходы произведены за счет сформировавшегося на 15.10.2020 (дата заключения ДС № 1) остатка СИЦ, предоставленной по Соглашению № 187.

С учетом изложенного остаток предоставленной ГБПОУ ЛО «ВКТС» в соответствии с Соглашением № 187 СИЦ на 01.01.2021 в сумме 1 419,4 тыс. руб., потребность в котором не подтверждена, согласно пункту 15 Порядка № 522, пункту 2.4.8 Соглашения № 187 подлежит возврату (взысканию) в областной бюджет Ленинградской области.

1.3. В рамках соглашения от 11.06.2020 № 325⁷⁹ о предоставлении СИЦ на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» (далее – Соглашение № 325) в целях реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие

⁷⁵ Согласно пояснениям ГБПОУ ЛО «ВМТ» от 22.09.2023 № 959 ГБПОУ ЛО «ВКТС» договоры на проведение ремонтных работ лестничной клетки учебного корпуса № 1 на сумму 601,9 тыс. руб. в 2020 году не заключало.

⁷⁶ Согласно пояснениям ГБПОУ ЛО «ВМТ» (исх. от 30.08.2023 № 895) договоры на ремонт в аудитории 1-205 учебного корпуса № 1 ГБПОУ ЛО «ВКТС» не заключало.

⁷⁷ В сумме 6 785,7 тыс. руб.

⁷⁸ Текущий ремонт 15 помещений.

⁷⁹ Заключено на основании распоряжения Комитета от 04.02.2020 № 206-р.

профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» Комитетом ГБПОУ ЛО «ВАК» предоставлены средства в сумме 6 785,7 тыс. руб.

Для целей реализации мероприятия, определенного в пункте 1.1 Соглашения № 325, ГБПОУ ЛО «ВАК» заключено 11 государственных контрактов (договоров), из них без применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 9.

1.3.1. ГБПОУ ЛО «ВАК» в нарушение пункта 2.4.1 Соглашения № 325 не обеспечило расходование средств СИЦ, предоставленной на основании Соглашения № 325, в общей сумме 1 659,1 тыс. руб. в соответствии с целями ее предоставления, заключив и оплатив ряд договоров и контракт⁸⁰ на выполнение работ, не предусмотренных планом мероприятий⁸¹ к Соглашению № 325.

1.3.2. В нарушение пункта 23 Инструкции № 157н⁸², пункта 8 Федерального стандарта №257н⁸³ ГБПОУ ЛО «ВАК» не учтены как объекты нефинансовых активов стойки стальные с номерком, крючки с пластиковыми наконечниками общей стоимостью 304,1 тыс. руб., в том числе:

- общей стоимостью 228,1 тыс. руб., приобретенные и установленные в рамках договора от 15.07.2020 № 16295-20ЛО с ИП Бирюлиным В.И.⁸⁴;

- общей стоимостью 76,0 тыс. руб., приобретенные и установленные в рамках договора от 05.08.2020 № 17488-20ЛО с ИП Салтановой В.В.

1.3.3. Комитетом в предусмотренные Соглашением № 325 направления работ, осуществляемые за счет СИЦ, включен текущий ремонт помещения, связанного с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках государственного задания, на сумму 1 400,0 тыс. руб., что *не соответствует направлениям предоставления СИЦ, установленным пунктом 2 Порядка № 522.*

1.3.4. Остаток СИЦ, предоставленной ГБПОУ ЛО «ВАК» в 2020 году по Соглашению № 325, составил 263,3 тыс. руб., однако ГБПОУ ЛО «ВАК»

⁸⁰ Договор от 13.10.2020 № 21335-20ЛО с ООО «Александра» на сумму 36,8 тыс. руб., договор от 08.07.2020 № 15786-20ЛО с ООО «РемДом» на сумму 92,7 тыс. руб., договор от 11.08.2020 № 17599-20ЛО с ООО «РемДом» на сумму 521,0 тыс. руб., договор от 30.07.2020 № 17059-20ЛО с ООО «РемДом» на сумму 379,9 тыс. руб., контракт от 20.08.2020 № 18220-20ЛО с ООО «Интерьер» на 29,5 тыс. руб., договор от 21.07.2020 № 16552-20ЛО с ИП Тишкиным А.Л. на сумму 599,2 тыс. руб.

⁸¹ Приложение 4 к Соглашению № 325.

⁸² Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н).

⁸³ Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н (далее – Федеральный стандарт № 257н).

⁸⁴ При этом данная стоимость указана без учета стоимости работ по их монтажу и установке, отраженных в акте выполненных работ (КС-2) и увеличивающих стоимость нефинансового актива.

представило в Комитет отчет о реализации мероприятия⁸⁵ (без реквизитов), согласно которому СИЦ использована полностью⁸⁶, целевые показатели⁸⁷ достигнуты, *отразив таким образом в отчете недостоверную информацию.*

С учетом изложенного и согласно пункту 15 Порядка № 522, пункту 2.4.8 Соглашения № 325 *возврату (взысканию) в областной бюджет Ленинградской области подлежат средства СИЦ в общей сумме 1 922,4 тыс. руб., в т.ч.:*

- средства СИЦ, предоставленной на основании Соглашения № 325, по которым не обеспечено целевое использование, в общей сумме 1 659,1 тыс. руб.;

- остаток СИЦ, предоставленной на основании Соглашения № 325, обращений за наличием потребности в котором от ГБПОУ ЛО «ВАК» не последовало, в сумме 263,3 тыс. руб.

1.4. ГБПОУ ЛО «ВАК»⁸⁸ также были допущены нарушения при расходовании СИЦ, предоставленной Комитетом на основании соглашения от 17.02.2020 № 70 (далее – Соглашение № 70), в сумме 2 400,0 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области».

1.4.1. Так, в результате выполнения работ по текущему ремонту зданий, помещений ГБПОУ ЛО «ВАК», включенных в перечень приложения 4 к Соглашению № 70, в 2020 году использованы средства СИЦ в сумме 2 257,2 тыс. руб., остаток СИЦ, предоставленной ГБПОУ ЛО «ВАК» в 2020 году по Соглашению № 70, составил 142,8 тыс. руб., однако ГБПОУ ЛО «ВАК» представило в Комитет отчет о реализации мероприятия⁸⁹ (без реквизитов), согласно которому СИЦ использована полностью⁹⁰, целевые показатели⁹¹ достигнуты, *отразив таким образом в отчете недостоверную информацию.*

Заклучив договор от 03.06.2020 № 12688 с ООО «Александра» на сумму остатка (142,8 тыс. руб.) на выполнение работ по замене оконных блоков в учебной аудитории № 108 и установку светозащитных жалюзи в учебных аудиториях № 131 и № 134 здания ГБПОУ ЛО «ВАК», *ГБПОУ ЛО «ВАК» не обеспечило расходование средств СИЦ в сумме 142,8 тыс. руб.,*

⁸⁵ По форме согласно приложению 3 к Соглашению № 223.

⁸⁶ В сумме 6 785,7 тыс. руб.

⁸⁷ Текущий ремонт 15 помещений.

⁸⁸ Для целей реализации мероприятия, определенного в пункте 1.1 Соглашения № 70 ГБПОУ ЛО «ВАК» заключено 5 государственных контрактов (договоров) (все заключены без применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)).

⁸⁹ По форме согласно приложению 3 к Соглашению № 70.

⁹⁰ В сумме 2400 тыс. руб.

⁹¹ Текущий ремонт 1 помещения.

предоставленной на основании Соглашения № 70, в соответствии с целями ее предоставления, поскольку указанные работы планом мероприятий (приложение 4 к Соглашению № 70) не предусмотрены.

В нарушение пункта 23 Инструкции № 157н, пункта 8 Федерального стандарта № 257н ГБПОУ ЛО «ВАК» не учтены как объекты нефинансовых активов светозащитные жалюзи, приобретенные в количестве 19 шт.⁹² в учебные аудитории № 131 и № 134 на общую сумму 25,1 тыс. руб., а также стоимость работ по их монтажу и установке, отраженных в акте выполненных работ (КС-2) и увеличивающих стоимость нефинансового актива.

С учетом изложенного и согласно пункту 15 Порядка № 522, пункту 2.4.10 Соглашения № 70 возврату (взысканию) в областной бюджет Ленинградской области подлежат средства СИЦ в общей сумме 142,8 тыс. руб.

1.4.2. Кроме того, цена договора от 21.02.2020 № 5, заключенного ГБПОУ ЛО «ВАК» с ИП Тишкиным А.Л. на выполнение ремонтно-строительных работ по ремонту сантехники и электрики слесарного кабинета учебного корпуса филиала ГБПОУ ЛО «ВАК» на сумму 434,3 тыс. руб., до окончания срока действия договора⁹³ была увеличена на 88,5 тыс. руб., то есть 20% от цены договора, что нарушает требования подпункта 1² пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ⁹⁴.

2021 год

1.5. В рамках расходования СИЦ, предоставленной Комитетом Учреждению на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» (6.3) подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в сумме 17 665,71 тыс. руб.⁹⁵ на основании соглашения от 24.05.2021⁹⁶ (далее – Соглашение № 447)⁹⁷ были допущены следующие нарушения.

1.5.1. При заключении Учреждением договора с ООО «РемДом» на сумму 560,62 тыс. руб. на выполнение работ по частичному аварийному ремонту фасадов в учебном здании и общежитии ГБПОУ ЛО «ВКТС»,

⁹² Акт выполненных работ от 17.06.2020 № 3 (КС-2).

⁹³ До 30.04.2020.

⁹⁴ По соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

⁹⁵ КБК 068 0704 5260313770 612.

⁹⁶ Соглашение от 24.05.2021 № 447 о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели.

⁹⁷ Для целей реализации мероприятия, определенного в пункте 1.1 Соглашения № 447 Учреждением заключено 7 государственных контрактов (договоров), из них без применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 4.

расположенных по адресам: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 34 и Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 5, не обеспечено использование СИЦ на цели, предусмотренные Соглашением № 447, поскольку перечисленные в настоящем пункте работы не были предусмотрены приложением № 1⁹⁸ к Соглашению № 447.

Неиспользованный в 2021 году остаток⁹⁹ СИЦ, предоставленной по Соглашению № 447, в сумме 411,01 тыс. руб. использован в 2022 году в результате заключения 2 договоров.

1.5.2. Из описания объекта закупки по государственному контракту от 20.09.2021 № 47503¹⁰⁰ на текущий ремонт фонтана по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 34 с ООО «Левша»¹⁰¹ (далее также – Исполнитель, Подрядчик) на сумму 5 233,76 тыс. руб. (далее – Контракт № 47503) и актов о приемке выполненных работ № 1 и № 2 следует, что ООО «Левша» выполнены работы по демонтажу старого фонтана и устройству (монтажу) на его месте нового объекта учета.

Таким образом, в нарушение пункта 1.3 Порядка № 59, распоряжения № 2286-р¹⁰² и пунктов 1.1 и 4.3.1 Соглашения № 447 за счет средств СИЦ в сумме 4 822,75 тыс. руб., предоставленной на основании Соглашения № 447¹⁰³ на проведение текущего ремонта фонтана, Учреждением осуществлены капитальные работы¹⁰⁴ по созданию нового объекта учета путем приобретения и монтажа фонтана по Контракту № 47503 с ООО «Левша», т.е. средства СИЦ в указанной сумме направлены на цели, не соответствующие целям ее предоставления, предусмотренным Соглашением № 447.

В нарушение пункта 45 Федерального стандарта № 257н, пункта 12 Инструкции № 174н¹⁰⁵ демонтированный фонтан балансовой стоимостью 18,45 тыс. руб. не списан с балансового учета Учреждения, что подтверждается инвентарной карточкой учета нефинансовых активов № 11 и записями в оборотно-сальдовой ведомости по счету 101.00 за январь 2022 года.

В нарушение пункта 8 Федерального стандарта № 257н, пунктов 22 и 23 Инструкции № 157н и пункта 9 Инструкции № 174н работы по монтажу фонтана, находящегося в эксплуатации Учреждения, не учтены в

⁹⁸ Приложение № 1 «Перечень Субсидии (ий)».

⁹⁹ Распоряжением Комитета от 31.01.2022 № 165-р подтвержден к использованию в 2022 году.

¹⁰⁰ ИКЗ 212470200210147020100100250024322244., заключен по результатам проведения электронного аукциона.

¹⁰¹ Общество с ограниченной ответственностью «Левша», ИНН 7715601203.

¹⁰² Распоряжение Комитета от 30.12.2020 № 2286-р «О предоставлении субсидий на проведение ремонтных работ государственным бюджетным и автономным образовательным организациям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в 2021 году».

¹⁰³ С учетом дополнительного соглашения № 3 к Контракту № 47503, от 30.12.2021.

¹⁰⁴ Капитальные работы – работы по созданию новых и реконструкции действующих предприятий и объектов производственного и непроизводственного назначения.

¹⁰⁵ Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденная приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее – Инструкция № 174н).

бухгалтерском учете в составе основных средств, а списаны на счет 109.60 (КФО 5) «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» в сумме 4 822,75 тыс. руб., что подтверждается карточкой счета 302.25 за 2021 год по контрагенту ООО «Левша» и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 101.00 за 1 января 2022 года.

Следует также отметить, что акты о приемке выполненных работ № 1 и № 2, подтверждающие исполнение условий по Контракту № 47503, а также справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 составлены 14.12.2021 – на 9 дней позже установленного срока.

На запрос Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 22.08.2023 о предъявлении Учреждением ООО «Левша» требования об уплате неустойки за просрочку исполнения Контракта № 47503 получен ответ от 30.08.2023 № 895, согласно которому «...с сотрудника Учреждения, осуществлявшего контроль за сроками исполнения контрактов, взято пояснение и применены меры дисциплинарного воздействия, незамедлительно техникум направил требование об уплате штрафных санкций ООО «Левша» за несвоевременное исполнение условий контракта № 47503».

Учреждением представлена копия требования от 20.08.2023 № 345 об уплате пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении закупки товара.

За просрочку выполнения обязательств ООО «Левша» уплачены пени платежным поручением от 31.08.2023 № 361 в сумме 10,85 тыс. руб.

Письмом от 28.12.2021 № 277 за подписью директора ГБПОУ ЛО «ВМТ» Белицкого А.М. в связи с частичным, на сумму 4 822,75 тыс. руб., выполнением исполнителем работ по контракту¹⁰⁶, заключенному на сумму 5 233,76 тыс. руб., ГБПОУ ЛО «ВМТ» просит разрешения остаток субсидии по Соглашению № 447 на 01.01.2022 в размере 411,01 тыс. руб. использовать в 2022 году на цели, предусмотренные Соглашением № 447.

При этом в письме указан номер закупки 0345100008219000018. Согласно информации с сайта <https://zakupki.gov.ru> по данному номеру закупки зарегистрирована закупка по выполнению работ по валке деревьев на территории ГБПОУ ЛО «ВАК» по адресам: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д.34; г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 14а.

Согласно пояснениям от 30.08.2023 № 895 в письме от 28.12.2021 № 277 «...допущена техническая ошибка, а именно указаны неверно дата и номер контракта, а также номер закупки».

За счет подтвержденного к использованию в 2022 году распоряжением Комитета от 31.01.2022 № 165-р¹⁰⁷ остатка СИЦ по Соглашению № 447 в сумме 411,01 тыс. руб. были заключены:

¹⁰⁶ В связи с уменьшением цены Контракта № 47503 в соответствии с дополнительным соглашением от 30.12.2021 № 3 к Контракту № 47503.

¹⁰⁷ Распоряжение Комитета от 31.01.2022 № 165-р «О подтверждении остатка субсидий на иные цели 2021 года государственным бюджетным и автономным образовательным организациям,

- договор от 26.04.2022 № 64152 с ООО «Волховское специализированное предприятие «Электроком»¹⁰⁸ на сумму 53,37 тыс. руб. на выполнение монтажных работ: прокладка кабеля электроснабжения к фонтану здания ГБПОУ ЛО «ВМТ» (по адресу: Ленинградская область, Волхов, Кировский проспект, д. 34) (далее – Договор № 64152);

- договор от 19.05.2022 № 66476 с ООО «Цивилист Стройэксперт»¹⁰⁹ на сумму 365,68 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по подключению фонтана к системам водоснабжения и канализации по адресу: Ленинградская область, Волхов, Кировский проспект, д. 34 (далее – Договор № 66476).

Из приведенного перечня выполненных по Договору № 64152 и Договору № 66476 работ и с учетом отсутствия в акте о приемке выполненных работ информации о проведении демонтажа отдельных элементов существовавшей сети электроснабжения фонтана следует, что выполненные работы связаны не с ремонтом, а с проведением капитальных работ по подключению созданного объекта учета – фонтана к системам энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения и приведения фонтана в работоспособное состояние, что свидетельствует об использовании средств субсидии в сумме 419,05 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств субсидии 2022 года – 8,04 тыс. руб.¹¹⁰) не в соответствии с целями ее предоставления, предусмотренными Соглашением № 447.

В то же время, согласно инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 11 от 19.07.2023 (форма по ОКУД 0504031), объект учета – Фонтан декоративный с пирамидой из бутовых камней рваной формы, по периметру земляного возвышения – поребрик, балансовой стоимостью 18,45 тыс. руб. введен в эксплуатацию 29.07.1960. Работы по дооборудованию, модернизации в инвентарной карточке не отражены.

В нарушение пунктов 8 и 15 Федерального стандарта № 257н, пунктов 22 и 23 Инструкции № 157н и пункта 9 Инструкции № 174н строительно-монтажные работы по подключению фонтана к системам электроснабжения, водоснабжения и канализации не отнесены на стоимость создаваемого объекта учета – фонтана, находящегося в эксплуатации Учреждения, что подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по счету 101.00 за 1 января 2023 года.

1.5.3. Показатели результатов предоставления СИЦ по Соглашению № 447 в части количества объектов¹¹¹, поименованных в приложении № 1 к

подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области для дальнейшего использования в 2022 году».

¹⁰⁸ Общество с ограниченной ответственностью «Волховское специализированное предприятие «Электроком» (ООО «ВСП «Электроком»), ИНН 4702007420.

¹⁰⁹ Общество с ограниченной ответственностью «Цивилист Стройэксперт» (ООО «ЦСЭ»), ИНН 7811698935.

¹¹⁰ Субсидия по соглашению от 15.02.2022 № 235 о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели.

¹¹¹ Объекты в г. Волхов: на ул. Дзержинского, д. 26, на ул. Воронежская, д. 4 и Кировский проспект, д. 34.

Соглашению № 447¹¹², перевыполнены (с учетом ремонта фасада общежития на ул. Лукьянова, д. 5) без внесения изменений в Соглашение № 447, а в части количества помещений, планируемых к ремонту Учреждением, не достигнуты. Из таблицы 2 следует, что проведен ремонт лишь в помещениях столовой, актовом зале с костюмерной и вентиляционном помещении без ремонта 5 аудиторий.

Кроме того, создан новый объект, не предусмотренный приложением № 1 к Соглашению № 447¹¹³ (предусматривался ремонт фонтана, а не демонтаж старого и строительство нового фонтана).

Анализ достижения результатов предоставления СИЦ на основании Соглашения № 447 приведен в таблице 2.

Таблица 2

Результат предоставления субсидии	План	Факт (по результатам мероприятия)	Отклонение (гр. 3- гр.2)
1	2	3	4
Количество объектов, подлежащих ремонту (шт.)	3	4	+1
Количество помещений, планируемых к ремонту (шт.)	9	4	-5 ¹¹⁴
Количество видов работ, проводимых в текущем году (шт.)	6	6	-

2022 год

1.6. В рамках расходования СИЦ, предоставленной Комитетом ГБПОУ ЛО «ВМТ» в целях проведения мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» на основании соглашения от 15.02.2022 № 235 (далее – Соглашение № 235) в сумме 18 000 тыс. руб.¹¹⁵ ГБПОУ ЛО «ВМТ» заключило 29 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 18 000,0 тыс. руб.¹¹⁶ (с учетом расторгнутого в связи с невыполнением исполнителем условий контракта¹¹⁷ на сумму 2 349,95 тыс. руб., заключенного с ООО «СК Старт»¹¹⁸ на выполнение текущего ремонта

¹¹² Ремонт столовой, 187401, г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 – на сумму 1 644,3 тыс. руб.; ремонт актового зала, 187401, г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4 – на сумму 10 134,0 тыс. руб.; ремонт фонтана и учебных аудиторий, 187403, г. Волхов, Кировский пр., д. 34. – на сумму 5 887,4 тыс. руб.

¹¹³ К ответу от 22.09.2023 № 959 на запрос от 20.09.2023 Учреждением представлена копия письма на Комитет от 14.06.2021 № 381 с просьбой внести изменения в приложение № 1 к Соглашению № 447 в части замены ремонта учебных аудиторий ремонтом фасадов зданий.

Изменения в приложение № 1 к Соглашению № 447 не вносились.

¹¹⁴ Учебные аудитории.

¹¹⁵ КБК 068 0704 0240413770 612.

¹¹⁶ Дополнительным соглашением от 15.11.2022 № 235/2 объем СИЦ сокращен на 2349,5 тыс.руб. письмом ГБПОУ «ВМТ» от 24.10.2022 № 415 (к проверке не представлялось).

¹¹⁷ ИКЗ 222470200210147020100100200014391244.

¹¹⁸ ИНН 7820080207.

кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4, корпус № 2).

В ходе исполнения Соглашения № 235 были допущены следующие нарушения и недостатки.

1.6.1. В нарушение пункта 1.3 Порядка № 59¹¹⁹ Комитетом Соглашением № 235 предусматривается ремонт в помещениях ГБПОУ ЛО «ВМТ» по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, 26:

- учебной аудитории № 11 учебного корпуса;
- учебных аудиторий площадки № 3.

Таким образом, расходование¹²⁰ ГБПОУ ЛО «ВМТ» СИЦ на общую сумму 691,19 тыс. руб., предоставленной на основании Соглашения № 235, осуществлялось не в соответствии с целями, установленными пунктом 1.3 Порядка № 59.

1.6.2. В ходе использования СИЦ, предоставленной по Соглашению № 235 на работы по монтажу системы пропускного режима в учебное здание по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Воронежская, д. 4, находящееся в эксплуатации ГБПОУ ЛО «ВМТ», выполненные ООО «ЛенИнфоСервис» на сумму 66,9 тыс. руб. по договору от 30.06.2022 № 079/22, и работы по устройству покрытия из брусчатки у здания ГБПОУ ЛО «ВМТ» по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 34, на сумму 599,0 тыс. руб., выполненные по договору от 13.06.2022 № 70794-22ЛО с КФХ Гадиров В.А.¹²¹, нарушены:

- требования пункта 8 Федерального стандарта № 257н, пунктов 22 и 23 Инструкции № 157н и пункта 9 Инструкции № 174н - поскольку в бухгалтерском учете в составе основных средств не учтены вновь созданные объекты учета, каковыми, согласно перечисленным договорам, являются система пропускного режима в учебное здание (с учетом работ по монтажу) общей стоимостью 66,9 тыс. руб. и тротуар из брусчатки¹²² (с учетом работ по установке) стоимостью 599,0 тыс. руб., списаны на счет 109.60 (КФО 5) «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» в сумме 66,98 тыс. руб. и на счет 401.20 (КФО 5) «Расходы текущего финансового года» в сумме 599,0 тыс. руб., что подтверждается карточками счета 302.25 за 2022 год по контрагентам «ЛЕНИНФОСЕРВИС ООО» и КФХ Гадиров В.А., оборотно-сальдовой ведомостью по счету 101.00 за 1 января 2023 года;

- положения Соглашения № 235 в части:

направления средств СИЦ не на цели получения СИЦ - проведение ремонтных работ, а на создание новых объектов основных средств, недостижения показателей предоставления субсидии.

¹¹⁹ Согласно которому субсидии на иные цели предоставляются учреждениям в целях реализации мероприятий, не относящихся к финансовому обеспечению выполнения государственного задания.

¹²⁰ Косметический ремонт аудитории № 11 выполнен ООО «РемДом» по договору № 65468 от 13.05.2022 и оплачен в сумме 92,42 тыс. руб.; косметический ремонт учебных аудиторий площадки № 3 выполнен ИП Тишкиной А.В. по договору от 28.06.2022 № 70166 и оплачен в сумме 598,77 тыс. руб.

¹²¹ Крестьянское (фермерское) хозяйство Гадиров Вячеслав Атрафович, ИНН 781652005934.

¹²² На учете Учреждения тротуары не числятся, что подтверждается оборотно-сальдовыми ведомостями по счету 101.00 за 1 января 2022 года и за 1 января 2023 года.

1.6.3. За счет СИЦ, предоставленной на основании Соглашения № 235, ГБПОУ ЛО «ВМТ» в целях текущего ремонта внутренних санитарно-технических трубопроводов со сменой радиаторов и системы центрального отопления (смена розлива) в здании общежития ГБПОУ ЛО «ВМТ» по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 14а в течение 1,5 месяцев заключило с ООО «РемДом» два договора¹²³ на общую сумму 1 099,85 тыс. руб.

Заключение двух направленных на достижение единой хозяйственной цели договоров на общую сумму, превышающую установленную пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, без применения конкурентных способов закупки в течение короткого промежутка времени с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем) имеет признаки уклонения от проведения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ) и пунктов 23 и 25 Инструкции № 157н Учреждением не отражены в бухгалтерском учете 126 м труб диаметром до 63 мм и 63 м труб диаметром до 32 мм, разобранных при проведении текущего ремонта системы центрального отопления по Договору № 66994, и 108 м труб и 20 шт. радиаторов, демонтированных при проведении текущего ремонта внутренних санитарно-технических трубопроводов по Договору № 71091.

На запрос от 05.09.2023 о предоставлении документов по отражению в бухгалтерском учете 189 м труб, демонтированных при проведении текущего ремонта системы центрального отопления по Договору № 66994, 108 м труб и 20 шт. радиаторов, демонтированных при проведении текущего ремонта внутренних санитарно-технических трубопроводов по Договору № 71091, Учреждением письмом от 11.09.2023 № 926 сообщено следующее.

«Фактическая оценка количества металла определяется после заключения договора со специализированной организацией. Оприходование металлолома на учет техникума осуществляется по результатам взвешивания на базе специализированной организации и в присутствии представителя техникума с подписанием акта сдачи-приемки и указанием контрольного веса, вида, подвида металлолома. После оформления приходного ордера в бухгалтерском учете и подписания ответственным сотрудником за ведение хозяйственной жизни техникума, металлический лом пускается на реализацию с оформлением формы ТОРГ-12. Собственных весов для взвешивания металлического лома у техникума нет».

¹²³ Договор от 23.05.2022 № 66994 (на проведение текущего ремонта системы центрального отопления (смена розлива) в здании общежития по указанному адресу) (далее – Договор № 66994), договор от 07.07.2022 № 71091 (на выполнение текущего ремонта внутренних санитарно-технических трубопроводов со сменой радиаторов в здании общежития ГБПОУ ЛО «ВМТ», по адресу: г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 14а) (далее – Договор № 71091).

Представлены акты № 4-66994 и № 4-71091 о приемке материалов (вторсырья) с последующим оприходованием, утвержденные директором Учреждения 31.05.2023 и 11.07.2023 соответственно, которыми подтверждается передача ООО «РемДом» 126 м труб диаметром до 63 мм и 63 м труб диаметром до 32 мм Учреждению с отметкой о доставке на склад 31.05.2022; 108 м труб и 20 шт. радиаторов Учреждению с отметкой о доставке на склад 11.07.2022.

В представленных Учреждением письмом от 11.09.2023 № 926 информации, документах и материалах реализация лома не подтверждена, платежное поручение о поступлении на счет Учреждения денежных средств по данной хозяйственной операции не представлено.

В рамках Мероприятия была проведена выборочная проверка соответствия фактически выполненных работ принятым и оплаченным подрядчикам по договорам №№ 66994 и 71091, по результатам которой установлено:

- в рамках исполнения Договора № 66994 - несоответствие предъявленных к оплате работ по врезке в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм по нормам расценки ТЕР-16-07-033-06 (пункт 1 Акта КС-2) фактически выполненным, *что привело к завышению стоимости работ на общую сумму 18,0 тыс. руб.;*

- в рамках исполнения Договора № 71091 - установлены радиаторы с показателями, не соответствующими заявленным в локальном сметном расчете и акте КС-2 от 11.07.2022 № 45, *что привело к завышению стоимости работ на 98,4 тыс. руб.*

1.6.4. В рамках договора от 13.05.2022 № 65422 с ООО «Левша» на сумму 392,24 тыс. руб., заключенного на выполнение текущего ремонта фонтана ГБПОУ ЛО «ВМТ» по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, д. 34 (далее – Договор № 65422), были выполнены пусконаладочные работы созданного объекта учета - фонтана с соответствующими измерениями электрической сети, предварительное испытание и приемо-сдаточные испытания¹²⁴, которые к ремонтным работам не относятся¹²⁵ и не соответствуют целям, определенным Соглашением № 235.

¹²⁴ Согласно акту о приемке выполненных работ от 16.05.2022 № 1.

¹²⁵ Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.04.2012 № 1151-08/ДШ-ОГ группа видов работ № 24 Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, предусматривает виды работ по пусконаладочным работам оборудования, устанавливаемого при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объекта капитального строительства. При этом необходимо учитывать, что пусконаладочные работы – это комплекс работ, выполняемых в период подготовки его к эксплуатации, при котором проводятся индивидуальные испытания и комплексные опробования оборудования применительно к строящемуся объекту. Задачами пусконаладочных работ являются выявление возможных ошибок проектных и строительно-монтажных работ и обнаружение недостатков в работе оборудования до начала его эксплуатации на объектах капитального строительства.

Пусконаладочные работы фонтана являются заключительным этапом создания объекта учета – фонтана и стоимость этих работ в соответствии с требованиями Федерального стандарта № 257н, Инструкции № 157н и Инструкции № 174н подлежит отнесению в объеме фактических затрат на счет учета вложений в нефинансовые активы (счет 106.00) для формирования стоимости объекта учета и дальнейшего отнесения на счет учета основных средств (счет 101.00).

В нарушение пункта 8 Федерального стандарта № 257н, пунктов 22 и 23 Инструкции № 157н и пункта 9 Инструкции № 174н работы по пусконаладке фонтана, находящегося в эксплуатации Учреждения, не учтены в бухгалтерском учете в составе основных средств, а списаны на счет 401.20 (КФО 5) «Расходы текущего финансового года» в сумме 392,24 тыс. руб., что подтверждается карточкой счета 302.25 за 2022 год по контрагенту «ЛЕВША ООО» и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 101.00 за 1 января 2023 года.

Средства СИЦ в сумме 392,24 тыс. руб., предоставленные на основании Соглашения № 235, были направлены не на цели получения СИЦ - проведение ремонтных работ, а на создание новых объектов основных средств, что не соответствует направлениям расходования СИЦ, установленным Соглашением № 235.

1.6.5. В ходе выборочной проверки соответствия фактически выполненных работ принятым и оплаченным по государственному контракту от 22.06.2022 № ЭА-2646/22 на текущий ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13 (подрядчик ИП Важник Сергей Васильевич), установлено следующее.

1.6.5.1. Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) по **текущему** ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» рассчитана на основании локального сметного расчета и составила 2 999,8 тыс. руб.

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 10.06.2022 № 0345100008122000001-1-1¹²⁶ на право заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13, победителем электронного аукциона признан участник (ИП Важник Сергей Васильевич), предложивший цену контракта 1 784,9 тыс. руб. (снижение на 40,5000041336%, коэффициент снижения К=0,59499995866).

Согласно пункту 5 Перечня основных работ по текущему ремонту зданий и объектов Приложения № 7 ВСН 58-88 (р) к **текущему ремонту кровли относится частичная замена рулонного ковра.**

¹²⁶ Размещено на сайте в сфере закупок.

В то же время сметной документацией на выполнение работ по текущему ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» к государственному контракту от 22.06.2022 № ЭА-2646/22 предусмотрено проведение всего комплекса работ по замене мягкой кровли с устройством выравнивающих стяжек основания кровли, окрытия парапетов из листовой стали, то есть устранение неисправностей всех изношенных элементов мягкой кровли.

Проведенной 10.10.2023 выездной проверкой принятых и оплаченных работ по ремонту кровли установлено, что ремонт мягкой кровли выполнен на всей площади кровли учебного корпуса.

Таким образом, проведенный ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» является *капитальным ремонтом*¹²⁷.

С учетом вышеизложенного средства СИЦ в сумме 1 784,9 тыс. руб., предоставленные на основании Соглашения № 235, были направлены ГБПОУ ЛО «ВМТ» на цели, не соответствующие целям ее предоставления, предусмотренным Соглашением № 235.

1.6.5.2. В нарушение требований части 1 статьи 8³, части 3 статьи 8⁴ Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию¹²⁸, приказа комитета по строительству Ленинградской области от 20.10.2015 № 28 ГБПОУ ЛО «ВМТ» при формировании НМЦК на ремонт кровли учебного корпуса по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13 по государственному контракту от 22.06.2022 № ЭА-2646/22 применены сметно-нормативная база и индексы изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемые ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (далее – СНБ КЦЦС), не включенные в федеральный реестр сметных нормативов.

1.6.5.3. Локальной сметой на выполнение работ по текущему ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ», утвержденной директором ГБПОУ ЛО «ВМТ» 22.06.2022 (далее – локальная смета № 7),

¹²⁷ Согласно пункту 14² статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Согласно пункту 5.1 ВСН 58-88 (р) капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.

¹²⁸ Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию).

предусмотрено применение коэффициента $K=1,15$, учитывающего производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях населенных пунктов, к нормам заработной платы рабочих, машинистов и эксплуатации машин.

В локальной смете № 7 дано обоснование применения указанного коэффициента – в соответствии с приложением 2 таблицы 1 пункта 5 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр¹²⁹, который на момент проведения аукциона и заключения государственного контракта от 22.06.2022 № ЭА-2646/22 утратил силу в связи с изданием приказа Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр¹³⁰, действовал приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр¹³¹.

Согласно подпункту «ж» пункта 23 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию наличие сложных производственных условий для объектов непроизводственного назначения, вследствие чего снижается производительность труда рабочих и строительной техники, должно содержаться в текстовой части проекта организации строительства, а именно: описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи, который по объекту: текущий ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» отсутствует.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 53.1 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, *стесненные условия населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных факторов: интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов; ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.*

¹²⁹ Приказ Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» (далее – приказ Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр, Методика приказа Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр).

¹³⁰ Приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы» (далее – приказ Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр).

¹³¹ Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (далее – приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Методика приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр).

Проведенной 10.10.2023 выездной проверкой принятых и оплаченных работ по ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» не подтверждено выполнение работ в сложных производственных условиях с одновременным наличием трех факторов, определяющих стесненные условия населенных пунктов.

Учитывая вышеизложенное, применение коэффициента $K=1,15$ к нормам заработной платы рабочих, машинистов и эксплуатации машин не обосновано.

Локальной сметой № 7 предусмотрены затраты по работе крана для подачи материалов на кровлю в количестве 9 машиномен (пункт 21 сметы).

Согласно пункту 12.1.1 раздела I Общие положения сборника 12 Кровли ГЭСН 81-02-12-2022¹³² в ГЭСН сборника 12 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте более 15 м нормы затрат труда увеличиваются на 0,5 процента на каждый последующий метр высоты.

Проведенной 10.10.2023 выездной проверкой принятых и оплаченных работ по ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» установлено, что высота учебного корпуса составляет 9,95 м, что подтверждается данными технического паспорта на общественно-бытовой блок, составленного по состоянию на 20.05.2013 ГУП «Леноблинвентаризация» филиала Волховского городского БТИ (реестровый номер 64-35-45, кадастровый номер 47-14-15/2004-464, инвентарный номер 413-Д).

Таким образом, предъявление к оплате затрат по работе крана для подачи материалов на кровлю является необоснованным.

1.6.5.4. Локальной сметой № 7 предусмотрены и предъявлены к оплате затраты по устройству кровель скатных из наплавливаемых материалов (расценка ТЕР-12-01-001-06, пункт 7 сметы).

Согласно ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020¹³³:

- пункт 3.3.2.23 «плоская крыша: Крыша без уклона или с уклоном не более 10° »;

- пункт 3.3.2.24 «скатная крыша: Крыша с уклоном более 10° градусов (примерно 15%)».

Проведенной 10.10.2023 выездной проверкой принятых и оплаченных работ по ремонту кровли установлено, что уклон крыши учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» составляет 1%.

Таким образом, крыша учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» является плоской, применение расценки ТЕР-12-01-001-06 «Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов» является неправомерным.

¹³² ГЭСН 81-02-12-2022. Сметные нормы на строительные работы. Сборник 12. Кровли (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр) (далее - ГЭСН 81-02-12-2022).

¹³³ ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Общие термины (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.12.2020 № 1388-ст) (далее - ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020).

1.6.5.5. Локальной сметой № 7 (пункт 5 сметы) предусмотрены затраты на выполнение работ по устройству пароизоляции основания кровли праймером.

Фактически выполнены работы по огрунтовке кровли праймером.

При этом значительно (в 5 раз к нормативному) завышен расход праймера (пункт 6 сметы), не учтенного нормой ТЕР-12-01-015-04.

1.6.5.6. Локальной сметой № 7 (пункт 12 сметы) предусмотрены затраты на выполнение работ по огрунтовке оснований парапета из бетона или раствора.

Расход ресурса (грунтовка), не учтенного нормой ТЕР-12-01-016-02, не соответствует нормативному, а цена ресурса завышена в 2 раза (пункт 13 сметы).

1.6.5.7. Локальной сметой № 7 (пункт 14 сметы) предусмотрены затраты на выполнение работ по штукатурке по сетке без устройства каркаса (парапета).

Расход ресурса (ЦПС), не учтенного нормой ТЕР-15-02-036-03, не соответствует нормативному, а цена ресурса завышена в 4 раза (пункт 15 сметы).

1.6.5.8. Локальной сметой № 7 (пункт 16 сметы) предусмотрены затраты на выполнение работ по устройству примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам.

Расход ресурсов (изопласт ХПП-3 и ЭКП-5), не учтенных нормой ТЕР - 12-01-004-04, не соответствует нормативному, а цены ресурсов завышены в 1,5 раза (пункты 17 и 18 сметы).

1.6.5.9. Локальной сметой № 7 (пункт 19 сметы) предусмотрены затраты на выполнение работ по устройству мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали.

Примененный ресурс (карнизные свесы, парапеты, отливы из оцинкованной стали, пункт 20 сметы) не соответствует норме ТЕР-12-01-010-01, согласно которой изготовление картин из оцинкованной стали учтено нормой расценки, а в качестве неучтенного материала применяется сталь оцинкованная.

Нарушения, указанные в пунктах 1.6.5.2-1.6.5.9, привели к завышению НМЦК на сумму 1 937,8 тыс. руб.

Следует отметить, что проверка сметной документации на предмет соответствия или несоответствия сметным нормативам принятых решений в смете б/н «Текущий ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13, не проводилась.

Ведомость № 1 пересчета НМЦК по локальной смете № 7 представлена в приложении 18 к заключению.

С учетом понижающего коэффициента $K=0,59499995866$ *завышение стоимости работ составило 1 153,0 тыс. руб.*¹³⁴

1.6.5.10. Локальным сметным расчетом от 28.06.2022 предусмотрено, в акте КС -2 от 18.07.2022 № 2 предъявлена к оплате установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ в объеме 76 кв. м (расценка ТЕР 08-07-001-02, пункт 1 акта КС-2).

Согласно пункту 1.8.13 ГЭСН 81-02-08-2022¹³⁵ расценками Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки стен высотой до 4 м.

Технической частью сборника 12 Кровли ГЭСН 81-02-12-2022 устройство лесов при проведении кровельных работ не предусмотрено.

Проведенной 10.10.2023 выездной проверкой принятых и оплаченных работ по ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» установлено, что при проведении работ по ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» отсутствует необходимость установки наружных инвентарных лесов.

Согласно представленным письмами ГБПОУ ЛО «ВМТ» от 18.10.2023 № 72/2023 и № 73/2023 пояснениям при проведении работ по ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО «ВМТ» для установки опалубки и последующего бетонирования отверстий от демонтированных вентиляторов возникла необходимость установки внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 10 м в актовом и спортивном залах.

Учитывая вышеизложенное, оплата установки и разборки наружных инвентарных лесов является необоснованной.

1.6.5.11. Локальным сметным расчетом от 28.06.2022 предусмотрен, в акте КС -2 от 18.07.2022 № 2 предъявлен к оплате материальный ресурс «Бетон тяжелый В 20 (М 250)» (пункт 7 сметы и акта КС-2).

Приготовление бетона, включая стоимость всех ресурсов, учтено нормами расценки ТЕР-06-01-080-11 «Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 20» (п. 4 Акта КС-2).

Таким образом, повторный учет стоимости бетона не обоснован.

1.6.5.12. Локальным сметным расчетом от 28.06.2022 предусмотрено, в акте КС -2 от 18.07.2022 № 2 предъявлены к оплате затраты по устройству обрешетки сплошной из досок (расценка ТЕРр58-12-001, пункт 10 Акта КС-2).

Фактически, согласно представленным письмами ГБПОУ ЛО «ВМТ» от 18.10.2023 № 72/2023 и № 73/2023 материалам фото- и видеофиксации, для крепления металлических окрытий парапетов выполнены работы по

¹³⁴ Ведомость №2 «Расчет завышения стоимости работ и затрат по Акту КС - 2 от 18.07.2022 № 1 представлена в приложении 19 к заключению.

¹³⁵ ГЭСН 81-02-08-2022. Сметные нормы на строительные работы. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр) (далее - ГЭСН 81-02-08-2022).

устройству обрешетки по парапетам кровли из досок с прозорами, что соответствует нормам, предусмотренным расценкой ТЕРр58-12-002 «Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали».

Нарушения, указанные в пунктах 1.6.5.10-1.6.5.12 настоящего заключения, *привели к завышению стоимости работ на общую сумму 47,9 тыс. руб.*

В связи с нарушениями, выявленными в ходе формирования НМЦК государственного контракта от 22.06.2022 № ЭА-2646/22, также была проведена проверка формирования НМЦК:

- по текущему ремонту тренажерного зала, находящегося по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 (договор от 28.06.2022 № 70165 на сумму 597,32 тыс. руб., подрядчик ИП Тишкина Анжелика Викторовна);

- по текущему ремонту учебных аудиторий площадки № 3 ГБПОУ ЛО «ВМТ», расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26 (договор от 28.06.2022 № 70166 на сумму 598,77 тыс. руб., подрядчик ИП Тишкина Анжелика Викторовна),

в ходе которой также выявлены завышения НМЦК на 189,4 и 316,6 тыс. руб. соответственно.

Вышеизложенное свидетельствует, что нарушения, допущенные должностными лицами ГБПОУ ЛО «ВМТ» при определении НМЦК, носят системный характер, а в совокупности с ранее сделанным выводом о намеренном дроблении закупок при заключении вышеперечисленных договоров с ИП Тишкиной А.В., влекут коррупционные риски.

2. В ходе анализа использования СИЦ, предоставленных на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», установлено следующее.

В пункте 3 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309, перечислены условия доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами, которые обеспечиваются руководителями органов и организаций:

- а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
- в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н.

В соответствии с разделом 2 «Характеристика основных мероприятий и проектов подпрограммы» основного мероприятия «Мероприятия по приспособлению объектов для доступа инвалидов и маломобильных групп населения» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Ленинградской области» (в редакции, действовавшей до 01.01.2022) предусматривается:

- продолжение работы по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности;

- продолжение работы по обследованию жилых помещений в целях приспособления с учетом потребностей инвалидов;

- работы по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов;

- разработка, формирование и обновление карты доступности объектов и услуг Ленинградской области;

- приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН.

В ходе анализа расходования СИЦ РС, предоставленных на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области», выявлены следующие нарушения и недостатки.

2020 год

2.1. В рамках расходования СИЦ, предоставленной Комитетом ГБПОУ ЛО «ВАК» на реализацию мероприятия «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального

образования» в рамках основного мероприятия «Мероприятия по приспособлению объектов для доступа инвалидов и маломобильных групп населения» подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» на основании соглашения от 09.04.2020 № 205 (далее – Соглашение № 205) в сумме 4 000,0 тыс. руб., ГБПОУ ЛО «ВАК» заключил 8 контрактов (договоров), из них 7 – без применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В ходе исполнения Соглашения № 205 были допущены следующие нарушения и недостатки.

2.1.1. Системный характер (3 договора из 4) увеличения объема выполняемых работ и цены договоров на сумму, не превышающую 10 %, заключенных в 2020 году в рамках Соглашения № 205, может свидетельствовать о низком качестве планирования.

2.1.2. Ремонтные работы в аудитории № 134 в учебном корпусе ГБПОУ ЛО «ВАК», на выполнение которых заключен договор от 10.07.2020 № ЭА-3/2020 с ИП Тишкиным А.Л. на сумму 1 290,0 тыс. руб., *не связаны с приспособлением объекта для доступа инвалидов и МГН, в связи с чем средства СИЦ в сумме 1 290,0 тыс. руб., предоставленной на основании Соглашения № 205, направлены на цели, не предусмотренные Соглашением № 205.*

2.1.3. Договор от 22.06.2020 № 14825-20ЛО с ООО «СтройКомплект» заключен на выполнение работ по монтажу и пусконаладке вертикальной подъемной платформы для инвалидов в учебном корпусе ГБПОУ ЛО «ВАК» на сумму 390,0 тыс. руб., приобретение которой, монтаж и пусконаладка не включены в приложение 2 (целевые показатели) к распоряжению Комитета от 08.04.2020 № 714-р.

Таким образом, *в нарушение пункта 2.4.1 Соглашения № 205 ГБПОУ ЛО «ВАК», приобретя вертикальную подъемную платформу для инвалидов, а также проведя работы по монтажу и пусконаладке указанной платформы на общую сумму 390,0 тыс. руб., использовал средства СИЦ не в соответствии с целями ее предоставления.*

Кроме того, *в нарушение пункта 23 Инструкции № 157н, пункта 8 Федерального стандарта № 257н ГБПОУ ЛО «ВАК» вертикальная подъемная платформа для инвалидов не учтена как объект нефинансовых активов общей стоимостью 390,0 тыс. руб. (с учетом стоимости работ по монтажу и пусконаладке).*

2.1.4. Также *в нарушение пункта 2.4.1 Соглашения № 205 ГБПОУ ЛО «ВАК», приобретя по договору от 05.08.2020 № 17480-20ЛО с ООО «Экспресс Контракт» парты с закругленными краями на сумму 42,0 тыс. руб., заключив договор от 23.07.2020 № 16693-20ЛО с ИП Тишкиным А.Л. на выполнение работ по ремонту туалета для инвалидов в учебном корпусе*

на сумму 599,2 тыс. руб.¹³⁶, использовал средства СИЦ не в соответствии с целевыми показателями.

2021 год.

2.2. В рамках расходования СИЦ, предоставленной Комитетом Учреждению на реализацию мероприятия 3.1.2 «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования» в рамках проведения мероприятия 3.1 «Мероприятия по приспособлению объектов для доступа инвалидов и маломобильных групп населения» подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» на основании соглашения от 17.05.2021 № 395 (далее – Соглашение № 395)¹³⁷ в сумме 3 000,0 тыс. руб., Учреждение заключило 8 договоров, все заключены без применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Средства СИЦ в общей сумме 1 659,4 тыс. руб., предоставленные на основании Соглашения № 395, были направлены ГБПОУ ЛО «ВМТ» на оплату договоров на выполнение текущего ремонта помещений, который не связан с приспособлением объекта для доступа инвалидов и МГН (что следует из приведенного перечня выполненных подрядчиками работ и использованных материалов, паспортов доступности, а также пояснений директора ГБПОУ ЛО «ВМТ» от 01.11.2023 б/н), т.е. на цели, не соответствующие целям ее предоставления, предусмотренным Соглашением № 395.

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по Соглашению № 395 содержит недостоверную информацию о выполнении ремонта в аудитории № 128 и в 3-х помещениях (комнатах) для проживания маломобильных групп. Вместо аудитории № 128¹³⁸ проведен ремонт в аудитории № 15¹³⁹, вместо ремонта комнат выполнен ремонт зоны целевого назначения¹⁴⁰.

Контроль за использованием средств, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, осуществляется в рамках:

- Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.12.2012 № 391 (далее – Порядок № 391);

¹³⁶ Не предусмотренные показателями (приложение 2 (целевые показатели), утвержденные распоряжением Комитета от 08.04.2020 № 714-р)

¹³⁷ КБК 068 0704 5330113760 612.

¹³⁸ По адресу: г. Волхов, Кировский пр. 34.

¹³⁹ По адресу: г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 26.

¹⁴⁰ Помещения №№ 2, 58 и 50 общежития по адресу: г. Волхов, ул. Лукьянова, д. 5.

- Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных автономных учреждений Ленинградской области, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 № 290 (далее – Порядок № 290);

- Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 № 574) (далее – Порядок № 574);

- Порядка осуществления органами исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Ленинградской области, права собственника имущества государственных унитарных предприятий Ленинградской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 09.09.2019 № 411 (далее также – Постановление № 411, Порядок № 411);

- Порядка № 522, согласно которому главный распорядитель средств областного бюджета Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственных учреждений Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством осуществляет проверку соблюдения государственным учреждением Ленинградской области условий, целей и порядка предоставления СИЦ;

- Порядка № 59, согласно которому Комитет осуществляет контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям СИЦ.

В рамках проведения анализа осуществления контроля Комитетом за использованием средств, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, выявлены следующие недостатки.

1. В 2020-2021 годах контроль за деятельностью подведомственных Комитету государственных автономных учреждений Ленинградской области Комитетом не осуществлялся¹⁴¹.

2. В нарушение положений нормативных правовых актов Ленинградской области, регулирующих порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области¹⁴², согласно которым плановые проверки в отношении каждого учреждения проводятся не реже одного раза в три года, в период 2020-2023 годов не запланированы и не проводились плановые проверки деятельности:

¹⁴¹ План на 2022 год утвержден председателем Комитета 21.12.2021, на 2023 год план утвержден распоряжением Комитета от 12.09.2022 № 1738-р.

¹⁴² Пункт 2.4 Порядка № 391, пункт 2.4 Порядка № 290.

- ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» и «Подпорожский политехнический техникум»;
- ГАПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса» и «Приозерский политехнический колледж».

В ряде случаев цели и(или) задачи и предмет проверки, указанные в распоряжениях Комитета о проведении проверки и в актах по ее результатам, не соответствовали целям и(или) задачам и предмету планов проверки, а также цели и предмет проверки, предусмотренные планом проверки, не соответствовали друг другу (перечень разночтений приведен в приложении 20 к заключению).

3. В нарушение требования пункта 4 Порядка № 411 Регламентом¹⁴³ осуществления комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации¹⁴⁴ периодичность проведения проверок не установлена.

4. Из содержания планов ведомственного контроля Комитетом подведомственных государственных учреждений в сфере закупок на 2020-2023 годы следует, что в 2020 – 2022 годах из числа ГАБУ ЛО СПО проведена проверка одного учреждения (ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум»), на 2023 год проведены либо запланированы к проведению проверки 11 ГАБУ ЛО СПО.

5. В ходе анализа отчетности по соглашениям о предоставлении СИЦ РС, заключенным с указанными в настоящем заключении ГАБУ ЛО СПО, выявлено:

5.1. нарушение сроков представления отчетов по результатам использования субсидий. Так, из 54 проанализированных соглашений о предоставлении субсидий:

- по 25 соглашениям, заключенным в 2020 году (условием которых являлось представление отчета о реализации мероприятия не позднее 5 рабочих дней после реализации мероприятия):

- 2 отчета содержали информацию о дате окончания работ, из них 1 отчет представлен с нарушением срока (1 рабочий день), один отчет не содержал информацию о дате его представления, что повлекло невозможность установить соответствие даты представления отчета требованиям соглашения;

- 20 отчетов не содержали информации о дате их составления и о дате окончания ремонтных работ, что также повлекло невозможность установить соответствие даты представления отчетов требованиям соглашений;

¹⁴³ Согласно которому периодичность проведения проверок утверждается органом ведомственного контроля.

¹⁴⁴ Утвержден приказом Комитета от 01.10.2019 № 47 во исполнение пункта 2 постановления № 411.

– 3 отчета не представлены (представлена только информация о расходовании остатков субсидии в 2021 и 2022 годах);

- по 29 соглашениям, заключенным в 2021-2022 годах: (условием которых являлось представление отчета о расходах и отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом (годом), в котором получена субсидия):

- 10 отчетов представлены своевременно;

- 19 отчетов представлены с нарушением срока (субсидии по данным соглашениям предоставлялись в целях реализации мероприятий по обеспечению развития инфраструктуры системы профессионального образования, условие соглашений – представление отчета о расходах и отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором получена субсидия).

5.2. В нарушение пункта 3.1 Порядка № 59 не приложены пояснительные записки ко всем проанализированным отчетам о реализации соглашений о предоставлении СИЦ, заключенных в 2021-2022 годах. Требования к их содержанию (в частности, наличие информации о конкретных произведенных работах, дате окончания работ, заключенных контрактах и договорах) не урегулированы, что не позволяет надлежащим образом осуществлять контроль за использованием средств СИЦ.

5.3. Установленные Комитетом в соглашениях о предоставлении СИЦ сроки представления отчетов о расходах, источником финансового обеспечения которых является СИЦ, и о достижении значений результатов предоставления СИЦ (далее – отчетность), не позволяют Комитету своевременно и в полном объеме осуществлять контроль за использованием СИЦ.

Так, в отдельных соглашениях о предоставлении СИЦ срок представления отчетности установлен не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия. В то же время сроки выбора ГАБУ ЛО СПО поставщика работ (услуг) по проведению текущего ремонта, заключения государственного контракта (договора) и его исполнения превышают 3 месячный период, однако дальнейшее представление отчетов по результатам реализации мероприятий, в целях проведения которых предоставлена субсидия, соглашениями не предусмотрено.

Основные выводы:

В рамках проведенного Мероприятия по результатам изучения представленных документов и материалов, а также пояснений руководителей и должностных лиц объектов Мероприятия следует отметить следующие выявленные недостатки и нарушения.

1. Недостаточность правового регулирования в части:

- актуализации заявок ГАБУ ЛО СПО на предоставление СИЦ;
- процедуры отклонения заявок ГАБУ ЛО СПО, не соответствующих требованиям, а также поступивших несвоевременно;
- требований к содержанию качественных и количественных показателей предоставления СИЦ, отраженных в пояснительной записке к заявке (в частности, отсутствуют требования к представлению информации о дате предыдущего ремонта, фотофиксации объекта, иной информации, содержащей обоснование необходимости ремонта¹⁴⁵);
- конкретизации требований к содержанию протокола, которым оформляются решения Комиссии, в том числе отсутствуют требования о закреплении в протоколе информации о рассмотренных заявках учреждений на предоставление СИЦ (реквизиты заявок, конкретное наименование заявленных работ и их стоимость, прилагаемые к заявкам документы – обоснования, расчеты и пр.), что не позволяет оценить степень соответствия принятого на комиссии решения о выделении СИЦ на конкретные виды работ (услуг), перечисленные в заявке, и видов работ (услуг), закреплённых в соглашении о предоставлении СИЦ;
- использования в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий на иные цели¹⁴⁶;
- предоставления учреждениями информации о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на иные цели на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели (в части необходимости установления нормы потребности)¹⁴⁷;
- финансового обеспечения текущего ремонта и содержания зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ), вследствие чего указанные расходы за счет средств областного бюджета Ленинградской области осуществляются в отсутствие правового регулирования (источник финансирования указанных расходов правовыми актами Ленинградской области не установлен);
- сроков представления и состава отчетности использования СИЦ.

Так, отсутствие обязанности получателей СИЦ представлять в составе отчета о достижении результата предоставления субсидии и показателей документы, подтверждающие достижение показателей (заключенные государственные контракты (договоры), акты выполненных работ, иные документы, подтверждающие исполнение заказчиком своих обязательств), повышает риски предоставления получателями субсидий недостоверных

¹⁴⁵ Порядком № 59 не установлены.

¹⁴⁶ Отсутствует правовой акт Комитета, утверждающий порядок и сроки принятия Комитетом решения, предусмотренный пунктом 4.5 Порядка № 59.

¹⁴⁷ Отсутствует правовой акт Комитета, утверждающий порядок и сроки принятия Комитетом решения, предусмотренный пунктом 4.5 Порядка № 59.

сведений, а необязательность ежегодных отчетов о ходе достижения результатов, актуальных в случае, если такие результаты достигаются в сроки, выходящие за рамки финансового года, не позволяет Комитету осуществлять надлежащий контроль за соблюдением получателями СИЦ условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2. Изложенная выше недостаточность правового регулирования, повлекшая в том числе непрозрачность отдельных процедур, в достаточной мере обусловила недостатки и нарушения, выявленные в ходе выборочного анализа заявок на СИЦ РС, предоставленных объектами Мероприятия, и документов к ним, протоколов Комиссии и распоряжений Комитета о предоставлении СИЦ РС в исследуемом периоде, соглашений о предоставлении СИЦ РС.

При этом установленные в ходе ЭАМ нарушения Комитетом и ГАБУ ЛО СПО порядка представления и рассмотрения заявок на предоставление СИЦ носили системный характер в части:

- рассмотрения на заседаниях Комиссии вопроса о предоставлении субсидии без соответствующей заявки¹⁴⁸ либо заявок, представленных без Приложений;
- издания Комитетом распоряжений о предоставлении СИЦ РС в отсутствие протоколов Комиссии;
- несоответствия размеров СИЦ РС, указанных в отдельных распоряжениях Комитета о предоставлении СИЦ РС в 2020 году, размеру субсидий, указанному в протоколах Комиссии;
- несоответствия размеров предоставленных СИЦ РС, указанных в соглашениях, размерам СИЦ, указанным в соответствующих распоряжениях Комитета о предоставлении СИЦ РС (в 2020, 2022 году);
- заключения соглашения в отсутствие заявок на предоставление СИЦ либо на виды работ, не содержащиеся в заявках.

В ходе исследования заключенных объектами ЭАМ соглашений о предоставлении СИЦ РС установлены также факты:

- направления СИЦ на цели, не предусмотренные соглашениями о предоставлении СИЦ;
- заключения соглашений, в которых отсутствует конкретизация направления работ, не установлен перечень приобретаемого имущества и(или) ремонтных работ как непосредственно в тексте соглашений, так и в приложениях № 1 (перечень субсидий), № 2 (график перечисления субсидии) и № 2.1 (значение результатов предоставления субсидии) (в 2021-2022 гг.) к ним¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Протокол заседания Комиссии № 3 от 04.06.2020, на котором принято решение рекомендовать выделение ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж» субсидии на иные цели на 2020 год в размере 11 308,0 тыс. руб. Обоснование необходимости проведения ремонтных работ представлено 06.07.2020 исх. № 01-8/777 (с прилагаемым актом обследования от 26.06.2020), распоряжение Комитета № 1369-р о предоставлении учреждению субсидии в указанном размере издано 07.08.2020.

¹⁴⁹ Предусмотрено направление средств расходования субсидии: «расходы на организацию мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования».

3. В ходе оценки законности и эффективности использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в течение 2020-2022 годов на ремонт и содержание зданий и сооружений ГБПОУ ЛО «ВМТ»¹⁵⁰, установлены факты:

- в течение 2020-2022 годов ГБПОУ ЛО «ВМТ» с рядом поставщиков неоднократно заключались договоры на суммы, не превышающие 600 тыс. руб., на осуществление однородных работ по одним и тем же адресам в период, не превышающий 3 месяцев, без применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)¹⁵¹;

- нарушения формирования НМЦК (завышение НМЦК)¹⁵², допущенные должностными лицами ГБПОУ ЛО «ВМТ» при определении НМЦК, в которых в совокупности с ранее сделанным выводом о намеренном систематическом «дроблении» закупок при заключении договоров усматриваются риски коррупционных нарушений;

- предоставления недостоверной отчетности ГБПОУ ЛО «ВМТ» в части полноты расходования СИЦ и достижения показателей по соглашениям №№ 70, 223, 187, 325, 447, 395;

- наличия остатка СИЦ в сумме 1 419,4 тыс. руб. (Соглашение № 187), в сумме 1 922,4 тыс. руб. (Соглашение № 325), потребность в котором не подтверждена, подлежащего возврату (взысканию) в областной бюджет Ленинградской области;

- нарушения пункта 45 Федерального стандарта № 257н, пункта 12 Инструкции № 174н в части сохранения на балансовом учете Учреждения демонтированного объекта основных средств (демонтированный фонтан балансовой стоимостью 18,45 тыс. руб.), что подтверждается инвентарной карточкой учета нефинансовых активов № 11 и записями в оборотно-сальдовой ведомости по счету 101.00 за январь 2022 года;

- увеличения цены договора¹⁵³ на 20 % (до окончания срока действия договора) в нарушение требования подпункта 1² пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

- не достижения показателей предоставления СИЦ (по соглашениям №№ 325, 447, 395);

- нарушения части 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ и пунктов 23 и 25 Инструкции № 157н - не отражены в бухгалтерском учете 108 м труб и 20 шт. радиаторов, демонтированных при проведении текущего ремонта внутренних санитарно-технических трубопроводов по Договору № 71091, 126 м труб диаметром до 63 мм и 63 м труб диаметром до 32 мм, разобранных при проведении текущего ремонта системы центрального отопления по Договору № 66994¹⁵⁴;

¹⁵⁰ До 14.07.2021 - ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транспортного строительства», «Волховский алюминиевый колледж» и «Волховский политехнический техникум».

¹⁵¹ Так называемое «дробление» закупок.

¹⁵² Выявленные в ходе выборочной проверки формирования НМЦК в 2022 году.

¹⁵³ Договор от 21.02.2020 № 5, заключенный ГБПОУ ЛО «ВАК» с ИП Тишкиным А.Л.

¹⁵⁴ На дату составления отчета реализация лома не подтверждена, платежное поручение о поступлении на счет Учреждения денежных средств по данной хозяйственной операции не представлено.

- завышения стоимости работ на общую сумму 116,4 тыс. руб., установленные в ходе выборочной проверки соответствия фактически выполненных работ принятым и оплаченным подрядчикам по договорам №№ 66994 и 71091, на общую сумму 1 200,9 тыс. руб. - по государственному контракту от 22.06.2022 № ЭА-2646/22;

- систематического заключения контрактов (договоров) без применения конкурентных способов определения поставщика в течение всего исследуемого периода;

а также

(тыс.руб.)			
	Предоставление Комитетом ГБПОУ ЛО «ВМТ» СИЦ на текущий ремонт помещений, связанных с оказанием государственной услуги в рамках государственного задания ¹⁵⁵	Расходование СИЦ на цели, не предусмотренные соглашениями, нормативными актами	Нарушение пункта 23 Инструкции № 157н, пункта 8 Федерального стандарта №257н в части принятия к учету объектов нефинансовых активов, а также стоимости работ по их доставке и монтажу на сумму
Соглашение № 223	945,4	2329,0	
Соглашение № 325	1400,0	1 659,1	304,1
Соглашение № 70		142,8	25,1
Соглашение № 447		5794,38	5233,76
Соглашение № 235	691,19	2851,08	1066,26
Соглашение № 205		2283,2	390,0
Соглашение № 395		1 659,4	
Итого	3036,59	16718,96	7019,22

4. Выявленные недостатки и нарушения позволяют сделать вывод о том, что контроль за деятельностью подведомственных ГАБУ ЛО СПО надлежащим образом Комитетом не осуществлялся. Таким образом, создаются предпосылки для возникновения коррупционных рисков при использовании средств областного бюджета Ленинградской области.

Предложения:

Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области:

1. Принять меры к правовому урегулированию:

1.1. Процессы рассмотрения заявок ГАБУ ЛО СПО на предоставление СИЦ и приложений к ним, установив:

¹⁵⁵ не соответствует направлениям предоставления субсидии на иные цели, установленным пунктом 2 Порядка № 522. (в 2020 году)

- регламент актуализации заявок ГАБУ ЛО СПО на предоставление СИЦ;

- требования к содержанию качественных и количественных показателей предоставления СИЦ, обосновывающих необходимость ремонта, отраженных в пояснительной записке к заявке;

- порядок предварительной экспертизы (оценки) заявок ГАБУ ЛО СПО ответственным исполнителем Комитета и подготовки заключения ответственным исполнителем Комитета, содержащем результаты оценки своевременности поступления, соответствия требованиям, полноты, достоверности, конкретности, актуальности, своевременности заявки;

- процедуру отклонения заявок ГАБУ ЛО СПО, не соответствующих требованиям, а также поступивших несвоевременно;

- требования к содержанию протокола, которым оформляются решения Комиссии, в том числе в части отражения в протоколе информации, позволяющей оценить степень соответствия принятого на комиссии решения о выделении СИЦ на конкретные виды работ (услуг), перечисленные в заявке, и видов работ (услуг), закрепленных в соглашении о предоставлении СИЦ.

1.2. Порядков:

- использования в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных при предоставлении субсидий на иные цели;

- предоставления учреждениями информации о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на иные цели на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели (в части необходимости установления нормы потребности).

1.3. Состава и сроков представления отчетности, установив:

- сроки представления ежегодной отчетности о расходовании СИЦ и ходе достижения результатов использования СИЦ;

- в составе отчетности о достижении результата предоставления субсидии и показателей документы, подтверждающие достижение показателей (заключенные государственные контракты (договоры), акты выполненных работ, иные документы, подтверждающие исполнение заказчиком своих обязательств), позволяющие Комитету оценить достоверность предоставляемых ГАБУ ЛО СПО и выявить риски несвоевременного использования ГАБУ ЛО СПО полученных СИЦ.

2. Привести в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» положения приказа Комитета общего и профессионального

образования Ленинградской области от 30.12.2020 № 59 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных приказов комитета общего и профессионального образования Ленинградской области».

3. Обеспечить принятие правового акта, регулирующего отношения в сфере финансового обеспечения текущего ремонта и содержания связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) зданий и сооружений подведомственных Комитету государственных учреждений.

4. Не допускать заключения соглашений, в которых отсутствует конкретизация направления работ, не установлен перечень приобретаемого имущества и(или) ремонтных работ как непосредственно в тексте соглашений, так и в приложениях к ним.

5. Принять меры, направленные на соблюдение ГАБУ ЛО СПО требований Федерального закона № 402-ФЗ и подзаконных актов в части организации бухгалтерского учета, в том числе путем повышения квалификации сотрудников, обеспечивающих организацию бухгалтерского учета, организацию конкурсных процедур и расходование СИЦ.

6. Обеспечить надлежащий контроль за деятельностью подведомственных учреждений, за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, в том числе путем соблюдения установленных сроков и периодичности их проверок.

7. В соответствии с пунктами 2.3 и 2.6 Порядка № 391 провести внеплановую выездную проверку деятельности ГБПОУ ЛО «ВМТ» по фактам нарушений, изложенных в заключении, по результатам проверок принять соответствующие меры, в том числе по:

- возврату остатков субсидий на иные цели, предоставленных на основании Соглашения № 187 и Соглашения № 325, потребность в которых не была подтверждена в установленные сроки;

- принятию к учету вновь созданных объектов нефинансовых активов, а также стоимости работ по их доставке и монтажу, отраженных в акте выполненных работ (КС-2) и увеличивающих стоимость нефинансового актива;

- своевременному снятию с балансового учета демонтированных объектов основных средств и материальных ценностей.

8. В соответствии с пунктами 3 и 10 Порядка № 574 провести внеплановую выездную проверку соблюдения ГБПОУ ЛО «ВМТ» законодательства в сфере закупок по фактам нарушений, изложенных в заключении, в том числе:

- правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- совершения неконкурентным способом закупок однородных товаров, работ, услуг в течение короткого промежутка времени;
- соблюдения условий контрактов (договоров), в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта (договора).

9. Принять меры, направленные на привлечение к ответственности должностных лиц Комитета и ГАБУ ЛО СПО, допустивших недостатки и нарушения, изложенные в заключении.

10. Информацию о результатах проведения вышеуказанных проверок и принятых мерах (с приложением подтверждающих документов) представить в Контрольно-счетную палату Ленинградской области не позднее 30.04.2024 года.

Приложения:

- Приложения:
1. Перечень материалов, исследованных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия на 4 л. (с оборотом) в 1 экз.;
 2. Информация об утвержденных и исполненных Комитетом в 2020-2022 гг. объемах расходов областного бюджета Ленинградской области, предоставленных на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО разрезе государственных программ и направлений расходования на 1 л. в 1 экз.;
 3. Информация о СИЦ, предоставленных в 2020-2022 гг. Комитетом по соглашениям ГАБУ ЛО СПО на ремонт и содержание зданий и сооружений на 2 л. (с оборотом) в 1 экз.;
 4. Информация об объемах средств предоставленных и израсходованных субсидий государственным учреждениям среднего профессионального образования Ленинградской области в 2020-2022 гг. на 3 л. (с оборотом) в 1 экз.;
 5. Информация об объемах средств предоставленных и израсходованных субсидий на ремонт и содержание зданий среднего профессионального образования ГАБУ СПО ЛО в 2020-2022 гг. на 6 л. (с оборотом) в 1 экз.;
 6. Информация по результатам анализа приложений 1-3 к приказу Комитета от 30.12.2020 № 59 на соответствие общим требованиям к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели на 3 л. (с оборотом) в 1 экз.;

7. Перечень ГАБУ СПО ЛО, в отношении которых проведен анализ организации использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений на 1 л. в 1 экз.;

8. Перечень соглашений о предоставлении субсидий на иные цели на ремонт и содержание зданий и сооружений учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области в 2020-2022 гг. (в разрезе выборочного анализа 8 ГАБУ СПО ЛО) на 1 л. (с оборотом) в 1 экз.;

9. Перечень ГАБУ СПО ЛО, представивших заявки на предоставление субсидии с нарушением установленного срока на 1 л. в 1 экз.;

10. Перечень ГАБУ СПО ЛО, представивших заявки на предоставление субсидии в отсутствие прилагаемых к заявкам документов, на 4 л. (с оборотом) в 1 экз.;

11. Разночтения в размере субсидий на иные цели, указанном в протоколе комиссии по рассмотрению заявок или заявках подведомственных учреждений и распоряжениях Комитета, на 1 л. в 1 экз.;

12. Перечень соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, размер которых не совпадает с размером, утвержденным распоряжениями Комитета, на 1 л. в 1 экз.;

13. Разночтения в указании видов ремонтных работ, поименованных в заявках ГАБУ СПО ЛО, и соглашениях о предоставлении данным учреждениям субсидий на иные цели, на 3 л. (с оборотом) в 1 экз.;

14. Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020 году на ремонт и содержание в организациях профессионального образования, на 1 л. (с оборотом) в 1 экз.;

15. Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в

2021 году на ремонт и содержание в организациях профессионального образования, на 1 л. (с оборотом) в 1 экз.;

16. Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2022 году на ремонт и содержание в организациях профессионального образования, на 1 л. (с оборотом) в 1 экз.;

17. Реестр контрактов (договоров), заключенных в 2020 – 2022 годах ГБПОУ ЛО «ВМТ» и его правопреемниками в целях проведения ремонтных работ, в рамках СИЦ о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели на 2 л. (с оборотом) в 1 экз.;

18. Ведомость № 1 пересчета начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК) по локальной смете № 7 на 10 л. (с оборотом) в 1 экз.

19. Ведомость № 2 Расчет завышения стоимости работ и затрат по Акту КС-2 от 18.07.2022 №1 на 9 л. (с оборотом) в 1 экз.

20. Разночтения в описании целей и(или) задач и предмета проверки в документах, регулирующих проведение Комитетом проверок деятельности ГАБУ СПО ЛО, в 2020-2023 гг. на 7 л. (с оборотом) в 1 экз.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



Н.С. Грибова

Перечень материалов, исследованных в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- приказ Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
- приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
- приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;
- приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам,

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»;

– приказ Минпросвещения России от 22.09.2021 № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»;

– приказ Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235 Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением;

– постановление Правительства Ленинградской области от 10.12.2012 № 391 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений Ленинградской области»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 406 «О государственной программе Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 24.02.2014 № 32 «О порядке функционирования и использования автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 07.07.2014 № 290 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных автономных учреждений Ленинградской области, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ленинградской области»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2014 № 522 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 09.12.2014 № 574 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»;

– постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 543 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ленинградской области, Положения о финансовом обеспечении выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 06.03.2017 № 47 «Об утверждении Положения о комитете общего и профессионального образования Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 09.09.2019 № 411 «Об утверждении Порядка осуществления органами исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Ленинградской области, права собственника имущества государственных унитарных предприятий Ленинградской области, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»;

- постановление Правительства Ленинградской области от 30.10.2020 № 708 «Об определении уполномоченных органов исполнительной власти Ленинградской области по установлению порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»;

- распоряжение Губернатора Ленинградской области от 03.07.2019 № 435-р «Об утверждении Комплекса мер и Концепции по созданию центра опережающей профессиональной подготовки на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Беседский сельскохозяйственный техникум»;

- распоряжение Правительства Ленинградской области от 25.10.2019 № 733-р;

- приказ Комитета финансов Ленинградской области от 11.12.2009 № 01-09-196/09 «О порядке возврата и взыскания неиспользованных бюджетных средств»;

- приказ Комитета финансов Ленинградской области от 30.12.2020 № 18-02/05-37 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели»;

- приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – Комитет) от 28.01.2013 № 05 «О порядке рассмотрения заявок государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на предоставление субсидий на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта»;

- приказ Комитета от 21.05.2015 № 21 «О порядке рассмотрения заявок государственных бюджетных и автономных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на предоставление субсидий на иные цели»;

- приказ Комитета от 15.03.2016 № 35 «Об утверждении порядка расчета постоянных затрат на содержание имущества государственных организаций Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, и порядка расчета затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается их имущество»;

- приказ Комитета от 12.05.2020 № 19 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных организаций

Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области»;

- приказ Комитета от 30.12.2020 № 59 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных приказов комитета общего и профессионального образования Ленинградской области»;

- приказ Комитета от 14.12.2021 № 51 «Об утверждении порядка расчета постоянных затрат на содержание имущества государственных организаций Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, и порядка расчета затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается их имущество»;

- приказ Комитета от 30.05.2022 № 26 «Об утверждении Регламента проведения комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»;

- распоряжение Комитета от 21.12.2014 № 2838-р «Об утверждении Регламента проведения комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»;

- распоряжение Комитета от 01.03.2016 № 630-р «Об утверждении порядка расчета и утверждения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), и корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам»;

- распоряжение Комитета от 19.01.2018 № 87-р «Об утверждении состава комиссии, положения о комиссии и порядка рассмотрения заявок государственных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на предоставление средств областного бюджета на реализацию мероприятий по проведению ремонтных работ в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области»;

- распоряжение Комитета от 01.10.2019 № 47 «Об утверждении Регламента осуществления комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации»;

- распоряжение Комитета от 15.11.2019 № 2386-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 2020 год»;

- распоряжение Комитета от 30.12.2019 № 2812-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на 2020 год»;

- распоряжение Комитета от 20.01.2020 № 60-р «Об утверждении перечня субсидий на иные цели по комитету общего и профессионального образования Ленинградской области»;

– распоряжение Комитета от 21.01.2020 № 83-р «О подтверждении остатка субсидий на иные цели 2019 года государственным бюджетным и автономным образовательным организациям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области для дальнейшего использования в 2020 году»;

- распоряжение Комитета от 04.02.2020 № 206-р¹;
- распоряжение Комитета от 04.02.2020 № 224-р¹;
- распоряжение Комитета от 04.02.2020 № 229-р¹;
- распоряжение Комитета от 04.02.2020 № 222-р¹;
- распоряжение Комитета от 04.02.2020 № 223-р¹;
- распоряжение Комитета от 04.02.2020 № 232-р¹;

– распоряжение Комитета от 26.02.2020 № 398-р «О проведении плановой ведомственной проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»;

- распоряжение Комитета от 05.03.2020 № 477-р¹;
- распоряжение Комитета от 31.03.2020 № 666-р¹;
- распоряжение Комитета от 31.03.2020 № 668-р¹;
- распоряжение Комитета от 08.04.2020 № 705-р¹;

– распоряжение Комитета от 08.04.2020 № 706-р «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов» в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» и «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 2019 году»;

- распоряжение Комитета от 08.04.2020 № 709-р²;
- распоряжение Комитета от 08.04.2020 № 711-р²;
- распоряжение Комитета от 08.04.2020 № 714-р²;
- распоряжение Комитета от 08.04.2020 № 717-р²;
- распоряжение Комитета от 04.06.2020 № 972-р¹;
- распоряжение Комитета от 07.08.2020 № 1369-р¹;

– распоряжение Комитета от 30.09.2020 № 1624-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 2021 год»;

– распоряжение Комитета от 09.10.2020 № 1714-р «Об утверждении Регламента проведения комитетом общего и профессионального образования Ленинградской

¹ «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 2020 году».

² «О выделении субсидии на реализацию мероприятия 3.1.2. «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования» в рамках основного мероприятия 3.1. «Мероприятия по приспособлению объектов для доступа инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области»;

- распоряжение Комитета от 29.10.2020 № 1821-р «О проведении плановой ведомственной проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный техникум»;

- распоряжение Комитета от 30.10.2020 № 1835-р¹;

- распоряжение Комитета от 06.11.2020 № 1868-р «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов» в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования» и «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» Государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 2020 году»;

- распоряжение Комитета от 11.11.2020 № 1884-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации на 2021 год»;

- распоряжение Комитета от 26.11.2020 № 1967-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на 2021 год»;

- распоряжение Комитета от 30.12.2020 № 2286-р «О предоставлении субсидий на проведение ремонтных работ государственным бюджетным и автономным образовательным организациям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в 2021 году»;

- распоряжение Комитета от 03.12.2020 № 2031-р¹;

- распоряжение Комитета от 01.02.2021 № 226-р «О подтверждении остатка субсидий на иные цели 2020 года государственным бюджетным и автономным образовательным организациям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, для дальнейшего использования в 2021 году»;

- распоряжение Комитета от 04.03.2021 № 501-р;

- распоряжение Комитета от 29.03.2021 № 790-р²;

- распоряжение Комитета от 29.03.2021 № 792-р²;

- распоряжение Комитета от 29.03.2021 № 793-р²;

- распоряжение Комитета от 29.03.2021 № 795-р²;

- распоряжение Комитета от 29.03.2021 № 796-р²;

- распоряжение Комитета от 30.03.2021 № 822-р²;

- распоряжение Комитета от 29.04.2021 № 1198-р «О проведении плановой ведомственной проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Бегуницкий агротехнический техникум»;

- распоряжение Комитета от 14.05.2021 № 1296-р «О проведении плановой ведомственной проверки Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Сланцевский индустриальный техникум»;

- распоряжение Комитета от 31.05.2021 № 1536-р «О проведении плановой ведомственной проверки Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Ленинградской области «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского»;

- распоряжение Комитета от 06.07.2021 № 1902-р;
- распоряжение Комитета 26.11.2020 № 1967-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на 2021 год»;
- распоряжение Комитета от 29.11.2021 № 3101-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на 2022 год»;
- распоряжение Комитета от 30.11.2021 № 3118-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации на 2022 год»;
- распоряжение Комитета от 14.12.2021 № 3180-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 2022 год»;
- распоряжение Комитета от 31.01.2022 № 165-р «О подтверждении остатка субсидий на иные цели 2021 года государственным бюджетным и автономным образовательным организациям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области для дальнейшего использования в 2022 году»;
- распоряжение Комитета от 01.02.2022 № 184-р «О предоставлении субсидий на проведение ремонтных работ государственным бюджетным и автономным образовательным организациям, подведомственным комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, в 2022 году»;
- распоряжение Комитета от 14.04.2022 № 706-р «О выделении субсидии на реализацию мероприятия «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования» в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов» подпрограммы 2. «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области» Государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»;
- распоряжение Комитета от 30.05.2022 № 1148-р;
- распоряжение Комитета от 12.09.2022 № 1738-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных автономных организаций Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области и созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ленинградской области, на 2023 год»;
- распоряжение Комитета от 05.12.2022 № 2386-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных организаций Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на 2023 год»;
- распоряжение Комитета от 29.11.2022 № 2346-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных учреждений Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального

образования Ленинградской области, в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области на 2023 год»;

– распоряжение Комитета от 29.11.2022 № 2348-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации на 2023 год»;

– распоряжение Комитета от 01.06.2023 № 1427-р «О проведении ведомственного контроля в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный техникум»;

– распоряжение Комитета от 14.06.2023 № 1535-р «О проведении ведомственного контроля в отношении государственного автономного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Лужский агропромышленный техникум».

Информация об утвержденных и исполненных Комитетом в 2020-2022 гг. объемах расходов областного бюджета Ленинградской области на ремонт и содержание зданий и сооружений ГАБУ ЛО СПО в разрезе государственных программ и направлений расходования

№ п/п	Наименование государственной программы/подпрограммы/основного мероприятия	2020 год		2021 год		2022 год ¹¹	
		утверждено БА	исполнено	утверждено БА	исполнено	утверждено БА	исполнено
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, в т.ч.:	436 475,0	436 475,0	307 895,1	307 895,1	337 001,4	334 790,3
1	Государственная программа Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"						
1.1	Подпрограмма «Развитие профессионального образования» / основное мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования»¹	418 475,0	418 475,0	291 175,1	291 175,1	318 281,4	316 070,3
1.1.1	Ремонтные работы в государственных бюджетных организациях профессионального образования (далее - ГБУ) ²	179 272,9	179 272,9	142 717,5	142 717,5	163 388,3	161 178,2
1.1.2	Ремонтные работы в государственных автономных организациях профессионального образования (далее - ГАУ) ³	226 570,2	226 570,2	129 661,2	129 661,2	117 319,7	117 319,7
1.1.3	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности в ГБУ ⁴	1 707,8	1 707,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности в ГАУ ⁵	0,0	0,0	1 338,9	1 338,9	2 573,4	2 573,4
1.1.5	Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов в ГБУ ⁶	0,0	0,0	17 457,5	17 457,5	35 000,0	34 999,0
1.1.6	Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов в ГАУ ⁷	10 924,1	10 924,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Государственная программа Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области"						
2.1	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» / основное мероприятие «Мероприятия по приспособлению объектов для доступа инвалидов и маломобильных групп населения»⁸	18 000,0	18 000,0	16 720,0	16 720,0	18 720,0	18 720,0
2.1.1	Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования ГБУ ⁹	9 000,0	9 000,0	10 480,0	10 480,0	9 980,0	9 980,0
2.1.2	Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования ГАУ ¹⁰	9 000,0	9 000,0	6 240,0	6 240,0	8 740,0	8 740,0

2020-2021 г.г.

¹ Раздел/Подраздел/ЦСР - 0700/0704/5260313770² КВР/Доп.КР - 612/52060303³ КВР/Доп.КР - 622/52060303⁴ КВР/Доп.КР - 612/52060307⁵ КВР/Доп.КР - 622/52060307⁶ КВР/Доп.КР - 612/52060312⁷ КВР/Доп.КР - 622/52060312¹¹ **Примечание:**

Комитетом в 2022 году средства областного бюджета на ремонт и содержание зданий и сооружений государственных учреждений среднего профессионального образования предоставлялись подведомственным государственным учреждениям на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели в рамках реализации:

- комплекса мероприятий, направленного на повышение уровня материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, в том числе осуществление ремонтных работ в организациях профессионального образования и капитального ремонта спортивных сооружений и стадионов; оснащение оборудованием, комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы II «Обеспечение условий развития современного образования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»;

- мероприятий по приспособлению объектов социальной сферы для доступа инвалидов комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов» подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

2022 г.

ЦСР 0240413770

Доп.КР 0224310003

Доп.КР 0224310003

Доп.КР 0224310008

Доп.КР 0224310008

Доп.КР 0224310006

Доп.КР 0224310006

2020-2021 г.г.

⁸ Раздел/Подраздел/ЦСР - 0700/0704/5330113760⁹ КВР/Доп.КР - 612/53030102¹⁰ КВР/Доп.КР - 622/53030102

2022 г.

ЦСР 0340815560

Доп.КР 0324110102

Доп.КР 0324110102

Информация о СИЦ, предоставленных в 2020-2022 гг. Комитетом по соглашениям ГАБУ ЛО СПО на ремонт и содержание зданий и сооружений

Получатель	2020 год			2021 год			2022 год					
	№ п/п	Основание	Сумма	№ п/п	Основание	Сумма	№ п/п	Основание	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Государственные автономные учреждения												
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Кировский политехнический техникум"	1	Соглашение № 375 от 25.08.2020	14 373,9	1	Соглашение № 288 от 24.03.2021	3 000,0	1	Соглашение № 448 от 11.05.2022	3 000,0			
							2	Соглашение № 401 от 15.04.2022 (Доступная среда)	2 080,0			
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Всеволожский агропромышленный техникум"	2	Соглашение № 198 от 07.04.2020	23 500,0	2	Соглашение № 266 от 24.03.2021	29 000,0	3	Доп. Соглашение № 457/1 от 23.11.2022 к Соглашению № 457 от 13.05.2022	3 999,5			
	3	Соглашение №510 от 17.12.2020	298,6				4	Соглашение № 400 от 15.04.2022 (Доступная среда)	2 109,0			
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	4	Доп.Соглашение № 1 от 23.06.2020 к Соглашению № 221 от 09.04.2020	26 696,6	3	Соглашение № 365 от 13.04.2021	5 010,9	5	Доп. Соглашение № 261/3 от 14.06.2022 к Соглашению № 261 от 15.02.2022	37 571,9			
	5	Соглашение № 206 от 09.04.2020 (Доступная среда)	2 000,0	4	Соглашение № 535 от 30.07.2021 (Содержание (эксплуатация) имущества)	1 338,9	6	Доп. Соглашение № 465 от 20.05.2022 (Содержание (эксплуатация) имущества)	2 573,4			
			5	Соглашение № 544 от 25.08.2021	352,6							
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса"	6	Соглашение № 224 от 09.04.2020	12 301,0	6	Соглашение № 264 от 22.03.2021	11 695,9	7	Доп. Соглашение № 228/1 от 13.05.2022 к Соглашению № 228 от 15.02.2022	27 000,0			
	7	Соглашение № 211 от 09.04.2020 (Доступная среда)	1 000,0	7	Соглашение № 318 от 31.03.2021 (Доступная среда)	1 000,0						
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Лужский агропромышленный техникум"	8	Соглашение № 316 от 05.06.2020	1 500,0	8	Соглашение № 260 от 19.03.2021	4 561,1	8	Соглашение № 449 от 11.05.2022	7 000,0			
	9	Соглашение № 214 от 09.04.2020 (Доступная среда)	1 000,0				9	Соглашение № 407 от 15.04.2022 (Доступная среда)	2 471,0			
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Борский агропромышленный техникум"	10	Соглашение № 314 от 02.06.2020	15 948,0	9	Соглашение № 362 от 12.04.2021	4 582,7	10	Соглашение № 447 от 11.05.2022	1 500,0			
				10	Соглашение № 327 от 31.03.2021 (Доступная среда)	1 000,0						
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Киришский политехнический техникум"	11	Соглашение № 55 от 22.01.2020	26 000,0	11	Соглашение № 261 от 19.03.2021	9 000,0	11	Соглашение № 458 от 13.05.2022	5 000,0			
	12	Соглашение № 164 от 24.03.2020	19 000,0									
	13	Соглашение №365 от 24.07.2020	4 500,0									
	14	Соглашение № 209 от 09.04.2020 (Доступная среда)	2 000,0									
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Приозерский политехнический колледж"	15	Соглашение № 185 от 27.03.2020	4 120,0	12	Доп. Соглашение № 1 от 15.10.2021 к Соглашению № 263 от 22.03.2021	4 480,0	12	Соглашение № 502 от 07.06.2022	2 938,4			
							13	Соглашение № 403 от 15.04.2022 (Доступная среда)	2 080,0			
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Сосновоборский политехнический колледж"	16	Соглашение № 222 от 09.04.2020	22 355,1	13	Соглашение № 210 от 10.03.2021	1 000,0	14	Доп. Соглашение № 229/1 от 23.11.2022 к Соглашению № 229 от 15.02.2022	28 310,0			
	17	Соглашение № 477 от 03.12.2020	18 015,2	14	Соглашение № 314 от 31.03.2021 (Доступная среда)	2 000,0						
	18	Соглашение № 480 от 14.12.2020	17 055,2									
	19	Соглашение № 207 от 09.04.2020 (Доступная среда)	1 000,0									

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	20	Соглашение № 313 от 02.06.2020	20 906,5	15	Соглашение № 292 от 24.03.2021	56 977,9	15	Соглашение № 456 от 13.05.2022	1 000,0
	21	Доп. Соглашение №1 от 09.11.2020 к Соглашению № 364 от 24.07.2020 (Капитальный ремонт)	10 924,1						
	22	Соглашение № 208 от 08.04.2020 (Доступная среда)	2 000,0	16	Соглашение № 313 от 31.03.2021 (Доступная среда)	2 240,0			
ИТОГО по ГАУ за 2020 год:			246 494,3		ИТОГО по ГАУ за 2021 год:	137 240,1		ИТОГО по ГАУ за 2022 год:	128 633,1
в том числе:									
на ремонтные работы	15	Доп. КР 52 06 0303	226 570,2	11	Доп. КР 52 06 0303	129 661,2	10	Доп. КР 02 2 43 1 0003	117 319,7
на капитальный ремонт спортивных сооружений	1	Доп. КР 52 06 0312	10 924,1	0	Доп. КР 52 06 0312	0,0	0	Доп. КР 02 2 43 1 0006	0,0
на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	0	Доп. КР 52 06 0307	0,0	1	Доп. КР 52 06 0307	1 338,9	1	Доп. КР 02 2 43 1 0008	2 573,4
на приспособление для доступа инвалидов учреждений профессионального образования	6	Доп. КР 53 03 0102	9 000,0	4	Доп. КР 53 03 0102	6 240,0	4	Доп. КР 03 2 41 1 0102	8 740,0
Государственные бюджетные учреждения									
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Бегуницкий агротехнологический техникум"	1	Соглашение № 317 от 09.06.2020	1 672,6	1	Соглашение № 265 от 22.03.2021	7 793,2	1	Доп. Соглашение № 231/03 от 25.11.2022 к Соглашению № 231 от 15.02.2022	40 870,3
	2	Соглашение № 367 от 03.08.2020 (Содержание (эксплуатация) имущества)	1 707,8						
	3	Соглашение № 212 от 09.04.2020 (Доступная среда)	2 000,0						
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Беседский сельскохозяйственный техникум"	4	Соглашение № 182 от 27.03.2020	17 097,2	2	Соглашение № 347 от 08.04.2021	30 000,0	2	Доп. Соглашение № 230/2 от 05.08.2022 к Соглашению № 230 от 15.02.2022	11 900,7
				3	Соглашение № 316 от 31.03.2021 (Доступная среда)	2 480,0			
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Волховский алюминиевый колледж" (с 2022 г. - Волховский многопрофильный техникум)	5	Соглашение № 70 от 17.02.2020	2 400,0						
	6	Соглашение № 325 от 11.06.2020	6 785,7						
	7	Соглашение № 205 от 09.04.2020 (Доступная среда)	4 000,0						
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Волховский колледж транспортного строительства"	8	Соглашение № 187 от 31.03.2020	7 600,0	4	Соглашение № 447 от 24.05.2021	17 665,7	3	Доп. Соглашение № 235/2 от 15.11.2022 к Соглашению № 235 от 15.02.2022	15 650,0
	9	Соглашение № 479 от 14.12.2020	546,0	5	Доп. Соглашение № 1 к Соглашению № 395 от 17.05.2021 (Доступная среда)	3 000,0			
	10	Соглашение № 509 от 17.12.2020	387,7						
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Волховский политехнический техникум"	11	Соглашение № 223 от 09.04.2020	7 389,3						
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского"	12	Соглашение № 186 от 31.03.2020	6 270,4	6	Соглашение № 284 от 24.03.2021	9 455,6	4	Соглашение № 235 от 15.02.2022	4 000,0
				7	Соглашение № 637 от 07.12.2021 (Капитальный ремонт)	17 457,5			
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Кингисеппский колледж технологии и сервиса"	13	Соглашение № 320 от 09.06.2020	37 000,0	8	Соглашение № 341 от 07.04.2021	1 000,0	5	Доп. Соглашение № 236/4 от 05.12.2022 к Соглашению № 236 от 15.02.2022	16 053,6
	14	Соглашение № 451 от 30.10.2020	7 499,9				6	Соглашение № 402 от 15.04.2022 (Доступная среда)	2 500,0
	15	Соглашение № 226 от 09.04.2020	2 483,3	9	Соглашение № 297 от 26.03.2021	3 429,0			
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Лисинский лесной колледж"	16	Соглашение № 374 от 19.08.2020	11 308,0	10	Соглашение № 326 от 31.03.2021 (Доступная среда)	2 000,0	7	Доп. Соглашение № 260/3 от 29.06.2022 к Соглашению № 260 от 15.02.2022	19 978,0
	17	Соглашение № 478 от 07.12.2020	10 525,6						

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Лодейнополюский техникум промышленных технологий"	18	Соглашение № 318 от 09.06.2020	4 589,3	11	Соглашение № 349 от 08.04.2021	2 193,0	8	Соглашение № 506 от 07.06.2022	3 500,0	
							9	Соглашение № 406 от 15.04.2022 (Доступная среда)	2 500,0	
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Политехнический колледж" города Светогорска	19	Соглашение № 183 от 27.03.2020	3 750,0	12	Соглашение № 348 от 08.04.2021	9 000,0	10	Соглашение № 454 от 12.05.2022	2 500,0	
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Техникум водного транспорта"	20	Соглашение № 225 от 09.04.2020	1 500,0	13	Соглашение № 286 от 24.03.2021	10 720,0	11	Доп. Соглашение № 343/1 от 23.11.2022 к Соглашению № 343 от 06.04.2022 (Капитальный ремонт)	11 499,0	
							12	Доп. Соглашение № 255/3 от 07.06.2022 к Соглашению № 255 от 15.02.2022	6 185,8	
							13	Соглашение № 405 от 15.04.2022 (Доступная среда)	4 980,0	
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Тосненский политехнический техникум"	21	Доп.Соглашение №1 от 30.06.2020 к Соглашению № 165 от 24.03.2020	3 640,1	14	Соглашение № 302 от 26.03.2021	30 000,0	14	Доп. Соглашение № 226/5 от 30.08.2022 к Соглашению № 226 от 15.02.2022	31 785,4	
	22	Соглашение № 210 от 09.04.2020 (Доступная среда)	1 000,0				15	Соглашение № 342 от 06.04.2022 (Капитальный ремонт)	23 500,0	
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Мичуринский многопрофильный техникум"	23	Соглашение №229 от 14.04.2020	31 000,0	15	Соглашение № 290 от 24.03.2021	15 000,0	16	Соглашение № 493 от 01.06.2022	4 700,0	
				16	Соглашение № 326 от 31.03.2021 (Доступная среда)	1 000,0				
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Подпорожский политехнический техникум"	24	Соглашение № 315 от 05.06.2020	10 974,2	17	Соглашение № 360 от 12.04.2021	2 461,0	17	Соглашение № 494 от 01.06.2022	3 054,3	
				18	Соглашение № 309 от 31.03.2021 (Доступная среда)	2 000,0				
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Сланцевский индустриальный техникум"	25	Соглашение № 166 от 24.03.2020	4 853,5	19	Соглашение № 252 от 19.03.2021	4 000,0	18	Соглашение № 460 от 16.05.2022	1 000,0	
	26	Соглашение № 213 от 09.04.2020 (Доступная среда)	2 000,0							
ИТОГО по ГБУ за 2020 год:			189 980,7	ИТОГО по ГБУ за 2021 год:			170 655,0	ИТОГО по ГБУ за 2022 год:		206 157,2
в том числе:										
на ремонтные работы	21	Доп.КР 52 06 0303	179 272,9	13	Доп.КР 52 06 0303	142 717,5	13	Доп.КР 02 2 43 1 0003	161 178,2	
на капитальный ремонт спортивных сооружений	0	Доп.КР 52 06 0312	0,0	1	Доп.КР 52 06 0312	17 457,5	2	Доп.КР 02 2 43 1 0006	34 999,0	
на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	1	Доп.КР 52 06 0307	1 707,8	0	Доп.КР 52 06 0307	0,0	0	Доп.КР 02 2 43 1 0008	0,0	
на приспособление для доступа инвалидов учреждений профессионального образования	4	Доп.КР 53 03 0102	9 000,0	5	Доп.КР 53 03 0102	10 480,0	3	Доп.КР 03 2 41 1 0102	9 980,0	
ВСЕГО по ГАУ и ГБУ за 2020 год:			436 475,0	ВСЕГО по ГАУ и ГБУ за 2021 год:			307 895,1	ВСЕГО по ГАУ и ГБУ за 2022 год:		334 790,3
в том числе:										
на ремонтные работы	36	Доп.КР 52 06 0303	405 843,1	24	Доп.КР 52 06 0303	272 378,7	23	Доп.КР 02 2 43 1 0003	278 497,9	
на капитальный ремонт спортивных сооружений	1	Доп.КР 52 06 0312	10 924,1	1	Доп.КР 52 06 0312	17 457,5	2	Доп.КР 02 2 43 1 0006	34 999,0	
на содержание (эксплуатацию) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	1	Доп.КР 52 06 0307	1 707,8	1	Доп.КР 52 06 0307	1 338,9	1	Доп.КР 02 2 43 1 0008	2 573,4	
на приспособление для доступа инвалидов учреждений профессионального образования	10	Доп.КР 53 03 0102	18 000,0	9	Доп.КР 53 03 0102	16 720,0	7	Доп.КР 03 2 41 1 0102	18 720,0	

Информация об объемах средств предоставленных и израсходованных субсидий государственным учреждениям среднего профессионального образования
Ленинградской области в 2020-2022 гг.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование государственных учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области	2020 год																		
		Предоставлено субсидий								Израсходовано средств субсидии							Доля			
		Всего	субсидия на		в том числе			Всего	Всего	субсидия на		в том числе			СИЦ в общем объеме субсидий - предоставлено	СИЦ на ремонт в общем объеме субсидий - предоставлено	СИЦ на ремонт в общем объеме СИЦ - предоставлено	СИЦ на ремонт - фактически направлено	СИЦ на ремонт - фактически исполнено	
			Всего	из них на ремонт зданий и сооружений	Всего	субсидия на иные цели				Всего	из них на ремонт зданий и сооружений	Всего	субсидия на иные цели							
						на ремонт зданий и сооружений	на содержание имущества						на доступную среду ¹	на ремонт зданий и сооружений						на содержание имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	6/3*100	7+8+9/3*100	7+8+9/6*100	14+15+16/3*100	14+15+16/(7+8+9)*100
Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																				
1	ГАПОУ ЛО " Лужский агропромышленный техникум"	65 618.7	50 937.9	x	14 680.8	1 500.0		1 000.0	64 455.8	50 367.3	x	14 088.5	1 500.0		1 000.0	22,4	3,8	17	17,7	100,0
2	ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	137 017.7	54 420.5	x	82 597.2	57 425.5		1 000.0	101 418.8	54 420.5	x	46 998.3	18 327.6		1 000.0	60,3	42,6	70,7	41,1	33,1
3	ГА ПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»	91 971.5	66 425.4	x	25 546.1	12 301.0		1 000.0	91 141.8	66 425.4	2 932.2	24 716.4	12 301.0		1 000.0	27,8	14,5	52,1	53,8	100,0
4	ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум"	155 219.9	71 949.8	x	83 270.1	49 500.0		2 000.0	151 383.9	68 844.4	x	82 539.5	49 500.0		2 000.0	53,6	33,2	61,8	62,4	100,0
5	ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум"	120 322.8	81 429.0	x	38 893.8	14 373.9			118 915.8	81 429.0	x	37 486.8	0.0			32,3	11,9	37	0	0.0
6	ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"	67 793.0	49 094.9	x	18 698.1	4 120.0			67 793.0	49 094.9	2 407.0	18 698.1	4 120.0			27,6	6,1	22	22	100,0
7	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	155 187.5	79 494.7	x	75 692.8	31 830.7		2 000.0	152 889.0	79 494.7	x	73 394.3	31 830.7		1 142.4	48,8	21,8	44,7	44,9	97,5
8	ГАПОУ ЛО "Борский агропромышленный техникум"	119 134.0	84 757.2	x	34 376.8	15 948.0			118 477.8	84 757.2	x	33 720.6	15 948.0			28,9	13,4	46,4	47,3	100,0
9	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	186 143.2	106 342.6	x	79 800.6	23 798.6			184 482.7	106 342.6	1 001.2	78 140.1	22 807.7			42,9	12,8	29,8	29,2	95,8
10	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	136 346.6	86 328.2	x	50 018.4	26 696.6		2 000.0	131 136.4	86 328.2	x	44 808.2	23 000.7		2 000.0	36,7	21	57,4	55,8	87,1
Итого по государственным автономным		1 234 754.8	731 180.2	0,0	503 574.6	237 494.3	0,0	9 000.0	1 182 095.0	727 504.2	6 340.4	454 590.8	179 335.7	0,0	8 142.4	40,8	20,0	48,9	41,2	76,1
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																				
1	ГБПОУ ЛО "Лодейнополюский техникум промышленных технологий"	53 200.2	35 856.7	x	17 343.5	4 589.3			52 421.0	35 273.3	x	17 147.7	4 589.3			32,6	8,6	26,5	26,8	100,0
2	ГБПОУ ЛО "Бегуницкий агротехнологический техникум"	73 112.8	52 975.7	x	20 137.1	1 672.6	1 707.8	2 000.0	72 300.3	52 485.6	154.5	19 814.6	1 672.6	1 707.8	2 000.0	27,5	7,4	26,7	27,2	100,0
3	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"	76 905.6	48 353.9	x	28 551.7	17 097.2			59 645.1	48 353.9	727.0	11 291.2	0.0			37,1	22,2	59,9	0	0.0
4	ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"	85 768.5	71 777.9	x	13 990.6	1 500.0			85 768.5	71 777.9	6 852.8	13 990.6	1 500.0			16,3	1,7	10,7	10,7	100,0
5	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	155 027.6	79 690.4	x	75 337.2	31 000.0			121 999.2	78 699.1	2 618.5	43 300.1	0.0			48,6	20	41,1	0	0.0
6	ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорск	56 289.0	42 270.1	x	14 018.9	3 750.0			56 289.0	42 270.1	1 637.0	14 018.9	3 750.0			24,9	6,7	26,7	26,7	100,0

7	ГБПОУ ЛО "Волховский алюминиевый колледж"	122 740,2	77 437,0	x	45 303,2	9 185,7		4 000,0	119 996,7	77 437,0	x	42 559,7	9 185,7		4 000,0	36,9	10,7	29,1	31	100,0
8	ГБПОУ ЛО "Волховский колледж транспортного строительства"	77 847,4	53 706,7	x	24 140,7	8 533,7			77 847,4	53 706,7	x	24 140,7	8 533,7			31	11	35,3	35,3	100,0
9	ГБПОУ ЛО "Волховский политехнический техникум"	62 739,7	48 106,6	x	14 633,1	7 389,3			62 739,7	48 106,6	x	14 633,1	7 389,3			31,9	11,8	50,5	50,5	100,0
10	ГБПОУ ЛО "Сланцевский индустриальный техникум"	66 219,7	46 659,6	x	19 560,1	4 853,5		2 000,0	64 784,7	46 659,6	x	18 125,1	4 841,5		695,8	29,5	10,3	35	30,6	80,8
11	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	65 323,4	48 427,3	x	16 896,1	3 640,1		1 000,0	62 689,6	48 427,3	x	14 262,3	1 122,0		1 000,0	25,9	7,1	27,5	14,9	45,7
12	ГБПОУ ЛО "Кингисеппский колледж технологии и сервиса"	234 013,6	96 527,3	x	137 486,3	44 499,9			135 166,6	96 527,3	x	38 639,3	20 396,2			58,8	19	32,4	52,8	45,8
13	ГБПОУ ЛО "Подпорожский политехнический техникум"	67 546,3	43 086,8	x	24 459,5	10 974,2			65 207,5	43 086,8	103,6	22 120,7	9 397,0			36,2	16,2	44,9	42,5	85,6
14	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	103 117,8	70 618,9	x	32 498,9	24 316,9			84 634,6	70 618,9	x	14 015,7	6 607,1			31,5	23,6	74,8	47,1	27,2
15	ГБПОУ ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского"	136 276,0	108 037,0	x	28 239,0	6 270,4			135 918,4	108 037,0	617,8	27 881,4	6 270,4			20,7	4,6	22,2	22,5	100,0
Итого по государственным бюджетным		1 436 127,7	923 531,9	0,0	512 595,8	179 272,9	1 707,8	9 000,0	1 257 408,1	921 467,1	12 711,2	335 941,0	85 255,0	1 707,8	7 695,8	35,7	13,2	37,1	28,2	49,8
ВСЕГО за 2020 год:		2 670 882,5	1 654 712,1	0,0	1 016 170,4	416 767,2	1 707,8	18 000,0	2 439 503,1	1 648 971,4	19 051,6	790 531,7	264 590,7	1 707,8	15 838,2	38,0	16,3	41,2	35,7	64,6

¹ В том числе на ремонт зданий и сооружений

Информация об объемах средств предоставленных и израсходованных субсидий государственным учреждениям среднего профессионального образования

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование государственных учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области	2021 год																		
		Предоставлено субсидий							Израсходовано средств субсидии							Доля				
		Всего	в том числе						Всего	в том числе						СИЦ в общем объеме субсиди й - предост авлено	СИЦ на ремонт в общем объеме субсидий - предоста влено	СИЦ на ремонт в общем объеме СИЦ - предост авлено	СИЦ на ремонт - фактичес ки направле но	СИЦ на ремонт - фактичес ки исполне но
			субсидия на	субсидия на иные цели						субсидия на	субсидия на иные цели									
				из них на ремонт зданий и сооружен ий	Всего	из них:					Всего	из них на ремонт зданий и сооружен ий	Всего	из них:						
Всего	на ремонт зданий и сооружений	на содержан ие имуще ства	на доступную среду ¹	на ремонт зданий и сооружений		на содержан ие имуще ства	на доступную среду													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	6/3*100	7-8+9/3*100	7+8+9/6*100	14+15+16/3*100	14+15+16/(7+8+9)*100
Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																				
1	ГАПОУ ЛО " Лужский агропромышленный техникум"	69 703,3	52 548,2	x	17 155,1	4 561,1			69 128,9	52 407,7	x	16 721,2	4 561,1			24,6	6,5	26,6	27,3	100,0
2	ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	90 988,8	55 087,2	x	35 901,6	1 000,0		2 000,0	89 988,8	55 087,2	x	34 901,6	0,0		2 000,0	39,5	3,3	8,4	5,7	66,7
3	ГА ПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»	104 979,6	65 787,8	x	39 191,8	11 695,9		1 000,0	103 241,5	65 787,8	397,2	37 453,7	11 695,9		1 000,0	37,3	12,1	32,4	33,9	100,0
4	ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум"	107 625,9	87 146,4	x	20 479,5	9 000,0			103 751,9	83 567,9	x	20 184,0	9 000,0			19	8,4	43,9	44,6	100,0
5	ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум"	119 585,3	93 876,8	x	25 708,5	3 000,0			119 340,4	93 876,8	x	25 463,6	2 788,7			21,5	2,5	11,7	11	93,0
6	ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"	68 314,7	52 986,3	x	15 328,4	4 480,0			67 264,7	52 986,3	1 312,2	14 278,4	3 430,0			22,4	6,6	29,2	24	76,6
7	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	178 704,5	81 156,0	x	97 548,5	56 977,9		2 240,0	149 998,5	75 590,0	x	74 408,5	34 130,5		2 240,0	54,6	33,1	60,7	48,9	61,4
8	ГАПОУ ЛО "Борский агропромышленный техникум"	107 387,3	84 064,9	x	23 322,4	4 582,7		1 000,0	107 139,1	84 064,9	x	23 074,2	4 582,7		1 000,0	21,7	5,2	23,9	24,2	100,0
9	ГАПОУ ЛО "Всеволожский	189 836,5	130 009,8	x	59 876,7	29 000,0			188 568,1	130 009,8	1 027,1	58 558,3	29 000,0			31,5	15,3	48,5		

Документ создан в электронной форме. № 01-23-11/2023 от 06.12.2023. Исполнитель: Ларина Наталья Леонидовна

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

10	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	129 662,0	89 163,1	x	40 498,9	5 363,6	1 338,9		129 102,7	89 163,1	271,0	39 939,6	5 363,6	1 338,9		31,2	5,2	16,5	16,8	100,0
Итого по государственным автономным		1 166 788,0	791 826,5	0,0	374 961,5	129 661,2	1 338,9	6 240,0	1 127 524,6	782 541,5	3 007,5	344 983,1	104 552,6	1 338,9	6 240,0	32,1	11,8	36,6	32,5	81,7
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																				
1	ГБПОУ ЛО "Лодейнополюский техникум промышленных технологий"	48 037,9	34 447,0	x	13 590,9	2 193,0			46 973,3	34 180,0	x	12 793,3	2 193,0			28,3	4,6	16,1	17,1	100,0
2	ГБПОУ ЛО "Бегунишкинский агротехнологический техникум"	88 383,2	63 283,4	x	25 099,8	7 793,2			87 246,1	63 283,3	311,8	23 962,8	7 793,2			28,4	8,8	31	32,5	100,0
3	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"	93 854,4	50 508,5	x	43 345,9	30 000,0		2 480,0	93 308,2	50 508,5	629,0	42 799,7	29 700,0		2 480,0	46,2	34,6	74,9	75,2	99,1
4	ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"	98 031,4	74 423,1	x	23 608,3	10 720,0			98 031,4	74 423,1	1 252,9	23 608,3	10 720,0			24,1	10,9	45,4	45,4	100,0
5	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	141 758,3	78 020,3	x	63 738,0	15 000,0		1 000,0	141 758,3	78 020,3	1 308,7	63 738,0	15 000,0		1 000,0	45	11,3	25,1	25,1	100,0
6	ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорск	55 912,3	41 059,1	x	14 853,2	9 000,0			55 912,3	41 059,1	168,0	14 853,2	9 000,0			26,6	16,1	60,6	60,6	100,0
7	ГБПОУ ЛО "Волховский многопрофильный техникум" (ВКТС)	250 058,1	183 330,4	x	66 727,7	17 665,7		3 000,0	248 187,3	183 330,4	x	64 856,9	17 254,7		3 000,0	26,7	8,3	31	31,2	98,0
8	ГБПОУ ЛО "Сланцевский индустриальный техникум"	65 267,2	48 010,4	x	17 256,8	4 000,0			65 267,2	48 010,4	x	17 256,8	4 000,0			26,4	6,1	23,2	23,2	100,0
9	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	106 425,0	50 768,2	x	55 656,8	30 000,0			103 704,6	50 768,2	57,0	52 936,4	30 000,0			52,3	28,2	53,9	56,7	100,0
10	ГБПОУ ЛО "Кингисеппский колледж технологии и сервиса"	144 154,4	111 392,2	x	32 762,2	1 000,0			144 020,1	111 392,2	x	32 627,9	1 000,0			22,7	0,7	3,1	3,1	100,0
11	ГБПОУ ЛО "Подпорожский политехнический техникум"	58 930,4	43 747,9	x	15 182,5	2 461,0		2 000,0	58 866,0	43 744,1	50,0	15 121,9	2 461,0		2 000,0	25,8	7,6	29,4	29,5	100,0
12	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	98 348,4	74 628,6	x	23 719,8	3 429,0		2 000,0	98 050,1	74 628,6	x	23 421,5	3 424,7		1 950,6	24,1	5,5	22,9	23	99,0
13	ГБПОУ ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского"	160 521,3	108 871,1	x	51 650,3	26 913,2			141 545,0	108 871,1	454,9	32 673,9	8 132,9			32,2	16,8	52,1	24,9	30,2
Итого по государственным бюджетным		1 409 682,3	962 490,1	0,0	447 192,2	160 175,0	0,0	10 480,0	1 382 869,9	962 219,2	4 232,3	420 650,7	140 679,5	0,0	10 430,6	31,7	12,1	38,2	35,9	88,5
ВСЕГО за 2021 год:		2 576 470,3	1 754 316,6	0,0	822 153,7	289 836,2	1 338,9	16 720,0	2 510 394,5	1 744 760,7	7 239,8	765 633,8	245 232,0	1 338,9	16 670,6	31,9	12,0	37,4	34,4	85,5

¹ В том числе на ремонт зданий и сооружений

Информация об объемах средств предоставленных и израсходованных субсидий государственным учреждениям среднего профессионального образования

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование государственных учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области	2022 год															(тыс. руб.)				
		Предоставлено субсидий							Израсходовано средств субсидии							Доля					
		Всего	субсидия на		субсидия на иные цели				Всего	субсидия на		субсидия на иные цели			СИЦ в общем объеме субсиди й - предост авлено	СИЦ на ремонт в общем объеме субсидий - предоста влено	СИЦ на ремонт в общем объеме СИЦ - предост авлено	СИЦ на ремонт - фактичес ки направле но	СИЦ на ремонт - фактичес ки исполне но		
			Всего	из них на ремонт зданий и сооружен ий	Всего	из них:				Всего	из них на ремонт зданий и сооружен ий	Всего	из них:								
						на ремонт зданий и сооружений	на содержан ие имуще ства	на доступную среду ¹					на ремонт зданий и сооружений	на содержан ие имуще ства						на доступную среду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																					
1	ГАПОУ ЛО "Лужский агропромышленный техникум"	74 071.3	51 630.3	х	22 441.0	7 000.0		2 471.0	73 444.0	51 630.3	х	21 813.7	7 000.0		2 471.0	30.3	12.8	42.2	43.4	100.0	
2	ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	140 260.0	58 290.1	х	81 969.9	28 310.0			140 260.0	58 290.1	х	81 969.9	28 310.0			58.4	20.2	34.5	34.5	100.0	

3	ГА ПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»	103 790,5	63 157,0	x	40 633,5	27 000,0			102 207,3	63 157,0	68,2	39 050,3	27 000,0						
4	ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум"	108 239,7	87 215,7	x	21 024,0	5 000,0			108 133,2	87 215,7	x	20 917,5	5 000,0			39,1	26	66,4	69,1
5	ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум"	137 488,1	97 032,2	x	40 455,9	3 000,0		2 080,0	137 147,9	97 032,2	x	40 115,7	3 000,0		2 080,0	19,4	4,6	23,8	23,9
6	ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"	69 867,0	54 083,1	x	15 783,9	2 938,4		2 080,0	69 763,3	54 083,1	756,3	15 680,2	2 938,4		1 976,4	29,4	3,7	12,6	12,7
7	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	112 298,6	83 692,1	x	28 606,5	1 000,0			111 967,5	83 685,1	x	28 282,4	1 000,0			22,6	7,2	31,8	31,3
8	ГАПОУ ЛО "Борский агропромышленный техникум"	107 367,5	83 600,0	x	23 767,5	1 500,0			106 946,6	83 600,0	x	23 346,6	1 500,0			25,5	0,9	3,5	3,5
9	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	157 727,1	130 972,6	x	26 754,5	3 999,5		2 109,0	155 147,8	130 972,6	989,5	24 175,2	3 999,5		2 109,0	22,1	1,4	6,3	6,4
10	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	147 785,2	88 045,8	x	59 739,5	37 571,9	2 573,4		147 785,2	88 045,8	x	59 739,5	37 571,9	2 573,4		17	3,9	22,8	25,3
Итого по государственным автономным		1 158 895,0	797 718,9	0,0	361 176,2	117 319,7	2 573,4	8 740,0	1 152 802,9	797 711,9	1 814,0	355 091,0	117 319,7	2 573,4	8 636,4	40,4	27,2	67,2	67,2
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																			
1	ГБПОУ ЛО "Лодейнополюский техникум промышленных технологий"	51 853,1	34 651,6	x	17 201,5	3 500,0		2 500,0	50 932,7	34 551,9	x	16 380,8	3 500,0		2 500,0	33,2	11,6	34,9	36,6
2	ГБПОУ ЛО "Бегунишский агротехнологический техникум"	132 057,4	67 472,1	x	64 585,3	40 870,3			131 617,5	67 073,5	x	64 544,0	40 870,3			48,9	30,9	63,3	63,3
3	ГБПОУ ЛО "Беселский сельскохозяйственный техникум"	111 369,9	55 404,0	x	55 965,9	11 900,7			110 516,6	54 660,1	x	55 856,5	11 900,7			50,3	10,7	21,3	21,3
4	ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"	122 643,0	83 279,6	x	39 363,4	17 684,8		4 980,0	122 642,4	83 279,6	3 442,1	39 362,8	17 684,8		4 980,0	32,1	18,5	57,6	57,6
5	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	123 673,9	77 560,9	x	46 113,0	4 700,0			123 673,9	77 560,9	436,5	46 113,0	4 700,0			37,3	3,8	10,2	10,2
6	ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорск	53 738,0	44 702,5	x	9 035,5	2 500,0			53 738,0	44 702,5	910,0	9 035,5	2 500,0			16,8	4,7	27,7	27,7
7	ГБПОУ ЛО "Волховский многопрофильный техникум"	243 302,5	186 258,6	x	57 043,9	15 650,0			243 302,5	186 258,6	x	57 043,9	15 650,0			23,4	6,4	27,4	27,4
8	ГБПОУ ЛО "Сланцевский индустриальный техникум"	64 332,8	46 928,9	x	17 403,9	1 000,0			64 332,8	46 928,9	x	17 403,9	1 000,0			27,1	1,6	5,7	5,7
9	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	126 411,6	52 910,3	x	73 501,3	55 285,4			120 357,3	52 910,3	x	67 447,0	49 995,1			58,1	43,7	75,2	74,1
10	ГБПОУ ЛО "Кингисеппский колледж технологии и сервиса"	180 915,2	129 163,6	x	51 751,6	16 053,6		2 500,0	180 915,2	129 163,6	x	51 751,6	16 053,6		2 500,0	28,6	10,3	35,9	35,9
11	ГБПОУ ЛО "Подпорожский политехнический техникум"	66 038,5	47 491,4	x	18 547,1	3 054,3			65 507,6	47 382,0	149,9	18 125,5	3 054,3			28,1	4,6	16,5	16,9
12	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	130 822,2	74 415,3	x	56 406,9	19 978,0			116 165,7	74 415,3	x	41 750,4	19 978,0			43,1	15,3	35,4	47,9
13	ГБПОУ ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского"	146 175,3	111 824,7	x	34 350,7	4 000,0			145 715,8	111 824,7	x	33 891,1	4 000,0			23,5	2,7	11,6	11,8
Итого по государственным бюджетным		1 553 333,5	1 012 063,5	0,0	541 270,1	196 177,1	0,0	9 980,0	1 529 418,0	1 010 711,9	4 938,5	518 706,1	190 886,9	0,0	9 980,0	34,8	13,3	38,1	38,7
ВСЕГО за 2022 год:		2 712 228,5	1 809 782,3	0,0	902 446,2	313 496,9	2 573,4	18 720,0	2 682 220,9	1 808 423,8	6 752,5	873 797,1	308 206,6	2 573,4	18 616,4	33,3	12,3	37,1	37,7

В том числе на ремонт зданий и сооружений

Информация об объемах средств предоставленных и израсходованных субсидий на ремонт и содержание зданий среднего профессионального образования ГАБУ СПО ЛО в 2020-2022 гг.

2020 год

№ п/п	Наименование государственных учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области	Предоставлено				Использовано в текущем финансовом году					Использовано в очередном финансовом году (либо в последующем периоде)					Процент исполнения	возвращено в областной бюджет
		на ремонт зданий и сооружений	на содержание имущества	на доступную среду ¹	Итого (гр.3+4+5)	на ремонт зданий и сооружений	на содержание имущества	на доступную среду	Итого (гр.7+8+9)	Доля в общем объеме субсидий (%)	на ремонт зданий и сооружений	на содержание имущества	на доступную среду	Итого (гр.12+13+14)	Доля в общем объеме субсидий (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																	
1	ГАПОУ ЛО "Лужский агропромышленный техникум"	1 500,0		1 000,0	2 500,0	1 500,0		1 000,0	2 500,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
2	ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	57 425,5		1 000,0	58 425,5	18 327,6		1 000,0	19 327,6	33,1%	36 238,2			36 238,2	62,0%	95,1%	2 859,7
3	ГА ПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»	12 301,0		1 000,0	13 301,0	12 301,0		1 000,0	13 301,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
4	ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум"	49 500,0		2 000,0	51 500,0	49 500,0		2 000,0	51 500,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
5	ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум"	14 373,9			14 373,9	0,0			0,0	0,0%	14 373,9			14 373,9	100,0%	100,0%	

6	ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"	4 120,0			4 120,0	4 120,0			4 120,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
7	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно- технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	31 830,7		2 000,0	33 830,7	31 830,7		1 142,4	32 973,1	97,5%		857,6	857,6	2,5%	100,0%		
8	ГАПОУ ЛО "Борский агропромышленный техникум"	15 948,0			15 948,0	15 948,0			15 948,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
9	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	23 798,6			23 798,6	22 807,7			22 807,7	95,8%		990,9	990,9	4,2%	100,0%		
10	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	26 696,6		2 000,0	28 696,6	23 000,7		2 000,0	25 000,7	87,1%	3 620,8		3 620,8	12,6%	99,7%	75,1	
Итого по государственным автономным учреждениям		237 494,3	0,0	9 000,0	246 494,3	179 335,7	0,0	8 142,4	187 478,1	76,1%	54 232,9	0,0	1 848,5	56 081,4	22,8%	98,8%	2 934,8
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																	
1	ГБПОУ ЛО "Лодейнопольский техникум промышленных технологий"	4 589,3			4 589,3	4 589,3			4 589,3	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
2	ГБПОУ ЛО "Бегуницкий агротехнологически й техникум"	1 672,6	1 707,8	2 000,0	5 380,4	1 672,6	1 707,8	2 000,0	5 380,4	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	

3	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйствен ный техникум"	17 097,2			17 097,2	0,0			0,0	0,0%	17 097,2			17 097,2	100,0%	100,0%	
4	ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"	1 500,0			1 500,0	1 500,0			1 500,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
5	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	31 000,0			31 000,0	0,0			0,0	0,0%	31 000,0			31 000,0	100,0%	100,0%	
6	ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорск	3 750,0			3 750,0	3 750,0			3 750,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
7	ГБПОУ ЛО "Волховский алюминевый колледж"	9 185,7		4 000,0	13 185,7	9 185,7		4 000,0	13 185,7	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
8	ГБПОУ ЛО "Волховский колледж транспортного строительства"	8 533,7			8 533,7	8 533,7			8 533,7	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
9	ГБПОУ ЛО "Волховский политехнический техникум"	7 389,3			7 389,3	7 389,3			7 389,3	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
10	ГБПОУ ЛО "Сланцевский индустриальный техникум"	4 853,5		2 000,0	6 853,5	4 841,5		695,8	5 537,3	80,8%			1 267,5	1 267,5	18,5%	99,3%	48,7
11	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	3 640,1		1 000,0	4 640,1	1 122,0		1 000,0	2 122,0	45,7%	2 518,1			2 518,1	54,3%	100,0%	

12	ГБПОУ ЛО "Кингисеппский колледж технологии и сервиса"	44 499,9			44 499,9	20 396,2			20 396,2	45,8%	24 102,8			24 102,8	54,2%	100,0%	0,9
13	ГБПОУ ЛО "Подпорожский политехнический техникум"	10 974,2			10 974,2	9 397,0			9 397,0	85,6%	1 577,2			1 577,2	14,4%	100,0%	
14	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	24 316,9			24 316,9	6 607,1			6 607,1	27,2%	17 627,2			17 627,2	72,5%	99,7%	82,6
15	ГБПОУ ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского"	6 270,4			6 270,4	6 270,4			6 270,4	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
Итого по государственным бюджетным учреждениям		179 272,9	1 707,8	9 000,0	189 980,7	85 255,0	1 707,8	7 695,8	94 658,6	49,8%	93 922,5	0,0	1 267,5	95 190,0	50,1%	99,9%	132,2
ВСЕГО за 2020 год:		416 767,2	1 707,8	18 000,0	436 475,0	264 590,7	1 707,8	15 838,2	282 136,7	64,6%	148 155,3	0,0	3 116,0	151 271,3	34,7%	99,3%	3 067,0

¹ В том числе на ремонт зданий и сооружений

2021 год

№ п/ п	Наименование государственных учреждений среднего профессионально- го образования Ленинградской области	Предоставлено				Использовано в текущем финансовом году					Использовано в очередном финансовом году (либо в последующем периоде)					Процент исполне- ния	возвра- щено в област- ной бюджет
		на ремонт зданий и сооруже- ний	на содер- жание имуще- ства	на доступ- ную среду ¹	Итого (гр.3+4+5)	на ремонт зданий и сооруже- ний	на содер- жание имуще- ства	на доступ- ную среду	Итого (гр.7+8+9)	Доля в общем объеме субси- дий (%)	на ремонт зданий и сооруже- ний	на содер- жание имуще- ства	на доступ- ную среду	Итого (гр.12+13+ 14)	Доля в общем объеме субси- дий (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																	
1	ГАПОУ ЛО " Лужский агропромышленный техникум"	4 561,1			4 561,1	4 561,1			4 561,1	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	

2	ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	1 000,0		2 000,0	3 000,0	0,0		2 000,0	2 000,0	66,7%	1 000,0			1 000,0	33,3%	100,0%	
3	ГА ПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленног о и лесного комплекса»	11 695,9		1 000,0	12 695,9	11 695,9		1 000,0	12 695,9	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
4	ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум"	9 000,0			9 000,0	9 000,0			9 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
5	ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум"	3 000,0			3 000,0	2 788,7			2 788,7	93,0%	211,3			211,3	7,0%	100,0%	
6	ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"	4 480,0			4 480,0	3 430,0			3 430,0	76,6%	1 050,0			1 050,0	23,4%	100,0%	
7	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно- технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	56 977,9		2 240,0	59 217,9	34 130,5		2 240,0	36 370,5	61,4%	22 847,4			22 847,4	38,6%	100,0%	
8	ГАПОУ ЛО "Борский агропромышленный техникум"	4 582,7		1 000,0	5 582,7	4 582,7		1 000,0	5 582,7	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
9	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	29 000,0			29 000,0	29 000,0			29 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	

10	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	5 363,6	1 338,9		6 702,5	5 363,6	1 338,9		6 702,5	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
Итого по		129 661,2	1 338,9	6 240,0	137 240,1	104 552,6	1 338,9	6 240,0	112 131,5	81,7%	25 108,7	0,0	0,0	25 108,7	18,3%	100,0%	0,0
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																	
1	ГБПОУ ЛО "Лодейнопольский техникум промышленных технологий"	2 193,0			2 193,0	2 193,0			2 193,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
2	ГБПОУ ЛО "Бегуницкий агротехнологический техникум"	7 793,2			7 793,2	7 793,2			7 793,2	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
3	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"	30 000,0		2 480,0	32 480,0	29 700,0		2 480,0	32 180,0	99,1%	300,0			300,0	0,9%	100,0%	
4	ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"	10 720,0			10 720,0	10 720,0			10 720,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
5	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	15 000,0		1 000,0	16 000,0	15 000,0		1 000,0	16 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
6	ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорск	9 000,0			9 000,0	9 000,0			9 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
7	ГБПОУ ЛО "Волховский многопрофильный техникум" (ВКТС)	17 665,7		3 000,0	20 665,7	17 254,7		3 000,0	20 254,7	98,0%	411,0			411,0	2,0%	100,0%	

8	ГБПОУ ЛО "Сланцевский индустриальный техникум"	4 000,0			4 000,0	4 000,0			4 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
9	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	30 000,0			30 000,0	30 000,0			30 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
10	ГБПОУ ЛО "Кингисеппский колледж технологии и сервиса"	1 000,0			1 000,0	1 000,0			1 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
11	ГБПОУ ЛО "Подпорожский политехнический техникум"	2 461,0		2 000,0	4 461,0	2 461,0		2 000,0	4 461,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
12	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	3 429,0		2 000,0	5 429,0	3 424,7		1 950,6	5 375,3	99,0%				0,0	0,0%	99,0%	53,7
13	ГБПОУ ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского" ²	26 913,2			26 913,2	8 132,9			8 132,9	30,2%	5 045,9			5 045,9	18,7%	49,0%	
Итого по государственным бюджетным учреждениям		160 175,0	0,0	10 480,0	170 655,0	140 679,5	0,0	10 430,6	151 110,1	88,5%	5 756,9	0,0	0,0	5 756,9	3,4%	91,9%	53,7
ВСЕГО за 2021 год:		289 836,2	1 338,9	16 720,0	307 895,1	245 232,0	1 338,9	16 670,6	263 241,5	85,5%	30 865,6	0,0	0,0	30 865,6	10,0%	95,5%	53,7

¹ В том числе на ремонт зданий и сооружений

² остаток не использованных средств субсидий перенесен на 2023 год в сумме 13 734,3 тыс. руб.

2022 год

№ п/ п	Наименование государственных учреждений среднего профессионально- го образования Ленинградской области	Предоставлено				Использовано в текущем финансовом году					Использовано в очередном финансовом году (либо в последующем периоде)					Процент исполне- ния	возвра- щено в област- ной бюджет
		на ремонт зданий и сооруже- ний	на содер- жание имуще- ства	на доступ- ную среду ¹	Итого (гр.3+4+5)	на ремонт зданий и сооруже- ний	на содер- жание имуще- ства	на доступ- ную среду	Итого (гр.7+8+9)	Доля в общем объеме субси- дий (%)	на ремонт зданий и сооруже- ний	на содер- жание имуще- ства	на доступ- ную среду	Итого (гр.12+13+ 14)	Доля в общем объеме субси- дий (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																	
1	ГАПОУ ЛО "Лужский агропромышленный техникум"	7 000,0		2 471,0	9 471,0	7 000,0		2 471,0	9 471,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
2	ГА ПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	28 310,0			28 310,0	28 310,0			28 310,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
3	ГА ПОУ ЛО «Выборгский техникум агропромышленно- го и лесного комплекса»	27 000,0			27 000,0	27 000,0			27 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
4	ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум"	5 000,0			5 000,0	5 000,0			5 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
5	ГАПОУ ЛО "Кировский политехнический техникум"	3 000,0		2 080,0	5 080,0	3 000,0		2 080,0	5 080,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
6	ГАПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"	2 938,4		2 080,0	5 018,4	2 938,4		1 976,4	4 914,7	97,9%				0,0	0,0%	97,9%	103,7

7	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно- технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	1 000,0			1 000,0	1 000,0			1 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
8	ГАПОУ ЛО "Борский агропромышленный техникум"	1 500,0			1 500,0	1 500,0			1 500,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
9	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	3 999,5		2 109,0	6 108,5	3 999,5		2 109,0	6 108,5	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
10	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	37 571,9	2 573,4		40 145,3	37 571,9	2 573,4		40 145,3	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
Итого по государственным автономным учреждениям		117 319,7	2 573,4	8 740,0	128 633,1	117 319,7	2 573,4	8 636,4	128 529,5	99,9%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	99,9%	103,7
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области																	
1	ГБПОУ ЛО "Лодейнополюский техникум промышленных технологий"	3 500,0		2 500,0	6 000,0	3 500,0		2 500,0	6 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
2	ГБПОУ ЛО "Бегуницкий агротехнологический техникум"	40 870,3			40 870,3	40 870,3			40 870,3	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
3	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"	11 900,7			11 900,7	11 900,7			11 900,7	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	

4	ГБПОУ ЛО "Техникум водного транспорта"	17 684,8		4 980,0	22 664,8	17 684,8		4 980,0	22 664,8	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
5	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	4 700,0			4 700,0	4 700,0			4 700,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
6	ГБПОУ ЛО "Политехнический колледж" г. Светогорск	2 500,0			2 500,0	2 500,0			2 500,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
7	ГБПОУ ЛО "Волховский многопрофильный техникум"	15 650,0			15 650,0	15 650,0			15 650,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
8	ГБПОУ ЛО "Сланцевский индустриальный техникум"	1 000,0			1 000,0	1 000,0			1 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
9	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	55 285,4			55 285,4	49 995,1			49 995,1	90,4%	5 290,3			5 290,3	9,6%	100,0%	
10	ГБПОУ ЛО "Кингисеппский колледж технологии и сервиса"	16 053,6		2 500,0	18 553,6	16 053,6		2 500,0	18 553,6	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
11	ГБПОУ ЛО "Подпорожский политехнический техникум"	3 054,3			3 054,3	3 054,3			3 054,3	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
12	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	19 978,0			19 978,0	19 978,0			19 978,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	

13	ГБПОУ ЛО "Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского"	4 000,0			4 000,0	4 000,0			4 000,0	100,0%				0,0	0,0%	100,0%	
Итого по государственным бюджетным учреждениям		196 177,1	0,0	9 980,0	206 157,1	190 886,9	0,0	9 980,0	200 866,9	97,4%	5 290,3	0,0	0,0	5 290,3	2,6%	100,0%	0,0
ВСЕГО за 2022 год:		313 496,9	2 573,4	18 720,0	334 790,3	308 206,6	2 573,4	18 616,4	329 396,4	98,4%	5 290,3	0,0	0,0	5 290,3	1,6%	100,0%	103,7

¹ В том числе на ремонт зданий и сооружений

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам анализа приложений 1-3 к приказу Комитета от 30.12.2020 № 59¹ на соответствие общим требованиям к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели²

№ п/п	Положения общих требований	Положения приложений 1-3 к приказу № 59
1.	Согласно подпункту «б» пункта 3 в нормативном правовом акте, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий (далее – правовой акт), указываются цели предоставления субсидий с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих программ, проектов.	Приложением 1 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области³ (далее – Порядок предоставления СИЦ), предусматривается предоставление субсидий на иные цели (далее – СИЦ) на входящие в мероприятия государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»⁴: - стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования (пункт 1.1); - компенсация стоимости проезда к месту учебы и обратно студентам государственных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской области, обучающимся по программам среднего

¹ Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 30.12.2020 № 59 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных приказов комитета общего и профессионального образования Ленинградской области» (далее – приказ № 59).

² Общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 (далее – общие требования).

³ Приложение 1 к приказу № 59.

⁴ Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398.

		профессионального образования и профессионального обучения (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (пункт 1.5); - оплата расходов на реализацию мероприятий и проектов, проводимых в рамках государственных программ Ленинградской области, не включенных в государственное задание (пункт 3). Наименование государственной программы Ленинградской области в приложении к Порядку предоставления СИЦ не приведено. При этом в заголовках форм заявок на предоставление субсидии (приложения 1-4 к Порядку и срокам рассмотрения заявок на предоставление субсидий на иные цели государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области⁵ (далее – Порядок рассмотрения заявок)), содержатся ссылки на мероприятия, в настоящее время отсутствующие в ГП «Современное образование Ленинградской области».
2.	Согласно подпункту «а» пункта 4 в правовом акте указывается в том числе перечень документов, представляемых учреждением в орган-учредитель для получения субсидии (при необходимости требования к указанным документам), который включает в себя: перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации); программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок; информацию о планируемом к приобретению имуществе, в	Приложением к Порядку предоставления СИЦ предусматривается предоставление СИЦ в том числе на: - выполнение проектно-изыскательских работ, строительный контроль и авторский надзор при проведении ремонтных работ (пункт 2.2); - реализацию мероприятий по благоустройству земельных участков, находящихся в пользовании учреждения (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) (пункт 2.4); - проведение восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации (за исключением расходов, связанных с реконструкцией, капитальным строительством) (пункт 2.5);

⁵ Приложение 2 к приказу № 59.

	случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества; информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат; иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.	- оплату расходов на реализацию мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов (пункт 4); - реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (пункт 5); - реализацию мероприятий за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ленинградской области, резервного фонда Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов, резервного фонда Правительства Российской Федерации (пункт 6). Требования к перечню документов, необходимых для предоставления совместно с заявкой для получения субсидии на указанные цели, в Порядке предоставления СИЦ и Порядке рассмотрения заявок отсутствуют.
3.	Согласно подпункту «в» пункта 4 в правовом акте указываются в том числе основания для отказа учреждению в предоставлении субсидии: несоответствие представленных учреждением документов (заявка, пояснительная записка, иные документы) установленных порядком предоставления субсидии требованиям (при их установлении), или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением; иные основания для отказа, определенные правовым актом (при необходимости).	Пунктом 5.2 Положения о комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидий на иные цели государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области⁶ (далее – Положение о комиссии), предусмотрено единственное основание для отказа в предоставлении субсидии (за исключением субсидии на проведение работ по капитальному ремонту и(или) реставрации объектов недвижимости, используемых учреждением для обеспечения целей деятельности): необоснованность заявки – несоответствие заявки качественным критериям оценки, указанным в подпунктах «а» - «г» Положения о комиссии⁷.

⁶ Приложение 3 к приказу № 59.

⁷ «а»: отсутствие у государственной организации просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды; «б»: отсутствие у государственной организации просроченной задолженности по договорным обязательствам; «в»: наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; «г»: отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств за предыдущий период.

		Иные основания для отказа в Положении о комиссии не указаны. Основания для отказа в предоставлении субсидии в Порядке предоставления СИЦ отсутствуют.
4.	Согласно подпункту «г» пункта 4 в правовом акте указывается в том числе размер субсидии или порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и порядок их применения и (или) иная информация исходя из целей предоставления субсидии), и источник ее получения, за исключением случаев, когда размер субсидии определен законом (решением) о бюджете, решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации	Пунктами 2.3 и 2.4 Порядка предоставления СИЦ предусмотрено, что объем субсидий на иные цели определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области в размере годовой потребности либо на основании документов, представленных совместно с заявкой на предоставление субсидии. Размер субсидии или порядок его расчета Порядком предоставления СИЦ не определен
5.	Согласно подпункту «ж» пункта 4 в правовом акте указываются в том числе результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, региональных проектов, государственных (муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов реализации таких программ) (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации таких программ, проектов), и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации).	Данное положение в Порядке предоставления СИЦ, Порядке рассмотрения заявок и Положении о комиссии отсутствует (в пункте 2.6 Порядка предоставления СИЦ имеется ссылка на установление целевых показателей результативности использования субсидии в соглашении о предоставлении СИЦ).
6.	Согласно подпункту «а» пункта 7 в правовом акте указываются: положение о порядке принятия органом-учредителем или учреждением, осуществляющим в установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами случаях функции и полномочия главного распорядителя и	Данное положение в Порядке предоставления СИЦ <i>отсутствует.</i>

	получателя средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии.	
<i>Иные нарушения и недостатки</i>		
7.	Пунктом 2.6 приложения 1 к Порядку предоставления СИЦ предусматривается предоставление субсидии на оплату расходов по содержанию имущества, не связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ). Данное положение противоречит пункту 11 общих требований ⁸ , утвержденных приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 № 662, согласно которому в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной (муниципальной) услуги включаются в том числе затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, а также затраты на аренду указанного имущества.	
8.	Типовой формой соглашения о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области субсидий государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Ленинградской области на иные цели, утвержденной приказом Комитета финансов Ленинградской области от 30.12.2020 № 18-02/05-37, предусматривается направление органу исполнительной власти, осуществляющему функции и полномочия учредителя государственного учреждения Ленинградской области, отчетов: - о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия; - о достижении значений результатов предоставления субсидии - в срок не позднее определенного соглашением количества рабочих дней, следующих за отчетным месяцем (кварталом, годом), в котором была получена субсидия. Типовой формой также установлены формы указанных отчетов. В нарушение требований Типовой формы Порядок № 59 содержит положения, согласно которым указанные отчеты представляются не позднее 5 рабочих дней после реализации мероприятия.	
9.	Наименование комиссии по рассмотрению заявок организаций на предоставление субсидий на иные цели, приведенное в пункте 4.2 Порядка рассмотрения заявок, не совпадает с наименованием Комиссии по рассмотрению заявок государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, Положение о которой утверждено приказом № 59 (приложение 3).	
10.	Пунктом 3.2 Положения о комиссии установлено, что комиссия по рассмотрению заявок на предоставление субсидий на иные	

⁸ Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.09.2021 № 662.

	цели государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – комиссия), формируется в количестве 9 человек и состоит из председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов комиссии. Согласно пункту 3.3 Положения о комиссии председателем комиссии согласно распоряжению является заместитель председателя комитета – начальник отдела содержания и развития материально-технической базы и делопроизводства. Требования (в частности, к месту работы (службы), квалификации и пр.) к заместителю председателя комиссии, секретарю и членам комиссии Положением о комиссии не установлены, в связи с чем формально в состав комиссии могут войти лица, не обладающие соответствующей квалификацией.
11.	В пункте 2.6 Порядка предоставления СИЦ перечислены обязательные для включения в соглашение о предоставлении СИЦ условия. Однако, согласно подпункту «д» пункта 4 общих требований, утверждение типовой формы соглашения о предоставлении СИЦ из регионального бюджета и, соответственно, включение в данную типовую форму необходимых условий соглашения отнесено к полномочиям финансовых органов субъектов Российской Федерации. Установление в приказе № 59 условий, обязательных к исполнению Комитетом финансов Ленинградской области, не относится к полномочиям комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.
12.	Пунктом 5.2 Положения о комиссии предусмотрено основание для отказа в предоставлении субсидии в связи с несоответствием заявки качественным критериям оценки, указанным в подпунктах «а» - «г» Положения о комиссии. Пункт Положения о комиссии, в котором содержатся указанные подпункты, в тексте пункта 5.2 не указан.

Перечень ГАБУ СПО ЛО, в отношении которых проведен анализ организации использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020-2022 годах на ремонт и содержание зданий и сооружений

- 1) ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»;
- 2) ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»;
- 3) ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»;
- 4) ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»;
- 5) ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»;
- 6) ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»;
- 7) ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»;
- 8) ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум».

**Перечень соглашений о предоставлении субсидий на иные цели на ремонт и содержание зданий и сооружений учреждений среднего профессионального образования Ленинградской области в 2020-2022 гг.
(в разрезе выборочного анализа 8 ГАБУ СПО ЛО)**

тыс.руб.							
№ п/п	Получатель	2020 год		2021 год		2022 год	
		Реквизиты соглашения	Размер субсидии	Реквизиты соглашения	Размер субсидии	Реквизиты соглашения	Размер субсидии
	Государственные автономные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области						
1	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	№ 198 от 07.04.2020 ¹	23 500,0	№ 266 от 22.03.2021 ¹	29 000,0	№ 457 от 13.05.2022 ¹	3 999,5
2		№ 510 от 17.12.2020 ¹	298,6			№ 400 от 15.04.2022 ²	2 109,0
3	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	№ 221 от 09.04.2020 ¹	26 696,6	№ 365 от 13.04.2021 ¹	5 010,9	№ 261 от 15.02.2022 ¹	37 571,9
4		№ 206 от 09.04.2020 ²	2 000,0	№ 544 от 25.08.2021 ¹	352,6	№ 465 от 20.05.2022 ¹	2 573,4
				№ 535 от 30.07.2021 ¹	1 338,9		
5	ГАПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	№ 222 от 09.04.2020 ¹	22 355,1	№ 210 от 10.03.2021 ¹	1 000,0	№ 229 от 15.02.2022 ¹	28 310,0
6		№ 477 от 03.12.2020 ¹	18 015,2	№ 314 от 31.03.2021 ¹	2 000,0		
7		№ 480 от 14.12.2020 ¹	17 055,2				
8		№ 207 от 09.04.2020 ²	1 000,0				
9	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	№ 313 от 02.06.2020 ¹	20 906,5	№ 292 от 24.03.2021 ¹	56 977,9	№ 456 от 13.05.2022 ¹	1 000,0
10		№ 364 от 24.07.2020 ³	10 924,1	№ 313 от 31.03.2021 ²	2 240,0		
11		№ 208 от 09.04.2020 ²	2 000,0				
ИТОГО по государственным автономным учреждениям:			144 751,4		97 920,3		75 563,8
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Ленинградской области							
12	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"	№ 182 от 27.03.2020 ¹	17 097,2	№ 347 от 08.04.2021 ¹	30 000,0	№ 230 от 15.02.2022 ¹	11 900,7
					№ 316 от 31.03.2021 ²	2 480,0	

13	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	№ 226 от 09.04.2020 ¹	2 483,3	№ 297 от 26.03.2021 ¹	3 429,0	№ 260 от 15.02.2022 ¹	19 978,0
14		№ 374 от 19.08.2020 ¹	11 308,0	№ 326 от 31.03.2021 ²	2 000,0		
15		№ 478 от 07.12.2020 ¹	10 525,6				
16	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	№ 165 от 24.03.2020 ¹	3 640,1	№ 302 от 26.03.2021 ¹	30 000,0	№ 226 от 15.02.2022 ¹	31 785,4
17		№ 210 от 09.04.2020 ²	1 000,0			№ 342 от 06.04.2022 ¹	23 500,0
18	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	№ 229 от 14.04.2020 ¹	31 000,0	№ 290 от 24.03.2021 ¹	15 000,0	№ 493 от 01.06.2022 ¹	4 700,0
				№ 322 от 31.03.2021 ²	1 000,0		
ИТОГО по государственным бюджетным учреждениям:			77 054,2		83 909,0		91 864,1
ВСЕГО:			221 805,6		181 829,3		167 427,9

¹ предмет соглашения - предоставление субсидии в целях проведения мероприятия «Ремонтные работы в организациях профессионального образования» в рамках основного мероприятия (с 01.01.2022 - комплекса процессных мероприятий) «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»

² предмет соглашения - предоставление субсидии в целях реализации мероприятия «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования» в рамках основного мероприятия «Мероприятия по приспособлению объектов для доступа инвалидов и маломобильных групп населения» подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области». С 01.01.2022 - предоставление субсидии в целях реализации мероприятия «Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов учреждений профессионального образования» в рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение качества жизни лиц пожилого возраста и инвалидов» подпрограммы 2 «Развитие системы социального обслуживания Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области»

³ предмет соглашения - предоставление субсидии в целях проведения мероприятия «Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов» в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»

Перечень ГАБУ СПО ЛО, представивших заявки на предоставление субсидии с нарушением установленного срока

№ п/п	Наименование учреждения	Год, в котором запланированы ремонтные работы	Дата представления заявки	Номер заявки
1.	ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»	2021	23.03.2021	370
2.	ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»	2022	28.03.2022	130
		2022	14.04.2022	160
3.	ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева»	2021	25.03.2021	103
4.	ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»	2021	25.03.2021	01-8/200
5.	ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»	2021	30.03.2021	01-09/107
6.	ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»	2021	29.03.2021	241

Перечень ГАБУ СПО ЛО, представивших заявки на предоставление субсидии в отсутствие прилагаемых к заявкам документов

№ п/п	Наименование учреждения	Реквизиты заявок	Реквизиты распоряжения Комитета о предоставлении субсидии	Реквизиты протокола комиссии	Примечание
1.	ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»	от 20.05.2019 б/н на сумму 81 000,0 тыс. руб., от 23.04.2020 № 01-09/335 на сумму 30 000,0 тыс. руб., от 18.05.2020 № 01-09/339 на сумму 114 500,0 тыс. руб.	от 04.02.2020 № 229-р	№ 1 от 21.01.2020	Заявки на проведение ремонтных работ на 2020 год (12 объектов), на 2021, 2022, 2023 годы (10 объектов).
		от 26.07.2021 № 01-09/241 на сумму 121 400,0 тыс. руб.	от 30.05.2022 № 1148-р	№ 1 от 22.12.2020	Заявки на проведение ремонтных работ на 2022, 2023, 2024 годы.
		№ 01-09/107 от 30.03.2021 на сумму 1 000,0 тыс. руб.	от 30.03.2021 № 822-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
2.	ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»	от 21.10.2019 № 108 на сумму 17 097,2 тыс. руб.	от 04.02.2020 № 233-р	№ 1 от 21.01.2020	Заявка на проведение ремонта фасада здания общежития. Представленный Комитетом локальный сметный расчет № 1 (локальная смета) (утвержден директором ГБПОУ ЛО «БСТ», дата утверждения и подписи лиц, составивших и проверивших смету, отсутствуют) составлен в ценах января 2020 года, в связи с чем не может быть принят в качестве документа, представленного совместно с заявкой.
		№ 200 от 15.05.2020 на сумму 91 640,3 тыс. руб.; № 3086 от 11.12.2020 на сумму 30 000,0 тыс. руб.	от 30.12.2020 № 2286-р	№ 1 от 22.12.2020	Заявки на проведение работ: на ремонт стадиона, размещение в помещениях учреждения центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Заявка от 11.12.2020 представлена после истечения срока, установленного Комплексом мер («дорожной картой») по созданию и

					функционированию центра опережающей профессиональной подготовки на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Беседский сельскохозяйственный техникум», утвержденного распоряжением Губернатора Ленинградской области от 03.07.2019 № 435-р. Локальный сметный расчет стоимости ремонта стадиона (представлен в электронной форме, подписи лиц, составивших и проверивших смету, отсутствуют, отметка об утверждении отсутствует) составлен в текущем уровне цен – июль 2019 г. Объектная смета № 02-01 составлена в текущем уровне цен – апрель 2021 г., к смете приложено положительное заключение проверки сметной документации № 28/2-06-21 утвержденное 28.06.2021. Таким образом, данные документы не могут быть приняты в качестве приложений к заявкам.
		от 24.03.2021 № 370 на сумму 2 480,0 тыс. руб.	от 29.03.2021 № 795-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
		№№ 478, 478а, 478б от 22.07.2021 на сумму 60 100,0 тыс. руб.; № 480 от 30.08.2021 на сумму 12 000,0 тыс. руб.	от 01.02.2022 № 184-р	Отсутствует	Заявки на проведение ремонта кровли здания общежития и здания учебного корпуса, текущего ремонта помещений первого и второго этажа в здании учебного корпуса, ремонта стадиона. Локальные сметные расчеты №№ 02-01-01, 02-01-02 и 02-01-03 составлены в текущем уровне цен – март 2022, в связи с чем не могут быть приняты в качестве документов, представленных совместно с заявками.
3.	ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»	№ 01/12 от 17.12.2020 на сумму 298,6 тыс. руб.	от 03.12.2020 № 2031-р	№ 5 от 23.11.2020	Заявка проведение работ по установке радиаторов и монтажу трубопроводов системы центрального отопления в помещении столовой. В заявке имеется отметка о прилагаемых к ней фотофиксации внешнего облика объекта и локальной смете (не представлены).
		№№ 188/07-07, 190/07-07, 192/07-07, 193/07-07, 198/07-07, 200/07-07, 202/07-07, 203/07-07, 210/07-07, 216/07-07, 217/07-07, 222/07-	от 30.12.2020 № 2286-р	№ 1 от 22.12.2020	В заявках: – обоснование необходимости проведения ремонтных работ не содержит описание конкретных обстоятельств, ввиду которых возникла такая необходимость, не приведены ссылки на конкретные структурные единицы нормативных актов, поименованных в заявках; – не конкретизированы мероприятия, которые входят в ремонтные

		07, 223/07-07, 224/07-07 от 14.05.2020 на общую сумму 83 082,0 тыс. руб.			работы (заявки №№ 200/07-07 и 210/07-07). В заявках имеются отметки о приложенных к ним фотофиксации объектов ремонта и локальных сметах №№ 05/14/03, 05/14/05, 05/14/07, 05/14/08, 05/14/12, 05/14/14, 05/14/16, 05/14/17, 05/15/24, 05/15/30, 05/15/31, 05/15/34, 05/15/36, 05/15/36 от 14.05.2020 (не представлены). Заявки уполномоченными должностными лицами учреждения не подписаны.
		№№ 204/07-07, 212/07-07, 214/07-07, 215/07-07, 225/07-07 от 14.05.2020; № 130 от 28.03.2022 на общую сумму 13 760,2 тыс. руб.	от 01.02.2022 № 184-р	Отсутствует	В заявках: – обоснование необходимости проведения ремонтных работ не содержит описание конкретных обстоятельств, ввиду которых возникла такая необходимость, не приведены ссылки на конкретные структурные единицы нормативных актов, поименованных в заявках; – не конкретизированы мероприятия, которые входят в ремонтные работы (заявка № 225/07-07). В заявках имеются отметки о приложенных к ним фотофиксации объектов ремонта и локальных сметах №№ 05/14/18, 05/15/26, 05/15/28, 05/15/28, 05/15/39 от 14.05.2020 (не представлены). Информация о расчете с учетом инфляции в заявках отсутствует. Заявки уполномоченными должностными лицами учреждения не подписаны.
		№ 130 от 28.03.2022 на сумму 5 480,3 тыс. руб.			В заявке обоснование необходимости проведения ремонтных работ не содержит описание конкретных обстоятельств, ввиду которых возникла такая необходимость (в том числе не приведены ссылки на структурные единицы нормативных актов, поименованных в заявке), не конкретизированы мероприятия, которые входят в ремонтные работы. К заявке приложен локальный сметный расчет № 12 от 15.02.2022, иные документы не представлены.
		от 14.04.2022 № 160 на сумму 2 109,0 тыс. руб.	от 14.04.2022 № 706-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
4.	ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.	от 27.03.2020 № 127 на сумму 2 000,0 тыс. руб.	от 08.04.2020 № 709-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
		№№ 156-163 и 165-173	от 30.12.2020 №	№ 1 от	В заявках:

	Лебедева»	от 18.05.2020 на общую сумму 83 647,3 тыс. руб.	2286-р	22.12.2020	- не конкретизированы мероприятия, которые входят в ремонтные работы; - имеются ссылки на приложенные локальные сметные расчеты, фотографии и иные документы, обосновывающие необходимость проведения работ (не представлены). Комитетом в рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия представлены: - исполнительная смета № 1 на проведение ремонтных работ в коридоре (помещения №№ 45, 46, 52, 53) здания мастерских и переходной галереи, составленная в ценах ноября 2020 г.; - исполнительная смета № 2 на проведение ремонтных работ по замене системы освещения в помещениях №№25, 45-49, 51-53 здания мастерских и переходной галереи, составленная в ценах ноября 2020 г.; - исполнительная смета № 3 на проведение ремонтных работ в электромонтажной мастерской (помещения №№ 48, 49) здания мастерских и переходной галереи, составленная в ценах ноября 2020 г.; - исполнительная смета № 4 на проведение ремонтных работ по замене ИТП в здании мастерских и переходной галереи, составленная в ценах ноября 2020 г.; - исполнительный сметный расчет № 1 на ремонтные работы по замене систем вентиляции в здании мастерских и переходной галереи, составленный в ценах ноября 2020 г. и содержащий отметки об утверждении расчета временно исполняющим обязанности директора ГАПОУ ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева» Князевым Р.Ю. в 2021 году; - локальная смета фактически выполненных ремонтных работ по приспособлению для доступа инвалидов и маломобильных групп населения лестничных маршей с 1 по 4 этажи здания учебного корпуса, составленная в ценах ноября 2020 г.; - исполнительная смета на проведение ремонтных работ в помещении № 8 здания мастерских и переходной галереи, составленная в ценах августа 2021 г., которые не могут быть приняты в качестве документов, прилагаемых к заявкам, поскольку они составлены позднее их представления. Кроме того, перечисленные в сметах работы не совпадают с работами, указанными в заявках.
		от 25.03.2021 № 103 на	от 29.03.2021 №	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению

		сумму 2 240,0 тыс. руб.	790-р		помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
		№№ 225-230, б/н, 232-244 на общую сумму 101 289,3 тыс. руб., план (заявка) б/н, б/д на общую сумму 37 195,5 тыс. руб.	от 01.02.2022 № 184-р	Отсутствует	К заявкам (за исключением заявки № 243) представлены локальные сметы, конкретизирующие виды работ, составленные в ценах 2018-2021 годов. Информация о расчете с учетом инфляции в заявках отсутствует. К заявке № 243 от 20.05.2021 локальная смета не представлена, ко всем заявкам также не представлены иные документы, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка № 59. В ходе экспертно-аналитического мероприятия Комитетом представлены электронные копии составленных в ценах февраля 2023 года локальных сметных расчетов (не содержащих подписей лиц, их составивших и утвердивших, и дат составления) на проведение ремонтных работ: - по замене оконных блоков в помещениях 3 и 4 этажа здания учебного корпуса, в общежитии и столовой; - по замене дверей запасного выхода; - ремонтных работ, в том числе по замене оконных и дверных блоков, на лестнице, которые не могут быть приняты в качестве документов, прилагаемых к указанному выше перечню, поскольку они составлены позднее их представления, отметки о составлении и утверждении смет на данных копиях отсутствуют.
5.	ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»	№№ 01-8/897 – 01-8/900 от 27.06.2019 на общую сумму 1 382,4 тыс. руб.	от 04.02.2020 № 222-р	№ 1 от 21.01.2020	Обоснованием необходимости ремонта в заявках указана дефектная ведомость (не представлена)
		от 10.03.2021 б/н на общую сумму 1 918 152,1 тыс. руб.	от 30.12.2020 № 2286-р	№ 1 от 22.12.2020	Локальные сметы (локальные сметные расчеты), приложенные к некоторым заявкам от 10.03.2021, составлены позднее данной даты: локальный сметный расчет № 1 на ремонт водогрейного котла с механической чисткой внутренней поверхности жаротрубной части стоимостью 174,6 тыс. руб. отмечен на первой странице расчета как приложение к договору № 26/21 от 05.10.2021; локальный сметный расчет № 1 на проведение ремонта водогрейного котла с гидрохимической очисткой внутренней

					поверхности нагрева стоимостью 105,0 тыс. руб. составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2021 года, отмечен на первой странице расчета как приложение № 2 к договору № 12/08-21 от 12.09.2021; локальная смета № 1 на ремонт обмуровочного покрытия стенок и сводов топочного отделения и арки газохода котла водогрейного стоимостью 286,1 тыс. руб. отмечена на первой странице сметы как приложение № 2 к договору № 13/08-21 от 13.08.2021; локальный сметный расчет № 1 на замену радиаторов, запорных кранов и дефектных труб системы отопления учебного корпуса №2 стоимостью 226,0 тыс. руб. составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2021 года, отмечен на первой странице расчета как приложение № 1 к договору № 212008 от 30.09.2021. Локальный сметный расчет, прилагаемый к заявке на ремонт пожарной сигнализации стоимостью 1 271,3 тыс. руб., не подписан.
		от 25.03.2021 № 01-8/200 на сумму 2 000,0 тыс. руб.	от 29.03.2021 № 796-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
		от 26.07.2021 б/н на общую сумму 197 217,0 тыс. руб., уточненная заявка № 01-8/593 от 17.08.2021 на сумму 48 113,9 тыс. руб.	от 01.02.2022 № 184-р	Отсутствует	В качестве приложения к заявке от 17.08.2021 № 01-8/593 представлена часть заявок от 26.07.2021, а также уточненные заявки, датированные 26.07.2021. Иные документы к заявкам не приложены.
6.	ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»	№ 239 от 06.04.2020 на сумму 1 000,0 тыс. руб.	от 08.04.2020 № 711-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
		№ 241 от 29.03.2021 на сумму 2 000,0 тыс. руб.	от 29.03.2021 № 792-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
7.	ГАПОУ ЛО «Выборгский	№ 125 от 06.04.2020 на сумму 2 000,0 тыс. руб.	от 08.04.2020 № 717-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения

	политехнический колледж «Александровский»				государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».
8.	ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнических техникум»	1) План заявка на 2021г. № б/н и без даты на сумму 9 729,0 тыс. руб.	от 30.12.2020 № 2286-р	№ 1 от 22.12.2020	Заявка на проведение ремонтных работ в 2021 году (4 объекта): помещения № 1,2,3 автотракторной мастерской; ремонт 2-го этажа в учебно-производственном корпусе
		1) Заявка на 2022 год № б/н и без даты на сумму 84 300,0 тыс. руб.; 2) План заявка на 2022г. № б/н и без даты на сумму 10 491,4 тыс. руб.	от 01.02.2022 № 184-р	№ 2 от 31.01.2022	1) Заявка на проведение в 2022 году капитального ремонта здания и инженерных сетей учебно-производственных мастерских и лабораторий (1 этап); ремонт помещений столовой, ремонт инженерных сетей горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения цокольного этажа; капитальный ремонт спортивной площадки; 2) Заявка на проведение ремонтных работ в 2022 году: коридор и учебные кабинеты 1-го и 2-го этажей; коридор 1-го этажа учебно-производственных мастерских
		№ 67 от 13.03.2020 на сумму 1 000,0 тыс. руб.	от 08.04.2020 № 716-р	Отсутствует	Заявка в рамках реализации мероприятий по приспособлению помещений для доступа инвалидов и маломобильных групп населения государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области».

Разночтения в размере субсидий на иные цели, указанном в протоколе комиссии по рассмотрению заявок или заявках подведомственных учреждений и распоряжениях Комитета

Наименование учреждения	Реквизиты протокола / заявок	Размер субсидии согласно заявке (тыс. руб.)	Реквизиты распоряжения Комитета	Размер субсидии согласно распоряжению (тыс. руб.)
ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»	заявки от 07.06.2019 №№ 380/14-01 и 381/14-01	15 662,3	от 05.03.2020 № 477-р	23 500,0
	протокол № 5 от 23.11.2020	248,6	от 03.12.2020 № 2031-р	298,6
ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»	заявки от 27.06.2019 №№ 01-8/897 – 01-8/900 и от 12.12.2019 №№ 01-08/1734 и 01-8/1742	2 116,1	от 04.02.2020 № 222-р	2 483,3
ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»	Заявка без номера и даты	17 400,0	01.02.2022 № 184-р	25 810,0
ГБПОУ «Тосненский политехнический техникум»	<u>2021г.</u> Заявка № б/н и без даты	9 729,0	от 30.12.2020 № 2286-р	30 000,0

Перечень соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, размер которых не совпадает с размером, утвержденным распоряжениями Комитета

Наименование учреждения	Реквизиты распоряжения Комитета	Размер субсидии согласно распоряжению (тыс. руб.)	Реквизиты соглашения	Размер субсидии согласно соглашению (тыс. руб.)
ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»	от 01.02.2022 № 184-р (в редакции распоряжения Комитета от 02.11.2022 № 2127-р)	18 594,7	№ 260 от 15.02.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 260/4 от 05.12.2022)	19 978,0
ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»	от 04.06.2020 № 972-р (в редакции распоряжения Комитета от 16.07.2020 № 1213-р)	46 444,5	от 03.12.2020 № 477 и от 14.12.2020 № 480 (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 02.08.2021)	35 070,4
ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж»	от 01.02.2022 № 184-р	25 810,0	№ 299 от 15.02.2022 (в редакции дополнительного соглашения № 299/4 от 12.12.2022)	28 310,0
ГАПОУ ЛО «Выборгский политехнический колледж «Александровский»	от 30.12.2020 № 2286-р (в редакции распоряжения Комитета от 09.04.2021 № 950-р)	5 010,9	от 13.04.2021 № 365 и от 25.08.2021 № 544	5 363,6

Разночтения в указании видов ремонтных работ, поименованных в заявках ГАБУ СПО ЛО, и соглашениях о предоставлении данным учреждениям субсидий на иные цели

Наименование учреждения	Реквизиты заявок о предоставлении субсидии	Виды работ согласно заявке	Реквизиты соглашений о предоставлении субсидии	Виды работ по соглашению
ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»	от 07.06.2019 №№ 380/14-01 и 381/14-01	- монтаж сборного здания промышленной теплицы на земельном участке; - установка забора на земельном участке.	№ 198 от 07.04.2020	- ремонтные работы в учебном корпусе № 1 в учебных помещениях и помещениях культурно-массового назначения, общего пользования, специальных (медицинских), административных, технических (подвал, технический этаж), - ремонтные работы в учебных помещениях помещения 2Н, - ремонтные работы в помещениях общежития, гаража, - работы по устройству ограждений на прилегающих территориях.
	от 14.05.2020 №№ 204/07-07, 212/07-07, 213/07-07, 214/07-07, 215/07-07, 225/07-07, от 28.03.2022 № 130	- ремонт хозяйственно-бытовой канализации на территории земельного участка; - модернизация индивидуального теплового пункта (ИТП), с установкой приборов учёта отопления и ГВС (двухэтажное здание гаража); - ремонт двускатной крыши двухэтажной пристройки здания (двухэтажное здание гаража);	№ 457 от 13.05.2022	- ремонтные работы по гидроизоляции кровли, - ремонтные работы в актовом зале и рекреации, - проектирование нового индивидуального теплового пункта (ИТП).

		- ремонт помещений двухэтажной пристройки (двухэтажное здание гаража); - ремонт асфальто-бетонного покрытия открытой автомобильной площадки прилегающей к зданию учебного корпуса №1; - ремонт помещений здания общежития.		
ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно- технологический техникум им. Е.И. Лебедева»	от 22.05.2019 №№ 141-158	- замена системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) в здании учебного комплекса (ул. Центролитовская, д. 5) - замена СОУЭ и АУПС в здании мастерских (Учебный городок, д. 1) - замена СОУЭ и АУПС в здании мастерских и переходной галереи (Больничный проезд, д. 4) - устройство ограждения территории здания мастерских и переходной галереи (Больничный проезд, д. 4) - устройство ограждения территории учебного комплекса (ул. Центролитовская, д. 5) - монтаж системы видеонаблюдения в здании общежития (Учебный городок, д. 4) - ремонт кровли над помещениями №№ 1, 26 здания ОБК и ливневых воронок над помещением № 3 галереи учебного корпуса (Учебный городок, д. 1) - ремонт системы отопления в помещениях левого крыла здания учебного корпуса (Учебный городок, д. 1)	№ 313 от 02.06.2020	- замена СОУЭ и АУПС в здании мастерских (Учебный городок, д. 1) (пункт 1) - устройство ограждения территории здания мастерских и переходной галереи (Больничный проезд, д. 4) (пункт 11) - устройство ограждения территории учебного комплекса (ул. Центролитовская, д. 5) (пункт 9) - демонтаж старой кровли, укладка нового кровельного материала, замена ливневых воронок в здании учебного корпуса и ОБК (Учебный городок, д. 1) (пункт 3) - замена системы отопления, замена светильников, косметический ремонт в помещениях в здании ОБК (помещения №№ 30-38, 42, 43) (Учебный городок, д. 1) (пункт 4) - замена системы отопления в помещениях учебного корпуса №№ 19, 25-27, 49-52, 57-63, 71-74, 93-96 (Учебный городок, д. 1) (пункт 5) - замена металлических решеток на окнах (Учебный городок, д. 1) (пункт 7) - замена системы отопления, замена оконных блоков, косметический ремонт потолка и стен, замена дверных блоков в здании мастерских и переходной галереи, помещения 18-21 (Больничный проезд, д. 4) (пункт 2) - замена лифтового оборудования в здании

		- ремонтные работы в электрощитовой в здании мастерских (Учебный городок, д. 1) - установка ворот в гараже (Учебный городок, д. 1) - установка металлических решеток на окна первого этажа учебного комплекса (Учебный городок, д. 1) - ремонт фитнес-комплекса (Учебный городок, д. 1) - замена кровли (над помещением № 54) и косметический ремонт в помещении переходной галереи (Больничный проезд, д. 4) - косметический ремонт в помещениях №№ 1, 2, 8, 16-21 в здании мастерских и переходной галереи, работы по обустройству главного входа (Больничный проезд, д. 4) - замена лифтового оборудования в здании общежития (Учебный городок, д. 4) - устройство ограждения территории учебного комплекса (Учебный городок, д. 1) - ремонт кабинета ОБЖ и БЖ (Учебный городок, д. 1) - капитальный ремонт стадиона (2 этап) (Учебный городок, д. 1)		общежития (Учебный городок, д. 4) (пункт 6) - замена системы отопления, замена светильников, замена дверных блоков, косметический ремонт помещений здания хозблока (гаража) (ул. Центролитовская, д. 5) (пункт 8) - работы некапитального характера в помещениях №№ 35-37 здания мастерских и переходной галереи (Больничный проезд, д. 4) (пункт 10) - замена системы отопления в помещениях №№ 27, 30, 47, 54, 69, 75, 91, 98 учебного корпуса, помещении № 25 библиотеки, системы ГВС в помещении технического этажа здания общежития, системы вентиляции в спортивном зале здания ОБК (пункт 12)
	от 18.05.2020 №№ 156-163 и 165-173	Ремонтные работы: - по устройству ограждения территории учебного комплекса - по замене кровли и косметического ремонта в помещении переходной галереи	№ 292 от 04.03.2021	1) проведение текущего ремонта зданий, помещений в здании мастерских и переходной галереи: - косметический ремонт помещений, - ремонтные работы по системе

		- в спортивном зале - по замене электрических щитов с наполнением в здании учебного корпуса - в столовой - в электромонтажной мастерской (помещение № 51) - в женском туалете - по замене системы отопления правого крыла учебного корпуса - по замене отмостки учебного комплекса - в лаборатории теплотехники - в трех кабинетах специальных дисциплин - по косметическому ремонту и работы по обустройству главного входа - в библиотеке - в помещении актового зала - в коридоре и фойе первого этажа (помещения №№ 1, 12, 13-ОБК, №№ 1-3, 18, 27, 31-УК) - по замене кровли общежития - по замене ГВС и отопления в квартирах общежития		вентиляции, - ремонтные работы по замене теплового пункта, - ремонтные работы по замене кровельного покрова, - ремонтные работы по замене распределительных щитов в щитовой, - ремонтные работы по облицовке здания; 2) реализация мероприятий по благоустройству земельных участков
ГБПОУ ЛО «Лисинский лесной колледж»	от 27.06.2019 №№ 01-8/897 – 01-8/900 и от 12.12.2019 №№ 01-08/1734 и 01-8/1742	Ремонтные работы: - в переходной галерее между учебными корпусами; - в аудитории № 43; - в аудитории № 47; - на лестничной клетке учебного корпуса; - ремонт сантехнических перегородок.	№ 226 от 09.04.2020	Ремонтные работы: - замена оконных блоков в галерее; - в аудитории № 42 в учебном корпусе № 4; - в аудитории № 43 в учебном корпусе № 4; - в коридоре 2 этажа и аудитории № 14; - установка водомерных узлов учета и пусконаладочные работы в зданиях учреждения; - ремонт сантехнических перегородок в здании общежития.
	от 17.08.2021 за исх. № 01-8/593	- малярные работы в студенческом общежитии;	№ 260 от 15.02.2022	Ремонтные работы: - в здании студенческого общежития в п.

		- ремонт фасада в студенческой столовой; - ремонт кровли учебного корпуса № 1; - замена и монтаж оборудования в учебном лесничестве; - ремонт внутренних электрических сетей здания общежития; - ремонт большого обеденного зала в студенческой столовой; - ремонт внутренних сетей отопления в студенческом общежитии; - строительство теплицы учебного лесопитомника; - ремонт водостоков здания студенческого общежития; - ремонт водостоков здания учебного корпуса № 1; - ремонт малого обеденного зала студенческой столовой; - ремонт плинтусов в студенческом общежитии; - ремонт отмостки здания студенческого общежития; - ремонт отмостки студенческой столовой; - ремонт помещения холодного цеха студенческой столовой; - замена дверей в студенческом общежитии; - ремонт помещения горячего цеха студенческой столовой.		Лисино-Корпус ул. Кравчинского, д. 2А - связанные с подготовкой котельной к отопительному сезону (п. Лисино-Корпус, ул. Арнольда, д.8)
--	--	---	--	--

Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2020 году на ремонт и содержание в организациях профессионального образования.

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование образовательного учреждения	Реквизиты соглашения	Размер субсидии	Использовано в 2020 году	Использовано в 2021 году	Использовано в 2022 году	Остаток не использованных средств субсидий на иные цели	Обоснование неиспользования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	№ 198 от 07.04.2020 (доп.соглашение № 1 от 28.12.2020)	23 500,0	22 807,7	692,3	0,0	0,0	В связи с поздней оплатой заключенных во исполнение соглашения № 198 договоров на выполнение ремонта по состоянию на 31.12.2020 (письмо учреждения от 30.12.2020 № 600/03-07)	-
2		№510 от 17.12.2020	298,6	0,0	298,6	0,0	0,0	В связи с поздним поступлением средств субсидии по соглашению № 510 (23.12.2020) (письмо учреждения от 30.12.2020 № 600/03-07)	-
Всего			23 798,6	22 807,7	990,9	0,0	0,0		
3	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	№ 206 от 09.04.2020	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
4		№ 221 от 09.04.2020 (доп.соглашение № 1 от 23.06.2020)	26 696,6	23 000,7	3 620,8	0,0	75,1	-	возврат остатка в размере 75,1 тыс.руб.
Всего			28 696,6	25 000,7	3 620,8	0,0	75,1		
5	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"	№ 182 от 27.03.2020	17 097,2	0,0	17 090,0	0,0	7,2	В связи с приведением документации о закупке в соответствие с требованиями Ленинградского УФАС в течение 2020 года потребовалось повторное проведение открытого конкурса (письмо учреждения от 30.11.2020 № 303)	возврат остатка в размере 7,2 тыс.руб. 29.06.2021
6	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	№ 226 от 09.04.2020	2 483,3	2 479,4	0,0	0,0	3,9	-	возврат остатка в размере 3,9 тыс.руб. 03.02.2021
7		№ 374 от 19.08.2020 (доп.соглашение № 1 от 14.09.2020)	11 308,0	4 127,8	7 171,4	0,0	8,8	Контракт на сумму 7 171,4 тыс. руб. на выполнение ремонтно-монтажных и пусконаладочных работ в здании котельной не может быть исполнен в 2020 году в связи с длительным изготовлением котла (письмо учреждения от 22.12.2020 № 01-8/1388)	возврат остатка в размере 8,8 тыс.руб. 03.02.2021
8		№ 478 от 07.12.2020	10 525,6	0,0	10 455,8	0,0	69,8	В связи с длительным проведением конкурсным процедур, а также в связи с длительным периодом выполнения ремонтных работ освоение средств субсидии в 2020 году не представляется возможным (письмо учреждения от 22.12.2020 №01-8/1388)	возврат остатка в размере 69,8 тыс.руб. 18.01.2022
Всего			24 316,9	6 607,2	17 627,2	0,0	82,5		

9	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	№210 от 09.04.2020	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
10		№ 165 от 24.03.2020 (доп.соглашение №1 от 30.06.2020)	3 640,1	1 122,0	2 518,1	0,0	0,0	-	-
Всего			4 640,1	2 122,0	2 518,1	0,0	0,0		
11	ГАПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	№ 207 от 09.04.2020	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	-	-
12		№ 222 от 09.04.2020 (доп.соглашения № 1 от 25.06.2020, №2 от 27.10.20, №3 от 25.11.2020)	22 355,1	18 327,6	3 301,8	0,0	725,7	-	возврат в бюджет 725,7 тыс. руб 22.04.2021
13		№ 477 от 03.12.2020	18 015,2	0,0	15 881,2	0,0	2 134,0	-	возврат в бюджет 2 134,0 тыс. руб 22.04.2021
14		№ 480 от 14.12.2020 (доп. соглашения № 2 от 02.08.2021, №1 от 29.12.2021, №3 от 02.11.2022)	17 055,2	0,0	2 618,8	14 436,4	0,0	-	-
Всего			58 425,5	19 327,6	21 801,8	14 436,4	2 859,7		
15	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	№ 208 от 09.04.2020	2 000,0	1 142,4	857,6	0,0	0,0	На сумму, равную указанному остатку субсидии, заключен договор на ремонтные работы помещений для инвалидов, учреждение обратилось с просьбой разрешить к использованию данный остаток в 2021 году (письмо учреждения от 26.01.2021 № 25)	-
16		№ 313 от 02.06.2020	20 906,5	20 906,5	0,0	0,0	0,0	-	-
17		№ 364 от 24.07.2020 (доп. доглашение №1 от 09.11.2020)	10 924,1	10 924,1	0,0	0,0	0,0	-	-
Всего			33 830,6	32 973,0	857,6	0,0	0,0		
18	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	№229 от 14.04.2020	31 000,0	0,0	14 981,0	16 019,0	0,0	Не были своевременно проведены конкурсные процедуры. Учреждение (письмом от 21.01.2021 № 6/н) обратилось в Комитет за разрешением об использовании остатков средств субсидии в 2021 году в сумме 25 898,1 тыс. руб	распоряжением Комитета от 01.02.2021 №226-р разрешен к использованию в 2021 году остаток средств субсидии в сумме 31 000,0 тыс. руб
Итого по соглашениям			221 805,6	108 838,2	79 487,4	30 455,4	3 024,6		

Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2021 году на ремонт и содержание в организациях профессионального образования.

тыс. руб.

тыс. руб.

Номер п/п	Наименование образовательного учреждения	Реквизиты соглашения	Размер субсидии	Использовано в 2021 году	Использовано в 2022 году	Остаток не использованных средств субсидий на иные цели	Обоснование неиспользования	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	№266 от 22.03.2021 (доп. соглашение №1 от 01.09.2021)	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	-	-
2	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	№365 от 13.04.2021 (доп. соглашение №1 от 21.09.2021)	5 010,9	5 010,9	0,0	0,0	-	-
3		№544 от 25.08.2021	352,6	352,6	0,0	0,0	-	-
4		№535 от 30.07.2021	1 338,9	1 338,9	0,0	0,0	-	-
Всего			6 702,5	6 702,5	0,0	0,0		
5	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"	№316 от 31.03.2021	2 480,0	2 480,0	0,0	0,0	-	-
6		№347 от 08.04.2021 (доп. соглашение от 28.12.2021 №1)	30 000,0	29 700,0	300,0	0,0	Неиспользованный остаток субсидии в размере 300,0 тыс. руб. использован на проведение работ, включенных в перечень работ по соглашению №347 дополнительным соглашением от 28.12.2021	-
Всего			32 480,0	32 180,0	300,0	0,0		
7	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	№297 от 26.03.2021	3 429,0	3 424,7	0,0	4,3	-	Остаток возвращен в областной бюджет
8		№326 от 31.03.2021	2 000,0	1 950,6	0,0	49,4	-	Остаток возвращен в областной бюджет
Всего			5 429,0	5 375,3	0,0	53,7		
9	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	№302 от 26.03.2021	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	-	-
10	ГАПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	№210 от 10.03.2021	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	-	-
11		№314 от 31.03.2021	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	-	-
Всего			3 000,0	2 000,0	1 000,0	0,0		

12	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	№292 от 24.03.2021	56 977,9	34 130,5	22 847,4	0,0	На сумму неиспользованного остатка заключены контракты, подлежащие оплате в 2021 году (письмо учреждения от 12.01.2022 № 9)	-
13		№313 от 31.03.2021	2 240,0	2 240,0	0,0	0,0	-	-
Всего			59 217,9	36 370,5	22 847,4	0,0		
14	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	№290 от 24.03.2021 (доп. соглашение №1 от 13.12.2021)	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	-	-
15		№322 от 31.03.2021	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	-	-
Всего			16 000,0	16 000,0	0,0	0,0		
Итого по соглашениям			181 829,3	157 628,3	24 147,4	53,7		

Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, направленных в 2022 году на ремонт и содержание в организациях профессионального образования.

тыс. руб

Номер п/п	Наименование образовательного учреждения	Реквизиты соглашения	Размер субсидии	Использовано в 2022 году	Использовано в 2023 году	Остаток не использованных средств субсидий на иные цели	Обоснование неиспользования	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	ГАПОУ ЛО "Всеволожский агропромышленный техникум"	от 15.04.2022 №400	2 109,0	2 109,0	0,0	0,0	-	-
2		от 13.05.2022 №457 (доп.соглашение от 23.11.2022 № 457/1)	3 999,5	3 999,5	0,0	0,0	-	-
Всего			6 108,5	6 108,5	0,0	0,0		
3	ГАПОУ ЛО "Выборгский политехнический колледж "Александровский"	от 15.02.2022 №261 (доп.соглашения от 06.04.2022 №261/1, от 13.05.2022 №261/2, от 14.06.2022 № 261/3)	37 571,9	37 571,9	0,0	0,0	-	-
4		от 20.05.2022 №465	2 573,4	2 573,4	0,0	0,0	-	-
Всего			40 145,3	40 145,3	0,0	0,0		
5	ГБПОУ ЛО "Беседский сельскохозяйственный техникум"	от 15.02.2022 №230 (доп. соглашение от 05.08.2022 № 230/2)	11 900,7	11 900,7	0,0	0,0	-	-
6	ГБПОУ ЛО "Лисинский лесной колледж"	от 15.02.2022 №260 (доп. соглашения от 07.06.2022 № 260/2, от 29.06.2022 № 260/3, от 05.08.2022 №260/4)	19 978,0	19 978,0	0,0	0,0	-	-
7	ГБПОУ ЛО "Тосненский политехнический техникум"	от 15.02.2022 №226 (доп.соглашение от 30.08.2022 № 226/5)	31 785,4	26 495,1	0,0	5 290,3	Согласно письму учреждения от 11.01.2023 № 3, направленному в адрес Комитета, при производстве работ по контракту от 04.08.2022 № 0145200000422000945-01 на сумму 23 171,9 тыс. руб. образовалась экономия в размере 5 290,3 тыс. руб. или 22,8% от предусмотренного объема ремонтных работ.	В соответствии с распоряжением Комитета от 22.02.2023 № 382-р остаток средств субсидии в сумме 5290,3 тыс. руб. разрешен к использованию в 2023 году на цели, предусмотренные Соглашением № 226.
8		от 06.04.2022 №342	23 500,0	23 500,0	0,0	0,0	-	-
Всего			55 285,4	49 995,1	0,0	5 290,3		

9	ГАПОУ ЛО "Сосновоборский политехнический колледж"	от 15.02.2022 №229 (доп. соглашение от 23.11.2022 № 229/1)	28 310,0	28 310,0	0,0	0,0		
10	ГАПОУ ЛО "Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева"	от 13.05.2022 №456	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0		
11	ГБПОУ ЛО "Мичуринский многопрофильный техникум"	от 01.06.2022 №493	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0		
Итого по соглашениям			167 427,8	162 137,6	0,0	5 290,3		

**Реестр контрактов (договоров), заключенных в 2020 – 2022 годах ГБПОУ
ЛО «ВМТ» и его правопреемниками в целях проведения ремонтных работ,
в рамках СИЦ о предоставлении из областного бюджета Ленинградской области
субсидий государственным бюджетным и государственным автономным
учреждениям Ленинградской области на иные цели**

(тыс. руб.)

№ п/п	Контрагент	Контракт (договор)			
		Дата	Номер	Сумма	Предмет
1	2	3	4	5	6
Соглашение № 223					
1	ИП Булкин В.М.	17.02.2020	08/20	342,8	Ремонт коридора
2	ИП Булкин В.М.	03.03.2020	09/20	50,0	Ремонт кабинета № 107
3	ИП Кудрявцев С.А.	08.06.2020	17/06-20	236,6	Изготовление и установка оконных блоков
4	ИП Булкин В.М.	17.06.2020	13/20	597,8	Ремонт слесарной мастерской
5	ООО «ЭНКОМ»	18.06.2020	5513	1 998,7	Текущему ремонту кровли
6	ИП Булкин В.М.	09.07.2020	15/20	30,0	Ремонт теплового узла
7	ИП Кудрявцев С.А.	21.07.2020	25/07-20	12,8	Изготовление и установка оконного блока
8	ООО «ГЕРМЕС»	27.07.2020	85222	1 451,4	Ремонт фасада здания
9	ИП Булкин В.М.	30.07.2020	17/20	345,0	Ремонт полов
10	ИП Булкин В.М.	30.07.2020	16/20	267,2	Ремонт коридора
11	ООО «РемДом»	09.11.2020	51	277,4	Ремонт кабинета № 25
12	ИП Важник С.В.	10.11.2020	22-20	86,9	Замена оконных блоков
13	ИП Булкин В.М.	11.11.2020	19/20	392,2	Устройство подвесного потолка
14	ИП Булкин В.М.	23.11.2020	20/20	158,0	Замена оконных блоков
15	ИП Булкин В.М.	10.12.2020	21/20	380,9	Устройство подвесного потолка
16	ООО «РемДом»	15.12.2020	56	268,2	Ремонт кабинета № 11
17	ООО «РемДом»	22.12.2020	60	323,3	Ремонт кабинетов № 13,14
18	ИП Куликов А.Я.	25.12.2020	б/н	170,1	Ремонт карнизной части здания
	Итого по Соглашению № 223			7 389,3	
Соглашение № 187					
19	ИП Тишкин А.Л.	20.03.2020	2003/20	292,2	Ремонт помещений 1-204,1-116
20	ИП Тишкин А.Л.	10.06.2020	10	56,8	Ремонт входного крыльца
21	ИП Тишкин А.Л.	10.07.2020	1007/20	6 180,6	Ремонт столовой
22	ИП Тишкин А.Л.	03.08.2020	15	598,8	Устройство подвесного потолка
23	ИП Тишкин А.Л.	14.08.2020	18	471,6	Ремонт электрики, установка жалюзи и стеклянной перегородки
	Итого по Соглашению № 187			7 600,0	
Соглашение № 479					
24	ИП Тишкин А.Л.	10.11.2020	25	306,8	Покраска забора, ворот и калитки
25	ИП Тишкин А.Л.	24.11.2020	26	239,2	Ремонт 2-х комнат в общежитии
	Итого по Соглашению № 479			546,0	
Соглашение № 509					
26	ИП Тишкин А.Л.	04.12.2020	28	387,7	Ремонт комнат изолятора и санузла
	Итого по Соглашению № 509			387,7	
Соглашение № 325					
27	ООО «РемДом»	08.07.2020	15786-20LO	92,7	Ремонт кровли галереи учебного корпуса
28	ИП Бирюлин В.И.	15.07.2020	16295-20LO	599,8	Ремонт с установкой элементов (стоек) в помещении гардероба
29	ИП Тишкин А.Л.	21.07.2020	16552-20LO	599,2	Ремонт мужского туалета
30	ООО «РемДом»	30.07.2020	17059-20LO	379,9	Работы по смене розлива центрального отопления
31	ИП Куликов А.Я.	31.07.2020	ЭА-2524/20	1 990,0	Работы по асфальтированию

					прилегающей территории
32	ИП Салтанова В.В.	05.08.2020	17488-20LO	76,0	Установка элементов (стоек) в помещении гардероба
33	ООО «РемДом»	11.08.2020	17599-20LO	521,0	Ремонт фасада здания
34	ООО «Интерьер»	20.08.2020	18220-20LO	29,5	Монтаж стойки поста охраны
35	ИП Важник С.В.	24.08.2020	ЭА-2750/20	522,2	Ремонт в аудитории № 102
36	ИП Орлова Е.Б.	24.08.2020	ЭА-2862/20	1 675,3	Замена деревянных окон, изготовление и установка новых оконных блоков-стеклопакетов ПВХ
37	ООО «Александра»	13.10.2020	21335-20LO	36,8	Поставка и монтаж жалюзи
Итого по Соглашению № 325				6 522,4	Остаток 263,3
Соглашение № 70					
38	ИП Тишкин А.Л.	20.02.2020	2	591,7	Ремонт полов слесарно-механической мастерской
39	ИП Паляева Е.Ю.	20.02.2020	21	573,6	Ремонт стен, установке дверей слесарного кабинета
40	ИП Тишкин А.Л.	21.02.2020	5	522,6	Ремонт сантехники и электрики слесарного кабинета
41	ИП Паляева Е.Ю.	21.02.2020	22	569,3	Ремонт перегородки и замене окон слесарного кабинета
42	ООО «Александра»	03.06.2020	12688	142,8	Замена оконных блоков в учебной аудитории № 108 и установка светозащитных жалюзи в учебных аудиториях № 131 и № 134
Итого по Соглашению № 70				2 400,0	
Соглашение № 205 (доступная среда)					
43	ИП Корнийчук И.В.	22.06.2020	14819-20LO	440,7	Ремонт общего коммуникационного пространства
44	ИП Бирюлин В.И.	22.06.2020	14813-20LO	569,9	Ремонт входной группы и коммуникационных путей тамбура
45	ООО «СтройКомплект»	22.06.2020	14825-20LO	390,0	Монтаж и пусконаладка вертикальной подъемной платформы для инвалидов
46	ИП Петров К.И.	25.06.2020	25/06/20	32,3	Поставка ленты тактильной напольной
47	ИП «Гадиров Вячеслав Атрафович КФХ»	09.07.2020	15934-20LO	506,9	Планирование стоянок автотранспорта для инвалидов и маломобильных групп населения на территории
48	ИП Тишкин А.Л.	10.07.2020	ЭА-3/2020	1 419,0	Ремонт аудиторий № 134-135
49	ИП Тишкин А.Л.	23.07.2020	16693-20LO	599,2	Ремонт туалета для инвалидов
50	ООО «Экспресс Контракт»	05.08.2020	17480-20LO	42,0	Поставка парт с закругленными краями
Итого по Соглашению № 205				4 000,0	
Соглашение № 395 (доступная среда)					
51	ООО «РемДом»	24.06.2021	43971	488,82	Ремонтные работы в ауд. № 15
52	ИП Петров К.И.	06.07.2021	06.07.2021	84,80	Поставка товаров
53	ООО «РемДом»	20.07.2021	45236	570,88	Ремонтные работы в ауд. № 103
54	ООО «РемДом»	20.07.2021	45253	568,56	Ремонтные работы в ауд. № 104
55	ИП Петров К.И.	22.07.2021	22.07.2021	116,37	Поставка товаров
56	ИП Бирюлин В.И.	10.08.2021	46129	477,46	Ремонт коридора общежития
57	ИП Корнийчук И.В.	10.08.2021	46131	446,19	Ремонт стен общежития
58	ИП Салтанова В.В.	11.08.2021	46130	246,93	Ремонт зоны целевого назначения
Итого по Соглашению № 395				3 000,00	
Соглашение № 447					
59	ООО «РемДом»	25.06.2021	44128	560,62	Частичный ремонт фасадов
60	ИП Касьянов А.Н.	26.07.2021	5004	1 700,04	Ремонт столовой
61	ИП Соцкова Т.А.	10.08.2021	21000113	9 974,68	Ремонт актового зала

62	ООО «Левша»	20.09.2021	47503	4 822,75	Ремонт фонтана
63	ИП Касьянов А.Н.	21.09.2021	47965	196,61	Ремонт столовой
64	ООО «ВСП «Электроком»	26.04.2022	64152	53,37	Прокладка кабеля
65	ООО «ЦСП»	19.05.2022	66476	357,64	Подключение фонтана
Итого по Соглашению № 447				17 665,71	
Соглашение № 235					
66	ООО «Александра»	11.04.2022	62722	218,30	Замена составного оконного блока
67	ООО «Левша»	13.05.2022	65422	392,24	Пуско-наладочные работы
68	ООО «РемДом»	13.05.2022	65468	92,42	Ремонт аудитории
69	ООО «Александра»	17.05.2022	66011	590,00	Замена оконных блоков
70	ООО «ЦСЭ»	19.05.2022	66476	8,04	Подключение фонтана
71	ООО «ВСП «Электроком»	23.05.2022	66568	266,48	Замена электрощитовой
72	ООО «РемДом»	23.05.2022	66994	599,11	Ремонт системы ЦО
73	ООО «ВСП «Электроком»	23.05.2022	66971	166,61	Замена сети электроснабжения
74	ООО «ВСП «Электроком»	23.05.2022	66990	74,85	Реконструкция вводо-распределительного устройства
75	ООО «ВСП «Электроком»	03.06.2022	68394	354,50	Ремонт осветительной сети
76	ИП Бирюлин В.И.	07.06.2022	68866	248,20	Ремонт кабинета директора
77	ИП Гадиров В.А. КФХ	09.06.2022	70619-22LO	585,00	Устройство водостока
78	ИП Гадиров В.А. КФХ	13.06.2022	70794-22LO	599,00	Устройство покрытия из брусчатки
79	ИП Важник С.В.	22.06.2022	ЭА-2646/22	1 961,53	Ремонт кровли учебного корпуса
80	ООО «РемДом»	24.06.2022	70112	523,48	Ремонт фасада
81	ООО «РемДом»	24.06.2022	ЭА-2711/22	2 935,82	Ремонт кровли учебного корпуса
82	ООО «РемДом»	27.06.2022	ЭА-2733/22	1 174,34	Ремонт кровли учебного корпуса
83	ООО «Александра»	27.06.2022	70115	594,60	Замена оконных блоков
84	ООО «Александра»	27.06.2022	70114	212,39	Замена оконных блоков
85	ИП Тишкина А.В.	28.06.2022	70166	598,77	Ремонт учебных аудиторий
86	ИП Тишкина А.В.	28.06.2022	70165	597,32	Ремонт тренажерного зала
87	ИП Салтанова В.В.	30.06.2022	70437	468,80	Замена дверных блоков
88	ООО «Александра»	30.06.2022	70540	163,04	Замена оконных блоков
89	ИП Куликов М.Г.	30.06.2022	70133	598,94	Санитарная рубка деревьев
90	ООО «ЛенИнфоСервис»	30.06.2022	079/22	66,98	Монтаж системы пропускного режима
91	ИП Корнийчук И.В.	30.06.2022	70435	459,48	Ремонт стен
92	ИП Бирюлин В.И.	30.06.2022	70541	599,08	Ремонт коридора
93	ООО «РемДом»	30.06.2022	71091	500,74	Ремонт трубопроводов
Итого по Соглашению № 235				15 650,05	
Всего:				65 424,46	

2020 год:

Договоры - 44

Контракты - 6

2021 год:

Договоры - 10

Контракты - 3

2022 год:

Договоры - 26

Контракты – 3

Всего: **92**

Договор № 66476 указан дважды в связи с оплатой по двум соглашениям.

Договоры заключенные без проведения торгов в 2020 - 2021 годах в нарушение требований об участии юридических лиц в реализации основного мероприятия 6.3 «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» подпрограммы «Развитие профессионального образования» государственной программы Ленинградской области

«Современное образование Ленинградской области» и в 2022 году в нарушение абзаца второго раздела «Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры системы профессионального образования» государственной программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»:

2020 год – 44 договора на сумму – 14 130,40 тыс. руб. (пункты 1-4, 6, 7, 9-20, 22-30, 32-35, 37-47, 49 и 50 таблицы);

2021 год – 1 договор на сумму – 560,62 тыс. руб. (пункт 59 таблицы);

2022 год – 26 договоров на сумму – 9 989,38 тыс. руб. (пункты 64 – 78, 80 и 83 – 93 таблицы). Договор № 47965 (пункт 63 таблицы) не включен, в связи с тем, что изначально был заключен и оплачивался за счет средств по приносящей доход деятельности.

Заказчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Волховский многопрофильный техникум" (ИНН 4702002101)

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Важник Сергей Васильевич (ИНН 471800276703)

НМЦК к контракту: Государственный контракт от 22.06.2022 №ЭА-2646/22

Стройка: Текущий ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО "ВМТ", расположенный по адресу: г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13

НМЦК: Локальная смета №7 Текущий ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО "ВМТ", расположенный по адресу: г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13

Ведомость № 1

пересчета начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК) по локальной смете № 7

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТЕР-46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100М2	-6,86	162,36		-1281	Инд РЦЦС 04/2022		-37386	
			Заработная плата рабочих			137,04	1,15	-1081		30,932	-33441	
			Эксплуатация машин			25,32	1,15	-200		19,749	-3945	
			в т.ч. заработная плата машинистов							30,932		
			Материальные ресурсы							11,925		
			Накладные расходы от ФОТ			84%		-908	110%	110%	-36785	
			Сметная прибыль от ФОТ			48%		-519	70%	70%	-23409	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,38		1,15					
			Итого по расценке					-2708			-97580	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1952	
			Итого без НДС								-99532	
			Компенсация НДС			20%					-19906,40	
			Итого								-119438,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-119438,40	
2		ТЕР-46-04-008-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100м2 покрытия	6,86	254,23		1744	Инд_ЛО2014_04_2022		23171	
			Заработная плата рабочих			212,68	1	1459		14,68	21418	
			Эксплуатация машин			41,55	1	285		6,15	1753	
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68		

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материальные ресурсы							1		
			Накладные расходы от ФОТ			0%			91%	91%	19490	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			52%	52%	11137	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,38		1					
			Итого по расценке					1744			53798	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					1076	
			Итого без НДС								54874	
			Компенсация НДС			20%					10974,80	
			Итого								65848,80	
			Всего с коэффициентом снижения			1					65848,80	
3	2	ТЕРр-58-01-003-01	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М	-0,272	194,58		-61	Инд РЦЦС 04/2022		-1882	
			Заработная плата рабочих			194,41	1,15	-61		30,932	-1881	
			Эксплуатация машин			0,17	1,15			19,749	-1	
			в т.ч. заработная плата машинистов							30,932		
			Материальные ресурсы							11,925		
			Накладные расходы от ФОТ			71%		-43	83%	83%	-1561	
			Сметная прибыль от ФОТ			52%		-32	65%	65%	-1223	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,4		1,15					
			Итого по расценке					-136			-4666	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-93	
			Итого без НДС								-4759	
			Компенсация НДС			20%					-951,80	
			Итого								-5710,80	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-5710,80	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100м труб и покрытий	0,272	134,8		37	Инд_ЛО2014_04_2022		538	
			Заработная плата рабочих			134,59	1	37		14,68	538	
			Эксплуатация машин			0,21	1			8,21		
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68		
			Материальные ресурсы							1		
			Накладные расходы от ФОТ			0%			90%	90%	484	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			46%	46%	247	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,1		1					
			Итого по расценке					37			1269	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					25	
			Итого без НДС								1294	
			Компенсация НДС			20%					258,80	
			Итого								1552,80	
			Всего с коэффициентом снижения			1					1552,80	
5	3	ТЕР-12-01-004-01 МДС 81-36 п.3.3.1д K=0,7	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)	100М	-0,75	321,55		-277	Инд РЦЦС 04/2022		-7575	
			Заработная плата рабочих			310,69	0,805	-187		30,932	-5802	
			Эксплуатация машин			148,67	0,805	-90		19,749	-1773	
			в т.ч. заработная плата машинистов			5,17	0,805	-3		30,932	-97	
			Материальные ресурсы			187,68				11,925		
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-175	120%	120%	-7079	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-84	65%	65%	-3834	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,1		0,81					
			Итого по расценке					-536			-18488	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-370	
			Итого без НДС								-18858	
			Компенсация НДС			20%					-3771,60	
			Итого								-22629,60	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-22629,60	
6		ТЕР-12-01-004-01 МС РФ 519\пр от 4.09.19 п8.2 тб2 п1 Козп=0,8; Кзм=0,8; Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б конструкций)	100м примыканий	0,75	516,85		388	Инд_ЛО2014_04_2022		4792	
			Зарботная плата рабочих			454,4	0,8	273		14,68	4002	
			Эксплуатация машин			191,66	0,8	115		6,87	790	
			в т.ч. зарботная плата машинистов			5,89	0,8	4		14,68	52	
			Материальные ресурсы			4108,48				9,44		
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	3977	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	1964	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,1		0,8					
			Итого по расценке					388			10733	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					215	
			Итого без НДС								10948	
			Компенсация НДС			20%					2189,60	
			Итого								13137,60	
			Всего с коэффициентом снижения			1					13137,60	
7	4	ТЕРр-58-01-003-01	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М	-0,52	194,58		-116	Инд РЦЦС 04/2022		-3598	
			Зарботная плата рабочих			194,41	1,15	-116		30,932	-3596	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин			0,17	1,15			19,749	-2	
			в т.ч. заработная плата машинистов							30,932		
			Материальные ресурсы							11,925		
			Накладные расходы от ФОТ			71%		-82	83%	83%	-2985	
			Сметная прибыль от ФОТ			52%		-60	65%	65%	-2337	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,4		1,15					
			Итого по расценке					-258			-8920	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-178	
			Итого без НДС								-9098	
			Компенсация НДС			20%					-1819,60	
			Итого								-10917,60	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-10917,60	
8		ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100м труб и покрытий	0,52	134,8		70	Инд_ЛО2014_04_2022		1028	
			Заработная плата рабочих			134,59	1	70		14,68	1027	
			Эксплуатация машин			0,21	1			8,21	1	
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68		
			Материальные ресурсы							1		
			Накладные расходы от ФОТ			0%			90%	90%	924	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			46%	46%	472	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,1		1					
			Итого по расценке					70			2424	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					48	
			Итого без НДС								2472	
			Компенсация НДС			20%					494,40	
			Итого								2966,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					2966,40	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	5	ТЕР-12-01-015-04	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	-6,86	479,48		-1221	Инд РЦЦС 04/2022		-35226	Расход ресурса (Праймер), не учтенного нормой ТЕР-12-01-015-04, завышены в 5 раз к нормативному
			Заработная плата рабочих			125,95	1,15	-994		30,932	-30734	
			Эксплуатация машин			28,83	1,15	-227		19,749	-4492	
			в т.ч. заработная плата машинистов			1,34	1,15	-11		30,932	-327	
			Материальные ресурсы			324,7				11,925		
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-925	120%	120%	-37273	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-442	65%	65%	-20190	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,51		1,15					
			Итого по расценке					-2588			-92689	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1854	
			Итого без НДС								-94543	
			Компенсация НДС			20%					-18908,60	
			Итого								-113451,60	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-113451,60	
10	6	Поставщик	Праймер	л	-1560	364		-567840			-567840	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-11357	
			Итого без НДС								-579197	
			Компенсация НДС			20%					-115839,40	
			Итого								-695036,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-695036,40	
11		ТЕР-12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100м2 кровли	6,86	282,54		1938	Инд_ЛО2014_04_2022		21257	
			Заработная плата рабочих			46,4	1	318		14,68	4673	
			Эксплуатация машин			4,8	1	33		6,76	223	
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68		

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материальные ресурсы			231,34	1	1587		10,31	16361	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	4584	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	2264	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,8		1					
			Итого по расценке					1938			28105	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					562	
			Итого без НДС								28667	
			Компенсация НДС			20%					5733,40	
			Итого								34400,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					34400,40	
12	7	ТЕР-12-01-017-01 СИ №5 2009	УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ: ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	-1,3	1298,94		-1771	Инд РЦЦС 04/2022		-30400	
			Заработная плата рабочих			287,44	1,038	-388		30,932	-11996	
			Эксплуатация машин			163,22	1,15	-244		19,749	-4819	
			в т.ч. заработная плата машинистов			26,92	1,15	-40		30,932	-1245	
			Материальные ресурсы			599,38	1,462	-1139		11,925	-13585	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-394	120%	120%	-15889	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-188	65%	65%	-8607	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,22		1,15					
			Итого по расценке					-2353			-54896	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1098	
			Итого без НДС								-55994	
			Компенсация НДС			20%					-11198,80	
			Итого								-67192,80	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-67192,80	
13		ТЕР-12-01-017-01	УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ: ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100м2 СТЯЖКИ	1,3	1433,35		1863	Инд_ЛО2014_04_2022		24518	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заработная плата рабочих			445,59	1	579		14,68	8504	
			Эксплуатация машин			217,14	1	282		8,04	2270	
			в т.ч. заработная плата машинистов			39,69	1	52		14,68	757	
			Материальные ресурсы			770,62	1	1002		13,72	13744	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	9085	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	4487	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,22		1					
			Итого по расценке					1863			38090	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					762	
			Итого без НДС								38852	
			Компенсация НДС			20%					7770,40	
			Итого								46622,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					46622,40	
14	8	ТЕР-12-01-001-06 СИ 7 2002г.	УСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (Нижний слой)	100M2	-6,86	231,27		-1724	Инд РЦЦС 04/2022		-38987	Норма ТЕР-12-01-001-06 предназначенная для применения на скатных кровлях не соответствует фактическому состоянию кровли учебного корпуса ВМТ. Согласно пункту 3.3.2.24 национального стандарта ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020 "Здания и сооружения. Общие термины" скатные крыши должны иметь уклон больше 10 градусов, тогда как крыша учебного корпуса ВМТ имеет уклон 1 градус, то есть она является плоской (п. 3.3.2.23 ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020).
			Заработная плата рабочих			115,37	1,15	-910		30,932	-28152	
			Эксплуатация машин			18,29	1,15	-144		19,749	-2850	
			в т.ч. заработная плата машинистов			2,31	1,15	-18		30,932	-564	
			Материальные ресурсы			97,61	1	-670		11,925	-7985	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-854	120%	120%	-34459	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-408	65%	65%	-18665	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,12		1,15					
			Итого по расценке					-2986			-92111	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1842	
			Итого без НДС								-93953	
			Компенсация НДС			20%					-18790,60	
			Итого								-112743,60	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с коэффициентом снижения			1					-112743,60	
15	9	Поставщик	ИЗОПЛАСТ ХПП-3	M2	-790,3	310		-244993			-244993	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-4900	
			Итого без НДС								-249893	
			Компенсация НДС			20%					-49978,60	
			Итого								-299871,60	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-299871,60	
16	10	ТЕР-12-01-001-06 СИ 7 2002г.	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (верхний слой)	100M2	-6,86	231,27		-1724	Инд РЦЦС 04/2022		-38987	
			Заработная плата рабочих			115,37	1,15	-910		30,932	-28152	
			Эксплуатация машин			18,29	1,15	-144		19,749	-2850	
			в т.ч. заработная плата машинистов			2,31	1,15	-18		30,932	-564	
			Материальные ресурсы			97,61	1	-670		11,925	-7985	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-854	120%	120%	-34459	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-408	65%	65%	-18665	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,12		1,15					
			Итого по расценке					-2986			-92111	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1842	
			Итого без НДС								-93953	
			Компенсация НДС			20%					-18790,60	
			Итого								-112743,60	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-112743,60	
17	11	Поставщик	ИЗОПЛАСТ ЭКП-5	M2	-823,2	420		-345744			-345744	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-6915	
			Итого без НДС								-352659	
			Компенсация НДС			20%					-70531,80	
			Итого								-423190,80	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с коэффициентом снижения			1					-423190,80	
18		ТЕР-12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	100м2 кровли	6,86	9026,5		61922	Инд_ЛО2014_04_2022		419802	
			Зарботная плата рабочих			256,04	1	1756		14,68	25784	
			Эксплуатация машин			48,02	1	329		6,35	2092	
			в т.ч. зарботная плата машинистов			4,91	1	34		14,68	494	
			Материальные ресурсы			8722,44	1	59837		6,55	391926	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	25779	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	12732	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,36		1					
			Итого по расценке					61922			458313	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					9166	
			Итого без НДС								467479	
			Компенсация НДС			20%					93495,80	
			Итого								560974,80	
			Всего с коэффициентом снижения			1					560974,80	
19	12	ТЕР-12-01-016-02	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ	100М2	-0,38	269,7		-16	Инд РЦЦС 04/2022		-469	
			Зарботная плата рабочих			32,96	1,15	-15		30,932	-445	
			Эксплуатация машин			2,74	1,15	-1		19,749	-24	
			в т.ч. зарботная плата машинистов			0,46	1,15			30,932	-6	
			Материальные ресурсы			234				11,925		
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-14	120%	120%	-541	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-7	65%	65%	-293	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,8		1,15					
			Итого по расценке					-37			-1303	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-26	Расход ресурса (Грунтовка), не учтенного нормой ТЕР-12-01-016-02 не соответствует нормативному, а цена ресурса завышена в 2 раза.
			Итого без НДС								-1329	
			Компенсация НДС			20%					-265,80	
			Итого								-1594,80	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-1594,80	
20	13	Поставщик	Грунтовка	Л	-15,2	300		-4560			-4560	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-91	
			Итого без НДС								-4651	
			Компенсация НДС			20%					-930,20	
			Итого								-5581,20	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-5581,20	
21		ТЕР-12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100м2 кровли	0,38	282,54		107	Инд_ЛО2014_04_2022		1178	
			Заработная плата рабочих			46,4	1	18		14,68	259	
			Эксплуатация машин			4,8	1	2		6,76	12	
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68		
			Материальные ресурсы			231,34	1	87		10,31	907	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	254	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	125	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,8		1					
			Итого по расценке					107			1557	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					31	
			Итого без НДС								1588	
			Компенсация НДС			20%					317,60	
			Итого								1905,60	
			Всего с коэффициентом снижения			1					1905,60	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	14	ТЕР-15-02-036-03	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТЕН (Парапеты)	100М2	-0,38	4251,78		-1738	Инд РЦЦС 04/2022		-38307	Расход ресурса (ЦПС), не учтенного нормой ТЕР-15-02-036-03 не соответствует нормативному, а цена ресурса завышена в 4 раза.
			Заработная плата рабочих			2095,86	1,15	-916		30,932	-28330	
			Эксплуатация машин			50,54	1,15	-22		19,749	-436	
			в т.ч. заработная плата машинистов			22,11	1,15	-10		30,932	-299	
			Материальные ресурсы			4550,88	0,463	-800		11,925	-9541	
			Накладные расходы от ФОТ			80%		-741	105%	105%	-30060	
			Сметная прибыль от ФОТ			37%		-343	55%	55%	-15746	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	161,88		1,15					
			Итого по расценке					-2822			-84113	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1682	
			Итого без НДС								-85795	
			Компенсация НДС			20%					-17159,00	
			Итого								-102954,00	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-102954,00	
23	15	Поставщик	ЦПС	КГ	-2002	25		-50050			-50050	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1001	
			Итого без НДС								-51051	
			Компенсация НДС			20%					-10210,20	
			Итого								-61261,20	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-61261,20	
24		ТЕР-15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (парапеты)	100м2 оштукатуриваемой п	0,38	6461,75		2455	Инд_ЛО2014_04_2022		41150	
			Заработная плата рабочих			2262,43	1	860		14,68	12621	
			Эксплуатация машин			68,79	1	26		8,78	230	
			в т.ч. заработная плата машинистов			34,44	1	13		14,68	192	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Материальные ресурсы			4130,53	1	1569		18,03	28299	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			100%*0,9	90%	11532	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			49%*0,85	41.65%	5337	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	129,95		1					
			Итого по расценке					2455			58019	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					1160	
			Итого без НДС								59179	
			Компенсация НДС			20%					11835,80	
			Итого								71014,80	
			Всего с коэффициентом снижения			1					71014,80	
25	16	ТЕР-12-01-004-04 СИ 7 2002г.	УСТРОИСТВО ПРИМЫКАНИИ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	100М	-0,75	882,49		-719	Инд РЦЦС 04/2022		-16106	
			Заработная плата рабочих			422,59	1,15	-364		30,932	-11274	
			Эксплуатация машин			88,86	1,15	-77		19,749	-1514	
			в т.ч. заработная плата машинистов			12,94	1,15	-11		30,932	-345	
			Материальные ресурсы			371,04	1	-278		11,925	-3318	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-345	120%	120%	-13943	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-165	65%	65%	-7552	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,5		1,15					
			Итого по расценке					-1229			-37601	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-752	
			Итого без НДС								-38353	
			Компенсация НДС			20%					-7670,60	
			Итого								-46023,60	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-46023,60	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффици. пересчета	Коэффициен ты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	17	Поставщик	ИЗОПЛАСТ ХПП-3	М2	-90,78	310		-28142			-28142	Расход ресурсов (Изопласт ХПП-3 и ЭКП-5), не учтенных нормой ТЕР-12-01-004-04, не соответствует нормативному, а цены ресурсов завышены в 1,5 раза.
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-563	
			Итого без НДС								-28705	
			Компенсация НДС			20%					-5741,00	
			Итого								-34446,00	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-34446,00	
27	18	Поставщик	ИЗОПЛАСТ ЭКП-5	М2	-98,22	420		-41252			-41252	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-825	
			Итого без НДС								-42077	
			Компенсация НДС			20%					-8415,40	
			Итого								-50492,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-50492,40	
28		ТЕР-12-01-004-04	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	100м примыкани й	0,75	11295,89		8472	Инд_ЛО2014_04_2022		57850	
			Заработная плата рабочих			618,06	1	464		14,68	6805	
			Эксплуатация машин			109,3	1	82		7,73	634	
			в т.ч. заработная плата машинистов			17,42	1	13		14,68	192	
			Материальные ресурсы			10568,53	1	7926		6,36	50411	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	6864	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	3390	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,5		1					
			Итого по расценке					8472			68104	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					1362	
			Итого без НДС								69466	
			Компенсация НДС			20%					13893,20	
			Итого								83359,20	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с коэффициентом снижения			1					83359,20	
29	19	ТЕР-12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	-0,934	1419,46		-1494	Инд РЦЦС 04/2022		-42031	
			Заработная плата рабочих			1175,98	1,15	-1263		30,932	-39070	
			Эксплуатация машин			24,68	1,15	-27		19,749	-524	
			в т.ч. заработная плата машинистов			3,97	1,15	-4		30,932	-132	
			Материальные ресурсы			218,8	1	-204		11,925	-2437	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-1166	120%	120%	-47042	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-557	65%	65%	-25481	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,75		1,15					
			Итого по расценке					-3217			-114554	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-2291	
			Итого без НДС								-116845	
			Компенсация НДС			20%					-23369,00	
			Итого								-140214,00	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-140214,00	
30	20	Поставщик	Карнизные свесы, парапеты, отливы из оцинкованной стали	мп	-213	680		-144840			-144840	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-2897	
			Итого без НДС								-147737	
			Компенсация НДС			20%					-29547,40	
			Итого								-177284,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-177284,40	
31		ТЕР-12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100м2 покрытия	0,934	9626,82		8991	Инд_ЛО2014_04_2022		94436	
			Заработная плата рабочих			1823,17	1	1703		14,68	24998	

Примененный ресурс (Карнизные свесы, парапеты, отливы из оцинкованной стали) не соответствует норме ТЕР-12-01-010-01, согласно которой изготовление картин из оцинкованной стали учтено нормой расценки, а в качестве неучтенного материала применяется сталь оцинкованная.

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин			28,18	1	26		8,68	228	
			в т.ч. заработная плата машинистов			4,91	1	5		14,68	67	
			Материальные ресурсы			7775,47	1	7262		9,53	69210	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		1571	120%*0,9	108%	27070	
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		752	65%*0,85	55,25%	13848	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,75		1					
			Итого по расценке					11314			135354	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					2707	
			Итого без НДС								138061	
			Компенсация НДС			20%					27612,20	
			Итого								165673,20	
			Всего с коэффициентом снижения			1					165673,20	
32	21	Поставщик	Работа крана для подачи материалов на кровлю (30000 : 19.749)	маш/см	-9	34498,54		-15722	Инд РЦЦС 04/2022	11,925	-310487	Применение данного ресурса для учета подъема материалов на кровлю противоречит Общим указаниям сборника ТЕР-12. Согласно п. 1.3. Технической части общих указаний ТЕР-12 (РЦЦС) расценками сборника предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте более 15 м нормы затрат труда и оплату труда рабочих следует увеличивать на 0,5 процента на каждый последующий метр высоты. Фактическая отметка кровли, согласно техническому паспорту здания, 9,95м.
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-6210	
			Итого без НДС								-316697	
			Компенсация НДС			20%					-63339,40	
			Итого								-380036,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-380036,40	
33	22	ТЕРр-69-01-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (Основание кровли)	100Т	-0,058	1898,88		-127	Инд РЦЦС 04/2022		-3918	
			Зарботная плата рабочих			1898,88	1,15	-127		30,932	-3918	
			Эксплуатация машин							19,749		
			в т.ч. заработная плата машинистов							30,932		
			Материальные ресурсы							11,925		
			Накладные расходы от ФОТ			66%		-84	78%	78%	-3056	
			Сметная прибыль от ФОТ			40%		-51	50%	50%	-1959	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	214,32		1,15					
			Итого по расценке					-262			-8933	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-179	
			Итого без НДС								-9112	
			Компенсация НДС			20%					-1822,40	
			Итого								-10934,40	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-10934,40	
34		ТЕРр-69-09-001	Очистка помещений от строительного мусора	100т мусора	0,058	2946,9		171	Инд_ЛО2014_04_2022		2509	
			Заработная плата рабочих			2946,9	1	171		14,68	2509	
			Эксплуатация машин							1		
			в т.ч. заработная плата машинистов							1		
			Материальные ресурсы							1		
			Накладные расходы от ФОТ			0%			92%	92%	2308	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			44%	44%	1104	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	214,32		1					
			Итого по расценке					171			5921	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					118	
			Итого без НДС								6039	
			Компенсация НДС			20%					1207,80	
			Итого								7246,80	
			Всего с коэффициентом снижения			1					7246,80	
35	23	СПГ-01-27-00П	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ - ПОГРУЗКА	Т	-5,8	180,7	1	-34	Инд РЦЦС 04/2022	30,932	-1048	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			100%	100%	-1048	
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			60%	60%	-628,8	
			Итого с НР и СП								-2725	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-55	
			Итого без НДС								-2780	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Компенсация НДС			20%					-556,00	
			Итого								-3336,00	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-3336,00	
36		СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т груза	5,8	907,96		359	Инд ЦИНИНС 10/2015	14,68	5266	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					105	
			Итого без НДС								5371	
			Компенсация НДС			20%					1074,20	
			Итого								6445,20	
			Всего с коэффициентом снижения			1					6445,20	
37	24	СПГ-01-10-01С	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА	т	-5,8	351,57		-103	Инд РЦЦС 04/2022	19,749	-2039	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-41	
			Итого без НДС								-2080	
			Компенсация НДС			20%					-416,00	
			Итого								-2496,00	
			Всего с коэффициентом снижения			1					-2496,00	
38		СПГ-03-21-001-10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т груза	5,8	92,19		87	Инд ЦИНИНС 10/2015	6,15	535	
			Непредвиденные работы и затраты			2%					11	
			Итого без НДС								546	
			Компенсация НДС			20%					109,20	
			Итого								655,20	
			Всего с коэффициентом снижения			1					655,20	

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	Пояснения пересчета
п/п	по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Общие нарушения по ценообразованию при расчете НМЦК:

В нарушении части 1 статьи 8.3 главы 2.1 Градостроительного кодекса РФ, а также пунктов 2.1 и 2.3 приказа Комитета по строительству ЛО от 20.10.2015 №28 "О переходе на территориальную сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2014 года на территории Ленинградской области" сметная стоимость ремонтных работ и соответственно их приемка и оплата определены с применением сметно-нормативной базы Регионального центра ценообразования строительства (КЦЦС) г. Санкт-Петербург, не включенной в федеральный реестр сметных нормативов.

Кроме того, сметная стоимость ремонтных работ и соответственно их приемка и оплата определены с учетом стесненных условий в застроенной части населенных пунктов на основании пункта 5 таблицы 1 приложения 2 приказа Минстроя России от 09.02.2017 №81/пр.

Вместе с тем, согласно примечанию 3 к приложению 2 стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных ниже факторов:

1. Интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ;
2. Разветвленные сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске;
3. Расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;
4. Стесненные условия или невозможность складирования материалов;
5. Ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.

К условиям ремонта кровли ВМТ можно рассмотреть применение только одного из пяти факторов, фактор №3.

Таким образом сметно-нормативную базу необходимо заменить на базу ЦИНИНС, включенную в федеральные реестр сметных нормативов приказом Минстроя РФ от 09.09.2015 №648/пр, а стесненные условия в застроенной части населенных пунктов исключить.

Итого завышение НМЦК по Текущему ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО "ВМТ", расположенный по адресу: г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13	-1 937 778,00р.
---	------------------------

Главный инспектор инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области
(квалификационный сертификат от 08.02.2018 №ВК-01096/18 специалиста высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования; квалификационный аттестат от 25.10.2019 XIX-ОСТ №0000438 специалиста по строительно-технической экспертизе)



В. Великов

Заказчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Волховский многопрофильный техникум" (ИНН 4702002101)

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Важник Сергей Васильевич (ИНН 471800276703)

Договор подряда: Государственный контракт от 22.06.2022 №ЭА-2646/22

Стройка: Текущий ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО "ВМТ", расположенный по адресу: г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13

Основание: Локальная смета №7 Текущий ремонт кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО "ВМТ", расположенный по адресу: г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13

Ведомость № 2

Расчет завышения стоимости работ и затрат по Акту КС-2 от 18.07.2022 №1

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	ТЕР-46-04-008-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	-6,86	162,36		-1281	Инд РЦЦС 04/2022		-37386
			Заработная плата рабочих			137,04	1,15	-1081		30,932	-33441
			Эксплуатация машин			25,32	1,15	-200		19,749	-3945
			в т.ч. заработная плата машинистов							30,932	
			Материальные ресурсы							11,925	
			Накладные расходы от ФОТ			84%		-908	110%	110%	-36785
			Сметная прибыль от ФОТ			48%		-519	70%	70%	-23409
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,38		1,15				
			Итого по расценке					-2708			-97580
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1952
			Итого без НДС								-99532
			Компенсация НДС			20%					-19906,40
			Итого								-119438,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-71065,84
2		ТЕР-46-04-008-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100м2 покрытия	6,86	254,23		1744	Инд_ЛО2014_04_2022		23171
			Заработная плата рабочих			212,68	1	1459		14,68	21418
			Эксплуатация машин			41,55	1	285		6,15	1753
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68	
			Материальные ресурсы							1	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			91%	91%	19490

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			52%	52%	11137
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,38		1				
			Итого по расценке					1744			53798
			Непредвиденные работы и затраты			2%					1076
			Итого без НДС								54874
			Компенсация НДС			20%					10974,80
			Итого								65848,80
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					39180,03
3	2	ТЕРр-58-01-003-01	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М	-0,272	194,58		-61	Инд РЦЦС 04/2022		-1882
			Заработная плата рабочих			194,41	1,15	-61		30,932	-1881
			Эксплуатация машин			0,17	1,15			19,749	-1
			в т.ч. заработная плата машинистов							30,932	
			Материальные ресурсы							11,925	
			Накладные расходы от ФОТ			71%		-43	83%	83%	-1561
			Сметная прибыль от ФОТ			52%		-32	65%	65%	-1223
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,4		1,15				
			Итого по расценке					-136			-4666
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-93
			Итого без НДС								-4759
			Компенсация НДС			20%					-951,80
			Итого								-5710,80
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-3397,93
4		ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100м труб и покрытий	0,272	134,8		37	Инд_ЛО2014_04_2022		538
			Заработная плата рабочих			134,59	1	37		14,68	538
			Эксплуатация машин			0,21	1			8,21	
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68	
			Материальные ресурсы							1	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			90%	90%	484
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			46%	46%	247

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,1		1				
			Итого по расценке					37			1269
			Непредвиденные работы и затраты			2%					25
			Итого без НДС								1294
			Компенсация НДС			20%					258,80
			Итого								1552,80
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					923,92
5	3	ТЕР-12-01-004-01 МДС 81-36 п.3.3.1д К=0,7	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИИ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ)	100М	-0,75	321,55		-277	Инд РЦЦС 04/2022		-7575
			Заработная плата рабочих			310,69	0,805	-187		30,932	-5802
			Эксплуатация машин			148,67	0,805	-90		19,749	-1773
			в т.ч. заработная плата машинистов			5,17	0,805	-3		30,932	-97
			Материальные ресурсы			187,68				11,925	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-175	120%	120%	-7079
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-84	65%	65%	-3834
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,1		0,81				
			Итого по расценке					-536			-18488
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-370
			Итого без НДС								-18858
			Компенсация НДС			20%					-3771,60
			Итого								-22629,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-13464,61
6		ТЕР-12-01-004-01 МС РФ 519/пн от 4.09.19 п8.2 тб2 п1 Козп=0,8; Кэм=0,8; Кмат=0	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИИ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ (ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) (демонтаж (разборка) сборных бетонных и ж/б конструкций)	100м примыканий	0,75	516,85		388	Инд_ЛО2014_04_2022		4792
			Заработная плата рабочих			454,4	0,8	273		14,68	4002
			Эксплуатация машин			191,66	0,8	115		6,87	790

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. заработная плата машинистов			5,89	0,8	4		14,68	52
			Материальные ресурсы			4108,48				9,44	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	3977
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	1964
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,1		0,8				
			Итого по расценке					388			10733
			Непредвиденные работы и затраты			2%					215
			Итого без НДС								10948
			Компенсация НДС			20%					2189,60
			Итого								13137,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					7816,87
7	4	ТЕРр-58-01-003-01	РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ: ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	100М	-0,52	194,58		-116	Инд РЦЦС 04/2022		-3598
			Заработная плата рабочих			194,41	1,15	-116		30,932	-3596
			Эксплуатация машин			0,17	1,15			19,749	-2
			в т.ч. заработная плата машинистов							30,932	
			Материальные ресурсы							11,925	
			Накладные расходы от ФОТ			71%		-82	83%	83%	-2985
			Сметная прибыль от ФОТ			52%		-60	65%	65%	-2337
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	20,4		1,15				
			Итого по расценке					-258			-8920
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-178
			Итого без НДС								-9098
			Компенсация НДС			20%					-1819,60
			Итого								-10917,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-6495,97
8		ТЕРр-58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100м труб и покрытий	0,52	134,8		70	Инд_ЛО2014_04_2022		1028
			Заработная плата рабочих			134,59	1	70		14,68	1027
			Эксплуатация машин			0,21	1			8,21	1

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68	
			Материальные ресурсы							1	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			90%	90%	924
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			46%	46%	472
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,1		1				
			Итого по расценке					70			2424
			Непредвиденные работы и затраты			2%					48
			Итого без НДС								2472
			Компенсация НДС			20%					494,40
			Итого								2966,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					1765,01
9	5	ТЕР-12-01-015-04	УСТРОИСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100M2	-6,86	479,48		-1221	Инд РЦЦС 04/2022		-35226
			Зарботная плата рабочих			125,95	1,15	-994		30,932	-30734
			Эксплуатация машин			28,83	1,15	-227		19,749	-4492
			в т.ч. заработная плата машинистов			1,34	1,15	-11		30,932	-327
			Материальные ресурсы			324,7				11,925	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-925	120%	120%	-37273
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-442	65%	65%	-20190
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,51		1,15				
			Итого по расценке					-2588			-92689
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1854
			Итого без НДС								-94543
			Компенсация НДС			20%					-18908,60
			Итого								-113451,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-67503,70
10	6	Поставщик	Праймер	л	-1560	364		-567840			-567840
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-11357
			Итого без НДС								-579197

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Компенсация НДС			20%					-115839,40
			Итого								-695036,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-413546,63
11		ТЕР-12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100м2 кровли	6,86	282,54		1938	Инд_ЛО2014_04_2022		21257
			Зарботная плата рабочих			46,4	1	318		14,68	4673
			Эксплуатация машин			4,8	1	33		6,76	223
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68	
			Материальные ресурсы			231,34	1	1587		10,31	16361
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	4584
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	2264
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,8		1				
			Итого по расценке					1938			28105
			Непредвиденные работы и затраты			2%					562
			Итого без НДС								28667
			Компенсация НДС			20%					5733,40
			Итого								34400,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					20468,24
12	7	ТЕР-12-01-017-01 СИ N5 2009	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ: ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	-1,3	1298,94		-1771	Инд РЦЦС 04/2022		-30400
			Зарботная плата рабочих			287,44	1,038	-388		30,932	-11996
			Эксплуатация машин			163,22	1,15	-244		19,749	-4819
			в т.ч. заработная плата машинистов			26,92	1,15	-40		30,932	-1245
			Материальные ресурсы			599,38	1,462	-1139		11,925	-13585
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-394	120%	120%	-15889
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-188	65%	65%	-8607
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,22		1,15				
			Итого по расценке					-2353			-54896
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1098
			Итого без НДС								-55994

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Компенсация НДС			20%					-11198,80
			Итого								-67192,80
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-39979,71
13		ТЕР-12-01-017-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ: ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100м2 стяжки	1,3	1433,35		1863	Инд_ЛО2014_04_2022		24518
			Зарботная плата рабочих			445,59	1	579		14,68	8504
			Эксплуатация машин			217,14	1	282		8,04	2270
			в т.ч. зарботная плата машинистов			39,69	1	52		14,68	757
			Материальные ресурсы			770,62	1	1002		13,72	13744
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	9085
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	4487
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,22		1				
			Итого по расценке					1863			38090
			Непредвиденные работы и затраты			2%					762
			Итого без НДС								38852
			Компенсация НДС			20%					7770,40
			Итого								46622,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					27740,33
14	8	ТЕР-12-01-001-06 СИ 7 2002г.	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (Нижний слой)	100М2	-6,86	231,27		-1724	Инд РЦЦС 04/2022		-38987
			Зарботная плата рабочих			115,37	1,15	-910		30,932	-28152
			Эксплуатация машин			18,29	1,15	-144		19,749	-2850
			в т.ч. зарботная плата машинистов			2,31	1,15	-18		30,932	-564
			Материальные ресурсы			97,61	1	-670		11,925	-7985
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-854	120%	120%	-34459
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-408	65%	65%	-18665
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,12		1,15				
			Итого по расценке					-2986			-92111
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1842
			Итого без НДС								-93953

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Компенсация НДС			20%					-18790,60
			Итого								-112743,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-67082,44
15	9	Поставщик	ИЗОПЛАСТ ХПП-3	M2	-790,3	310		-244993			-244993
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-4900
			Итого без НДС								-249893
			Компенсация НДС			20%					-49978,60
			Итого								-299871,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-178423,59
16	10	ТЕР-12-01-001-06 СИ 7 2002г.	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОДИН СЛОЙ (верхний слой)	100M2	-6,86	231,27		-1724	Инд РЦЦС 04/2022		-38987
			Заработная плата рабочих			115,37	1,15	-910		30,932	-28152
			Эксплуатация машин			18,29	1,15	-144		19,749	-2850
			в т.ч. заработная плата машинистов			2,31	1,15	-18		30,932	-564
			Материальные ресурсы			97,61	1	-670		11,925	-7985
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-854	120%	120%	-34459
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-408	65%	65%	-18665
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,12		1,15				
			Итого по расценке					-2986			-92111
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1842
			Итого без НДС								-93953
			Компенсация НДС			20%					-18790,60
			Итого								-112743,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-67082,44
17	11	Поставщик	ИЗОПЛАСТ ЭКП-5	M2	-823,2	420		-345744			-345744
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-6915
			Итого без НДС								-352659
			Компенсация НДС			20%					-70531,80
			Итого								-423190,80

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-251798,51
18		ТЕР-12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100м2 кровли	6,86	9026,5		61922	Инд_ЛО2014_04_2022		419802
			Заработная плата рабочих			256,04	1	1756		14,68	25784
			Эксплуатация машин			48,02	1	329		6,35	2092
			в т.ч. заработная плата машинистов			4,91	1	34		14,68	494
			Материальные ресурсы			8722,44	1	59837		6,55	391926
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	25779
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	12732
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,36		1				
			Итого по расценке					61922			458313
			Непредвиденные работы и затраты			2%					9166
			Итого без НДС								467479
			Компенсация НДС			20%					93495,80
			Итого								560974,80
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					333779,98
19	12	ТЕР-12-01-016-02	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР ГОТОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ БИТУМНОЙ	100М2	-0,38	269,7		-16	Инд РЦЦС 04/2022		-469
			Заработная плата рабочих			32,96	1,15	-15		30,932	-445
			Эксплуатация машин			2,74	1,15	-1		19,749	-24
			в т.ч. заработная плата машинистов			0,46	1,15			30,932	-6
			Материальные ресурсы			234				11,925	
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-14	120%	120%	-541
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-7	65%	65%	-293
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,8		1,15				
			Итого по расценке					-37			-1303
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-26
			Итого без НДС								-1329
			Компенсация НДС			20%					-265,80
			Итого								-1594,80

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-948,91
20	13	Поставщик	Грунтовка	л	-15,2	300		-4560			-4560
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-91
			Итого без НДС								-4651
			Компенсация НДС			20%					-930,20
			Итого								-5581,20
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-3320,81
21		ТЕР-12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100м2 кровли	0,38	282,54		107	Инд_ЛО2014_04_2022		1178
			Заработная плата рабочих			46,4	1	18		14,68	259
			Эксплуатация машин			4,8	1	2		6,76	12
			в т.ч. заработная плата машинистов							14,68	
			Материальные ресурсы			231,34	1	87		10,31	907
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98.1%	254
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48.45%	125
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,8		1				
			Итого по расценке					107			1557
			Непредвиденные работы и затраты			2%					31
			Итого без НДС								1588
			Компенсация НДС			20%					317,60
			Итого								1905,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					1133,83
22	14	ТЕР-15-02-036-03	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТЕН (Парапеты)	100М2	-0,38	4251,78		-1738	Инд РЦЦС 04/2022		-38307
			Заработная плата рабочих			2095,86	1,15	-916		30,932	-28330
			Эксплуатация машин			50,54	1,15	-22		19,749	-436
			в т.ч. заработная плата машинистов			22,11	1,15	-10		30,932	-299
			Материальные ресурсы			4550,88	0,463	-800		11,925	-9541
			Накладные расходы от ФОТ			80%		-741	105%	105%	-30060
			Сметная прибыль от ФОТ			37%		-343	55%	55%	-15746

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	161,88		1,15				
			Итого по расценке					-2822			-84113
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1682
			Итого без НДС								-85795
			Компенсация НДС			20%					-17159,00
			Итого								-102954,00
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-61257,63
23	15	Поставщик	ЦПС	КГ	-2002	25		-50050			-50050
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-1001
			Итого без НДС								-51051
			Компенсация НДС			20%					-10210,20
			Итого								-61261,20
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-36450,41
24		ТЕР-15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (парапеты)	100м2 штукатуриваемой поверхности	0,38	6461,75		2455	Инд_ЛО2014_04_2022		41150
			Заработная плата рабочих			2262,43	1	860		14,68	12621
			Эксплуатация машин			68,79	1	26		8,78	230
			в т.ч. заработная плата машинистов			34,44	1	13		14,68	192
			Материальные ресурсы			4130,53	1	1569		18,03	28299
			Накладные расходы от ФОТ			0%			100%*0,9	90%	11532
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			49%*0,85	41.65%	5337
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	129,95		1				
			Итого по расценке					2455			58019
			Непредвиденные работы и затраты			2%					1160
			Итого без НДС								59179
			Компенсация НДС			20%					11835,80
			Итого								71014,80
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					42253,80

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	16	ТЕР-12-01-004-04 СИ 7 2002г.	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	100М	-0,75	882,49		-719	Инд РЦЦС 04/2022		-16106
			Зарботная плата рабочих			422,59	1,15	-364		30,932	-11274
			Эксплуатация машин			88,86	1,15	-77		19,749	-1514
			в т.ч. зарботная плата машинистов			12,94	1,15	-11		30,932	-345
			Материальные ресурсы			371,04	1	-278		11,925	-3318
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-345	120%	120%	-13943
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-165	65%	65%	-7552
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,5		1,15				
			Итого по расценке					-1229			-37601
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-752
			Итого без НДС								-38353
			Компенсация НДС			20%					-7670,60
			Итого								-46023,60
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-27384,04
26	17	Поставщик	ИЗОПЛАСТ ХПП-3	М2	-90,78	310		-28142			-28142
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-563
			Итого без НДС								-28705
			Компенсация НДС			20%					-5741,00
			Итого								-34446,00
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-20495,37
27	18	Поставщик	ИЗОПЛАСТ ЭКП-5	М2	-98,22	420		-41252			-41252
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-825
			Итого без НДС								-42077
			Компенсация НДС			20%					-8415,40
			Итого								-50492,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-30042,98

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		ТЕР-12-01-004-04	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	100м примыканий	0,75	11295,89		8472	Инд_ЛО2014_04_2022		57850
			Зарботная плата рабочих			618,06	1	464		14,68	6805
			Эксплуатация машин			109,3	1	82		7,73	634
			в т.ч. зарботная плата машинистов			17,42	1	13		14,68	192
			Материальные ресурсы			10568,53	1	7926		6,36	50411
			Накладные расходы от ФОТ			0%			109%*0,9	98,1%	6864
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			57%*0,85	48,45%	3390
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	35,5		1				
			Итого по расценке					8472			68104
			Непредвиденные работы и затраты			2%					1362
			Итого без НДС								69466
			Компенсация НДС			20%					13893,20
			Итого								83359,20
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					49598,72
29	19	ТЕР-12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	-0,934	1419,46		-1494	Инд РЦЦС 04/2022		-42031
			Зарботная плата рабочих			1175,98	1,15	-1263		30,932	-39070
			Эксплуатация машин			24,68	1,15	-27		19,749	-524
			в т.ч. зарботная плата машинистов			3,97	1,15	-4		30,932	-132
			Материальные ресурсы			218,8	1	-204		11,925	-2437
			Накладные расходы от ФОТ			92%		-1166	120%	120%	-47042
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		-557	65%	65%	-25481
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,75		1,15				
			Итого по расценке					-3217			-114554
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-2291
			Итого без НДС								-116845
			Компенсация НДС			20%					-23369,00

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого								-140214,00
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-83427,32
30	20	Поставщик	Карнизные свесы, парапеты, отливы из оцинкованной стали	мп	-213	680		-144840			-144840
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-2897
			Итого без НДС								-147737
			Компенсация НДС			20%					-29547,40
			Итого								-177284,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-105484,21
31		ТЕР-12-01-010-01	УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИИ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100м2 покрытия	0,934	9626,82		8991	Инд_ЛО2014_04_2022		94436
			Заработная плата рабочих			1823,17	1	1703		14,68	24998
			Эксплуатация машин			28,18	1	26		8,68	228
			в т.ч. заработная плата машинистов			4,91	1	5		14,68	67
			Материальные ресурсы			7775,47	1	7262		9,53	69210
			Накладные расходы от ФОТ			92%		1571	120%*0,9	108%	27070
			Сметная прибыль от ФОТ			44%		752	65%*0,85	55,25%	13848
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	112,75		1				
			Итого по расценке					11314			135354
			Непредвиденные работы и затраты			2%					2707
			Итого без НДС								138061
			Компенсация НДС			20%					27612,20
			Итого								165673,20
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					98575,55
32	21	Поставщик	Работа крана для подачи материалов на кровлю (30000 : 19.749)	маш/см	-9	34498,54		-15722	Инд РЦЦС 04/2022	11,925	-310487
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-6210
			Итого без НДС								-316697
			Компенсация НДС			20%					-63339,40

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого								-380036,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-226121,64
33	22	ТЕРр-69-01-009-01	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИИ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (Основание кровли)	100Т	-0,058	1898,88		-127	Инд РЦЦС 04/2022		-3918
			Зарботная плата рабочих			1898,88	1,15	-127		30,932	-3918
			Эксплуатация машин							19,749	
			в т.ч. зарботная плата машинистов							30,932	
			Материальные ресурсы							11,925	
			Накладные расходы от ФОТ			66%		-84	78%	78%	-3056
			Сметная прибыль от ФОТ			40%		-51	50%	50%	-1959
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	214,32		1,15				
			Итого по расценке					-262			-8933
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-179
			Итого без НДС								-9112
			Компенсация НДС			20%					-1822,40
			Итого								-10934,40
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-6505,97
34		ТЕРр-69-09-001	Очистка помещений от строительного мусора	100т мусора	0,058	2946,9		171	Инд_ЛО2014_04_2022		2509
			Зарботная плата рабочих			2946,9	1	171		14,68	2509
			Эксплуатация машин							1	
			в т.ч. зарботная плата машинистов							1	
			Материальные ресурсы							1	
			Накладные расходы от ФОТ			0%			92%	92%	2308
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			44%	44%	1104
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	214,32		1				
			Итого по расценке					171			5921
			Непредвиденные работы и затраты			2%					118
			Итого без НДС								6039
			Компенсация НДС			20%					1207,80

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого								7246,80
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					4311,85
35	23	СПГ-01-27-00П	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ -ПОГРУЗКА	т	-5,8	180,7	1	-34	Инд РЦЦС 04/2022	30,932	-1048
			Накладные расходы от ФОТ			0%			100%	100%	-1048
			Сметная прибыль от ФОТ			0%			60%	60%	-628,8
			Итого с НР и СП								-2725
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-55
			Итого без НДС								-2780
			Компенсация НДС			20%					-556,00
			Итого								-3336,00
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-1984,92
36		СПГ-01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т груза	5,8	907,96		359	Инд ЦИНИНС 10/2015	14,68	5266
			Непредвиденные работы и затраты			2%					105
			Итого без НДС								5371
			Компенсация НДС			20%					1074,20
			Итого								6445,20
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					3834,89
37	24	СПГ-01-10-01С	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ) - ГРУЗ 1 КЛАССА	т	-5,8	351,57		-103	Инд РЦЦС 04/2022	19,749	-2039
			Непредвиденные работы и затраты			2%					-41
			Итого без НДС								-2080
			Компенсация НДС			20%					-416,00
			Итого								-2496,00
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					-1485,12
38		СПГ-03-21-001-10	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т груза	5,8	92,19		87	Инд ЦИНИНС 10/2015	6,15	535
			Непредвиденные работы и затраты			2%					11

Номер		Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэффиц. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах
п/п	по Акту										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого без НДС								546
			Компенсация НДС			20%					109,20
			Итого								655,20
			Всего с коэффициентом снижения			0,59499995866					389,84

Итого завышение фактической стоимости работ и затрат по Текущему ремонту кровли учебного корпуса ГБПОУ ЛО "ВМТ", расположенный по адресу: г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13	-1 152 977,84р.
---	------------------------

Главный инспектор инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты Ленинградской области

(квалификационный сертификат от 08.02.2018 №ВК-01096/18 специалиста высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования; квалификационный аттестат от 25.10.2019

ХИХ-ОСТ №0000438 специалиста по строительно-технической экспертизе)

В. Великов



Разночтения в описании целей и(или) задач и предмета проверки в документах, регулирующих проведение Комитетом проверок деятельности ГАБУ СПО ЛО, в 2020-2023 гг.

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
1.	от 30.12.2019 № 2812-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на 2020 год»	1.1. ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»	февраль 2020	Предмет: - обеспечение соответствия основным и иным видам деятельности целям, предусмотренным уставом; - осуществление работы с жалобами потребителей и принятие мер по результатам рассмотрения жалоб потребителей (далее – работа с потребителями); - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	от 26.02.2020 № 398-р Задачи: - Обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции; - обеспечение условий, порядка и результатов оказания государственных услуг; - осуществление контроля качества и безопасности медицинской деятельности организации	27.02-26.03.2020, акт № 01 от 08.04.2020 Цели: - проверка качества предоставляемых государственных услуг; - проверка качества выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; - рассмотрение нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации Задачи: - проверка качества предоставляемых государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции; - проверка качества нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации организации
		1.2. ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопро-	октябрь 2020	Предмет: - обеспечение соответствия основным и иным видам деятельности целям, предусмотренным уставом; - осуществление работы с	от 29.10.2020 № 1821-р Задачи: - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг;	30.10-27.11.2020, акт № 03 от 26.11.2020 Цели: - обеспечение соответствия основным и иным видам деятельности

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
		фильный техникум»		потребителями; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	- соблюдение законодательства о противодействии коррупции; - обеспечение условий, порядка и результатов оказания государственных услуг; - осуществление контроля качества и безопасности медицинской деятельности организации	целям, предусмотренным уставом; - осуществление работы с потребителями; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции Задачи: - проверка качества предоставляемых государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции
2.	от 26.11.2020 № 1967-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на 2021 год»	2.1. ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнический техникум»	апрель 2021	Цель: - оценка выполнения показателей объема и качества государственных услуг; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	от 29.04.2021 № 1198-р Задачи: - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции; - обеспечение условий, порядка и результатов оказания государственных услуг; - осуществление контроля качества и безопасности медицинской деятельности организации	30.04 – 04.06.2021 акт № 10-2021 от 04.06.2021 Задачи: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции
		2.2. ГБПОУ ЛО	май 2021	Цель: - оценка выполнения показателей	от 31.05.2021 № 1536-р Задачи:	31.05-28.06.2021 акт № 11-2021 от 24.06.2021

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
3.	от 29.11.2021	«Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского»		объема и качества государственных услуг; - проверка качества государственных услуг (выполнения работ) Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	- обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции; - обеспечение условий, порядка и результатов оказания государственных услуг; - осуществление контроля качества и безопасности медицинской деятельности организации	Задачи: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - осуществление работы с потребителями; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции
		2.3. ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»	июнь 2021	Цель: - оценка выполнения показателей объема и качества государственных услуг; - проверка качества государственных услуг (выполнения работ) Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	от 14.05.2021 № 1296-р Задачи: - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции; - обеспечение условий, порядка и результатов оказания государственных услуг; - осуществление контроля качества и безопасности медицинской деятельности организации	01.06-28.06.2021 акт № 10-2021 от 28.06.2021 Задачи: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции
	от 29.11.2021	3.1. ГБПОУ	сентябрь	Цель:	от 15.08.2022 № 1583-р	Проверка не проводилась

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
	№ 3101-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на 2022 год»	ЛО «Лодейнопольский техникум промышленных технологий»	2022	- оценка результатов деятельности учреждения; - оценка выполнения показателей объема и качества государственных услуг; - проверка качества государственных услуг (выполнения работ) Предмет: - Обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	Задачи: - документальное и фактическое изучение операций с использованием средств субсидий из областного бюджета Ленинградской области на иные цели в 2022 году; - контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидий на иные цели; - оценка достижения результатов предоставления субсидий; - осуществление контроля за исполнением действующего законодательства	
		3.2. ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»	15.08.2022	Цель: - оценка результатов деятельности учреждения; - оценка выполнения показателей объема и качества государственных услуг; - проверка качества государственных услуг (выполнения работ); - установление наличия и состояния государственного имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению государственного имущества, оценка эффективности использования	от 11.08.2022 № 1560-р Задачи: - изучение операций с использованием средств субсидий на иные цели в 2022 году; - контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидий на иные цели; - оценка достижения результатов предоставления субсидий на иные цели; - осуществление контроля за исполнением действующего законодательства	15.08-08.09.2022 акт № 10-2022 от 09.08.2022 Задачи: - изучение операций с использованием средств субсидий на иные цели в 2022 году; - контроль за соблюдением целей и условий предоставления субсидий на иные цели; - оценка достижения результатов предоставления субсидий на иные цели, установленных порядком предоставления субсидий

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
				государственного имущества, выявление нарушений законодательства, содержащего нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности государственного имущества Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение плана ФХД; - выполнение условий выделения, получения и использования субсидий; - исполнение гражданско-правовых договоров; - представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции		
4.	от 05.12.2022 № 2386-р «Об утверждении плана ведомственного контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных организаций Ленинградской области,	4.1. ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум»	июль 2023	Цель: - оценка результатов деятельности ведомственных учреждений; - оценка выполнения показателей объема и качества государственных услуг; - проверка качества государственных услуг (выполнения работ) Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом;	от 26.07.2023 № 1860-р Цель: - оценка результатов деятельности учреждения; - выявление отклонений в деятельности; - оказание платных услуг (выполнения работ), не предусмотренных уставами; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). Задачи:	проверка в настоящее время не окончена

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
	подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, на 2023 год»			- выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	- осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - выявление нарушений и причин их возникновения в деятельности по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за образовательным учреждением. Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение условий выделения, получения и использования субсидий; - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); - работа с потребителями; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	
		4.2. ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»	июль 2023	Цель: - оценка результатов деятельности подведомственных учреждений; - оценка выполнения показателей; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) Предмет: - обеспечение соответствия	от 11.07.2023 № 1763-р Цель: - оценка результатов деятельности подведомственных учреждений; - выявление отклонений в деятельности; - оказание платных услуг (выполнения работ), не предусмотренных уставами) и	12.07-08.08.2023 акт № 09-2023 от 11.08.2023 Цель: - выявление отклонений в деятельности; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполнения работ) Задачи:

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
				основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции	разработки рекомендаций по их устранению; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - выявление нарушений и причин их возникновения в деятельности образовательного учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за учреждением. Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение условий выделения, получения и использования субсидий; - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); - работа с потребителями; соблюдение действующего законодательства о противодействии коррупции.	- осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся; - выявление нарушений и причин их возникновения в деятельности по обеспечению условий содержания и образования обучающихся; - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за учреждением
5.	от 12.09.2022	5.1. ГАПОУ	июнь 2023	Цель:	от 14.06.2023 № 1535-р	26.06-20.07.2023

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
	№ 1738-р «Об утверждении плана контроля за деятельностью государственных автономных организаций Ленинградской области, подведомственных комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, и созданных на базе имущества, находящегося в собственности, на 2023 год»	ЛО «Лужский агропромышленный техникум»		- оценка результатов деятельности учреждения, в том числе финансовой деятельности; - анализ соответствия объемов и(или) качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию Предмет: - соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом; - осуществление учреждением предусмотренных уставом основных видов деятельности; - выполнение плана ФХД; - обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества; - предоставление достоверного и полного отчета о результатах деятельности и об использовании имущества; - соблюдение и исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности; - соответствие порядков и процедур предоставления государственных услуг (исполнения функций) соответствующим административным	Цель: - оценка результатов деятельности подведомственных учреждений; - выявление отклонений в деятельности; - проверка результатов оказания платных услуг (выполнения работ) учреждением, не предусмотренных уставами) и разработки рекомендаций по их устранению; - проверка качества государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - выявление нарушений и причин их возникновения в деятельности образовательного учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за образовательным учреждением. Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение условий выделения, получения и использования субсидий; - обеспечение состава, качества и	Акт № 04-2023 от 28.07.2023 Цель: - оценка результатов деятельности учреждения; - выявление отклонений в деятельности учреждения (соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности) при невыполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности; - проверка результатов оказания платных услуг (выполнения работ) учреждением, не предусмотренных уставами; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся; - выявление нарушений и причин их возникновения в деятельности учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся; - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за учреждением

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
				регламентам	(или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); - работа с потребителями; соблюдение законодательства о противодействии коррупции.	
		5.2. ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»	июнь 2023	Цель: - оценка результатов деятельности учреждения, в том числе финансовой деятельности; - анализ соответствия объемов и(или) качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию Предмет: - Соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом; - осуществление учреждением предусмотренных уставом основных видов деятельности; - выполнение плана ФХД; - обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества; - предоставление достоверного и полного отчета о результатах деятельности и об использовании имущества; - соблюдение и исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов	от 01.06.2023 № 1427-р Цель: - оценка результатов деятельности подведомственных учреждений; - выявление отклонений в деятельности; - проверка результатов оказания платных услуг (выполнения работ) учреждением, не предусмотренных уставами) и разработки рекомендаций по их устранению; - проверка качества государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - выявление нарушений и причин их возникновения в деятельности образовательного учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за образовательным учреждением.	06.06-02.07.2023 акт № 05-2023 от 04.07.2023 Цель: - оценка результатов деятельности учреждения; - выявление отклонений в деятельности учреждения (соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности) при невыполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности; - проверка результатов оказания платных услуг (выполнения работ) учреждением, не предусмотренных уставами; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся; - выявление нарушений и причин их

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
				Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности; - соответствие порядков и процедур предоставления государственных услуг (исполнения функций) соответствующим административным регламентам	Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение условий выделения, получения и использования субсидий; - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); - работа с потребителями; соблюдение законодательства о противодействии коррупции.	возникновения в деятельности учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся; - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за учреждением
		5.3. ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный техникум»	июль 2023	Цель: - оценка результатов деятельности учреждения, в том числе финансовой деятельности; - анализ соответствия объемов и(или) качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию Предмет: - соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом; - осуществление учреждением предусмотренных уставом основных видов деятельности; - выполнение плана ФХД; - обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества; - предоставление достоверного и	от 12.07.2023 № 1773-р Цель: - оценка результатов деятельности подведомственных учреждений; - выявление отклонений в деятельности; - проверка результатов оказания платных услуг (выполнения работ) учреждением, не предусмотренных уставами) и разработки рекомендаций по их устранению; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - выявление нарушений и причин их	12.07-15.08.2023 акт № 01-2023 от 16.08.2023 Цель: - оценка результатов деятельности учреждения; - оценка показателей объема и качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) Задачи: - обеспечение соответствия основных (не являющихся основными) видов деятельности автономного учреждения целям, предусмотренным учредительными документами; - выполнение плана ФХД; - обеспечение состава, качества и объема (содержания) государственных услуг;

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
				полного отчета о результатах деятельности и об использовании имущества; - соблюдение и исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности; - соответствие порядков и процедур предоставления государственных услуг (исполнения функций) соответствующим административным регламентам	возникновения в деятельности образовательного учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за образовательным учреждением. Предмет: - обеспечение соответствия основных (иных, не являющихся основными) видов деятельности автономного учреждения целям, предусмотренными учредительными документами; - выполнение условий выделения, получения и использования субсидий; - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); - работа с потребителями; - соблюдение действующего законодательства о противодействии коррупции.	- соблюдение законодательства о противодействии коррупции
		5.4. ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум	июнь 2023	Цель: - оценка результатов деятельности учреждения, в том числе финансовой деятельности; - анализ соответствия объемов и(или) качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию Предмет:	от 16.06.2023 № 1570-р Цель: - оценка результатов деятельности подведомственных учреждений; - выявление отклонений в деятельности; - проверка результатов оказания платных услуг (выполнения работ) учреждением, не предусмотренных	27.07-28.07.2023 акт № 02-2023 от 31.07.2023 - соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества;

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
		им. Е.И. Лебедева»		- соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом; - осуществление учреждением предусмотренных уставом основных видов деятельности; - выполнение плана ФХД; - обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества; - предоставление достоверного и полного отчета о результатах деятельности и об использовании имущества; - соблюдение и исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности; - соответствие порядков и процедур предоставления государственных услуг (исполнения функций) соответствующим административным регламентам	уставами) и разработки рекомендаций по их устранению; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - выявление нарушений и причин их возникновения в деятельности учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за образовательным учреждением. Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение условий выделения, получения и использования субсидий; - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания) оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); - работа с потребителями; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции.	- предоставление достоверного и полного отчета о результатах деятельности и об использовании имущества; - соблюдение и исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности; - соответствие порядков и процедур предоставления государственных услуг (исполнения функций) соответствующим административным регламентам
		5.5. ГАПОУ ЛО	июнь 2023	Цель: - оценка результатов деятельности	от 02.06.2023 № 1432-р Цель:	14.06-11.07.2023 Акт № 03-2023 от 12.07.2023

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
		«Сосновоборский политехнический колледж»		учреждения, в том числе финансовой деятельности; - анализ соответствия объемов и(или) качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) государственному заданию Предмет: - соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом; - осуществление учреждением предусмотренных уставом основных видов деятельности; - выполнение плана ФХД; - обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества; - предоставление достоверного и полного отчета о результатах деятельности и об использовании имущества; - соблюдение и исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности; - соответствие порядков и процедур предоставления государственных услуг (исполнения функций) соответствующим административным регламентам	- оценка результатов деятельности подведомственных учреждений; - выявление отклонений в деятельности; - проверка результатов оказания платных услуг (выполнения работ) учреждением, не предусмотренных уставами) и разработки рекомендаций по их устранению; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - осуществление контроля за деятельностью учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - выявление нарушений и причин их возникновения в деятельности учреждения по обеспечению условий содержания и образования обучающихся. - осуществление контроля за имуществом, закрепленным за учреждением Предмет: - обеспечение соответствия основных и иных видов деятельности целям, предусмотренным уставом; - выполнение условий выделения, получения и использования субсидий; - обеспечение состава, качества и (или) объема (содержания)	Цель: - оценка результатов деятельности учреждения; - выявление отклонений в деятельности учреждения (соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов деятельности) при невыполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности; - проверка результатов оказания платных услуг (выполнения работ) учреждением, не предусмотренных уставами) и разработки рекомендаций по их устранению; - проверка качества предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ). Задачи: - соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом; - выполнение плана ФХД; - обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества; - предоставление достоверного и полного отчета о результатах деятельности и об использовании имущества; - соблюдение и исполнение

№ п/п	Наименование и реквизиты распоряжения Комитета об утверждении плана контроля	Наименование государственного учреждения	Запланированная дата начала проведения проверки (месяц)	Цели, задачи, предмет контроля согласно плану	Реквизиты распоряжения Комитета о проведении плановой проверки, задачи и(или) предмет проверки (согласно распоряжению)	Цели и(или) задачи проверки (согласно акту проверки)
					оказываемых государственных услуг (выполняемых работ); - работа с потребителями; - соблюдение законодательства о противодействии коррупции.	нормативных правовых актов Российской Федерации Ленинградской области, регулирующих деятельность учреждений в соответствующей сфере деятельности; - соответствие порядков и процедур предоставления государственных услуг (исполнения функций) соответствующим административным регламентам
