




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14.
тел. (812) 579-82-70, тел./факс (812) 579-82-72
e-mail: ksplo@ksplo.ru



Председателю
Законодательного собрания
Ленинградской области

С.М. Бебенину

Уважаемый Сергей Михайлович!

Контрольно-счетная палата Ленинградской области в соответствии с п.10 ч.1. ст. 9 областного закона от 14.10.2011 №77-оз «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области» направляет заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг использования бюджетных средств, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета Ленинградской области за 2016 год и 9 месяцев 2017 года (на выборочной основе)», проведенного на основании п. 27 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26 декабря 2016 года №65 (с изменениями от 19.12.2017).


Приложение: заключение на 84 листах с приложениями №1 и №2 в 1 экз., всего на 90 листах.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

Суванишвили,
Ляхова - М.А. Ляхова

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М.А. Ляхова
« 26 » декабря 2017 года

Заключение

по результатам мониторинга использования бюджетных средств, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета Ленинградской области за 2016 год и 9 месяцев 2017 года (на выборочной основе)

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

1. Пункт 27 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 26.12.2016 №65;
2. Распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 10.05.2017 №10-р.

Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия

Мониторинг использования средств областного бюджета, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета Ленинградской области за 2016 год и 9 месяцев 2017 года (на выборочной основе), далее по тексту – «АИП».

Объекты экспертно-аналитического мероприятия

1. Главные распорядители бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области (в рамках реализации АИП на 2016 и на 2017 годы);
2. Получатели бюджетных средств областного бюджета Ленинградской области.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

С.В. Гнилицкий

1. Общая информация об итогах реализации адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета за 2016 год и 9 месяцев 2017 года

1.1. Информация об итогах реализации адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета за 2016 год

В соответствии с областным законом от 23.12.2015 №139-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции закона от 26.12.2016) на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы на 2016 год утверждено бюджетных назначений в сумме 10 493 102,0 тыс. руб. (130,8% от первоначально утвержденного объема и 113,5% к уровню предыдущего года).

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ), без внесения изменений в областной закон от 23.12.2015 №139-оз, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись (на основании уведомления комитета финансов Ленинградской области от 26.12.2016 №8272) были уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 248 946,2 тыс. руб.

В результате, на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы в 2016 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 10 244 155,8 тыс. руб., в том числе:

- 10 150 980,8 тыс. руб. – на реализацию мероприятий капитального характера в рамках государственных программ Ленинградской области (программная часть) и 93 175,0 тыс. руб. – на непрограммную часть (на проектирование объектов социального назначения).

Мероприятия АИП за счет средств областного бюджета в 2016 году были исполнены (профинансированы) на сумму 6 989 870,9 тыс. руб. (68,2% от уточненного плана), в том числе по программной части – на сумму 6 911 102,4 тыс. руб. (68,1%), непрограммной – на сумму 78 768,5 тыс. руб. (84,5%).

Относительно предшествующего периода (2015 год) уровень исполнения АИП в 2016 году в целом снизился на 8,9% (в 2015 году исполнение АИП составляло 6 956 319,0 тыс. руб. или 77,1% от плановых назначений).

Представленная в Контрольно-счетную палату Ленинградской области комитетом финансов Ленинградской области информация о ходе исполнения АИП за счет средств областного бюджета Ленинградской области (исх. от 20.01.2017 №19-06/1) сведений о фактических объемах выполненных в рамках программы работ, не содержала.

В 2016 году структура АИП была сформирована на основе 11 государственных программ Ленинградской области и непрограммной части.

В состав программной части АИП вошли объекты проектирования, строительства и реконструкции, предусмотренные государственными программами Ленинградской области в соответствии с их целями и задачами; в состав непрограммной части – проектно-изыскательские работы по объектам социального назначения.

В таблице приложения №1 приведена информация об исполнении АИП, финансируемой за счет средств областного бюджета за период 2015 год – 9 месяцев 2017 года, в разрезе каждой из подпрограмм государственных программ Ленинградской области.

В таблице №1 представлены данные о плановых и фактических показателях реализации мероприятий АИП, по итогам ее исполнения (финансирования) за 2016 год в целом, в разрезе государственных программ Ленинградской области и непрограммной части АИП.


Таблица №1, тыс. руб.

| № п/п | Наименование государственной программы | План на 2016 год | Факт 2016 год | Отношение план/факт, % | Удельный вес в общей структуре расходов, % | |
|-------|--|------------------|---------------|------------------------|--|------|
| | | | | | план | факт |
| 1. | ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области» | 1 990 930,5 | 1 805 447,4 | 90,7 | 19,4 | 25,8 |
| 2. | ГП ЛО «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» | 1 635 249,8 | 429 450,1 | 26,3 | 16 | 6,1 |
| 3. | ГП ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | 1 584 971,0 | 1 067 124,7 | 67,3 | 15,5 | 15,3 |
| 4. | ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 1 420 137,3 | 1 417 295,1 | 99,8 | 13,9 | 20,3 |
| 5. | ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 1 262 868,0 | 727 064,6 | 57,6 | 12,3 | 10,4 |
| 6. | ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» | 1 090 237,9 | 586 983,0 | 53,8 | 10,6 | 8,4 |
| 7. | ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» | 809 691,5 | 560 180,7 | 69,2 | 7,9 | 8 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 8. | ГП ЛО «Развитие культуры в Ленинградской области» | 176 778,0 | 166 667,1 | 94,3 | 1,7 | 2,4 |
| 9. | ГП ЛО «Безопасность Ленинградской области» | 165 116,8 | 145 889,8 | 88,4 | 1,6 | 2,1 |
| 10. | ГП ЛО «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» | 10 000,0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| 11. | ГП ЛО «Охрана окружающей среды Ленинградской области» | 5 000,0 | 5 000,0 | 100 | 0,05 | 0,07 |
| | Непрограммная часть | 93 175,0 | 78 768,5 | 84,5 | 0,9 | 1,1 |
| | Всего по АИП, в т.ч. | 10 244 155,8 | 6 989 870,9 | 68,2 | 100 | 100 |
| | Программная часть | 10 150 980,8 | 6 911 102,4 | 68,1 | 99,1 | 98,9 |

На диаграмме №1 представлена структура плановых бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию **программной** части АИП, в разрезе государственных программ Ленинградской области.


Диаграмма №1

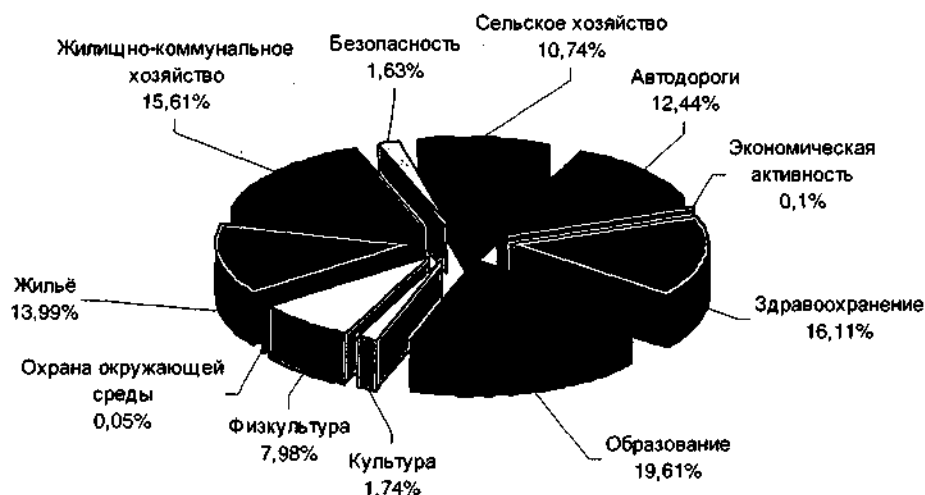

Исходя из объемов плановых бюджетных назначений программной части АИП, приоритетом в Ленинградской области в 2016 году являлось: проектирование, строительство и реконструкция объектов образования (19,6%), здравоохранения (16,1%) и жилищно-коммунального хозяйства (15,6%).

На диаграмме №2 представлена структура фактического финансирования мероприятий **программной** части АИП, также в разрезе каждой из 11 государственных программ, в 2016 году.

Диаграмма №2

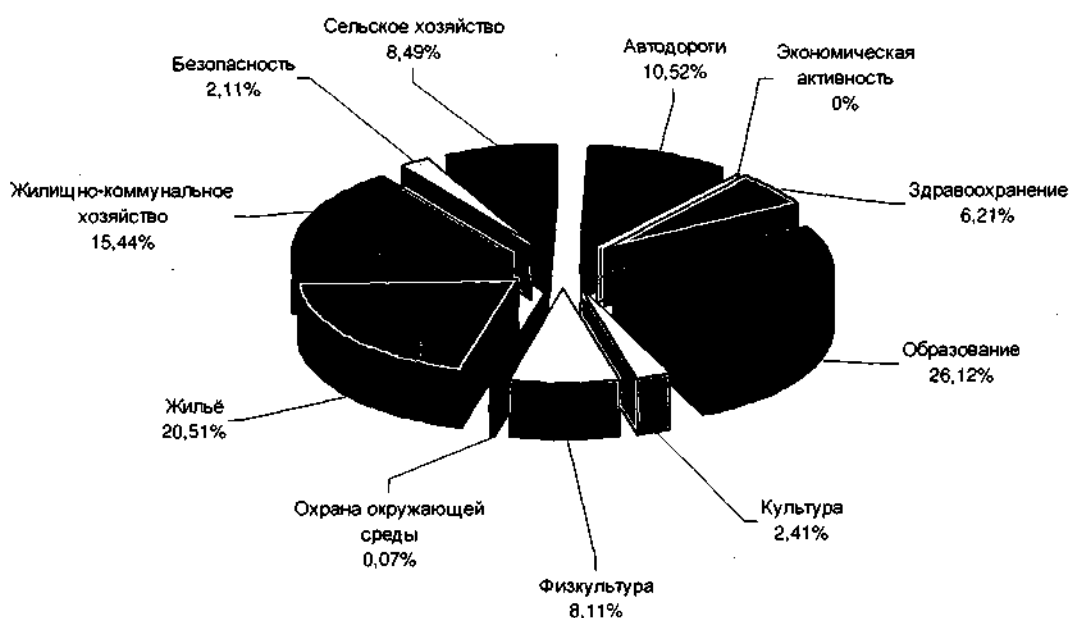


Как видно из представленных выше диаграмм, в 2016 году наибольший удельный вес плановых бюджетных назначений программной части АИП, приходился на реализацию мероприятий государственных программ Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» и «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» - 19,6% (1 990 930,5 тыс. руб.) и 16,1% (1 635 249,8 тыс. руб.) от общего объема, соответственно.

В то же время, по уровню фактического исполнения (финансирования) мероприятий указанных двух программ в общем объеме фактического финансирования удельный вес составил 26,1% (1 805 447,4 тыс. руб.) и 6,2% (429 450,1 тыс. руб.), соответственно.

Всего в рамках АИП (программной ее части, без учета проектно-изыскательских работ (далее по тексту – «ПИР») ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и субсидий, предоставленных в рамках реализации ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области») в 2016 году за счет средств областного бюджета планировалось финансирование проектирования, строительства и реконструкции 254 объектов на общую сумму 7 579 594,0 тыс. руб., из которых 43 объекта (1/6 часть от общего количества объектов) на общую сумму 802 793,7 тыс. руб. (10,6%) в 2016 году не финансировались.

Данные об исполнении АИП (финансировании) за 2016 год в разрезе государственных программ Ленинградской области представлены на диаграмме №3.

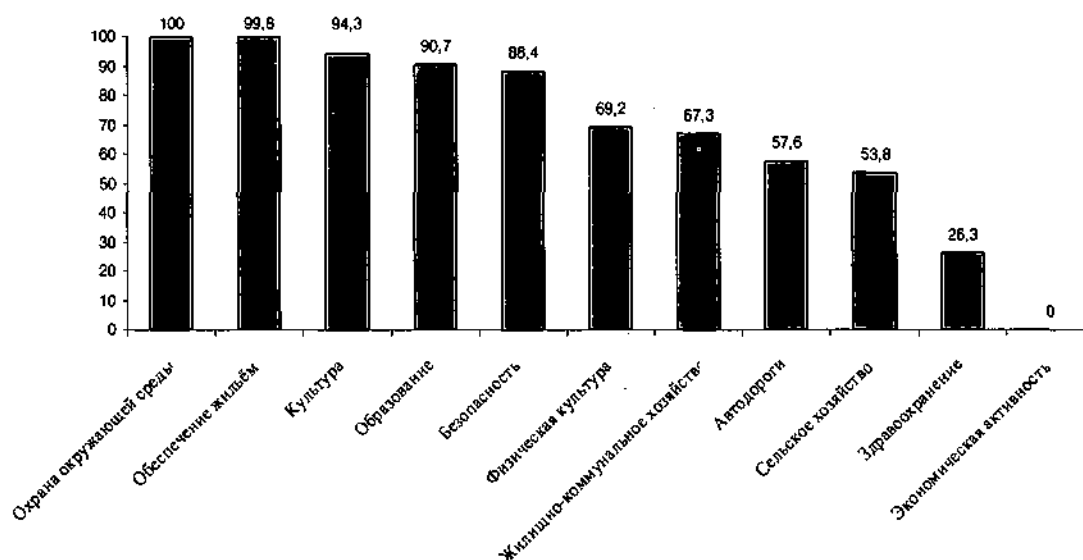

Уровень исполнения государственных программ Ленинградской области, в части объектов, включенных в АИП на 2016 год, сложился от 100% (ГП ЛО «Охрана окружающей среды Ленинградской области») до 0 (ГП ЛО «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»).

АИП на 2016 год в рамках ГП ЛО «Охрана окружающей среды Ленинградской области» было предусмотрено строительство 1 объекта – полигона твердых бытовых отходов в Подпорожском районе Ленинградской области с объемом финансирования в размере 5 000,0 тыс. руб. Объект профинансирован на 100%.

В рамках реализации ГП ЛО «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» АИП на 2016 год также предусматривалось строительство 1 объекта – бизнес-инкубатора производственного типа в г. Всеволожск.

На указанные цели в 2016 году выделено 10 000,0 тыс. руб. Финансирование объекта в 2016 году не производилось.

В разрезе главных распорядителей диапазон показателей исполнения АИП в 2016 году варьировался от 0 (комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области) до 100% (комитет общего и профессионального образования Ленинградской области). В целом исполнение (финансирование) мероприятий АИП на 2016 год составило 68,2% (6 989 870,9 тыс. руб. при плане 10 244 155,8 тыс. руб.).

Информация об исполнении АИП в 2016 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице №2.

Таблица №2, тыс. руб.

| Наименование ГРБС | План | Факт | Отношение план/факт, % | Удельный вес, % | |
|---|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
| | | | | план | факт |
| Комитет по строительству Ленинградской области | 6 689 184,9 | 4 900 352,6 | 73,3 | 65,3 | 70,1 |
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 1 584 502,7 | 789 300,0 | 49,8 | 15,5 | 11,3 |
| Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области | 961 589,8 | 666 995,5 | 69,4 | 9,4 | 9,5 |
| Комитет по ТЭК Ленинградской области | 806 322,8 | 493 562,0 | 61,2 | 7,9 | 7,1 |
| Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | 97 722,6 | 97 222,8 | 99,5 | 1,0 | 1,4 |
| Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | 61 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | 7 570,2 | 7 185,1 | 94,9 | 0,1 | 0,1 |
| Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 7 395,0 | 7 395,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| Итого | 10 244 155,8 | 6 989 870,8 | 68,2 | 100,0 | 100,0 |

Значительное отставание от плановых показателей по объектам АИП, также как, и в 2015 году, приходится на комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области (на 50,2%), на комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (на 38,8%) и на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (на 30,6%).

Как видно из таблицы №2, в 2016 году наибольший удельный вес среди всех главных распорядителей бюджетных средств, приходился на комитет по строительству Ленинградской области – 65,3% от общего объема запланированных на реализацию АИП средств областного бюджета.

1.2. Анализ использования средств областного бюджета Ленинградской области, выделенных на реализацию адресной инвестиционной программы за 2016 год, в разрезе государственных программ Ленинградской области

1.2.1. ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области»

Рост удельного показателя фактического финансирования в общем объеме финансирования АИП в 2016 году относительно удельного показателя планового финансирования государственной программы «Современное образование Ленинградской области» с 19,6% до 26,1% обусловлен относительно высоким уровнем исполнения планового показателя – 90,7% – при плане в размере 1 990 930,5 тыс. руб. фактическое финансирование программы составило 1 805 447,4 тыс. руб.

При этом, следует отметить, что 41% (741 269,4 тыс. руб.) от суммы фактического финансирования государственной программы – средства предусмотренные и направленные на выкуп объектов образования – детских садов и школ.

Необходимо отметить также и то, что в рамках АИП на 2016 год в части мероприятий государственной программы «Современное образование Ленинградской области» предусматривалось строительство и реконструкция 5 объектов образования с выделенным лимитом в общей сумме 120 090,3 тыс. руб., фактическое финансирование по которым в 2016 году не производилось.

Из указанных 5 объектов – 4 объекта – строительство детских садов по Всеволожском районе, в том числе 2 – начало строительства которых было запланировано в 2016 году:

- строительство детского сада на 220 мест в г. Всеволожск, Торговый проспект, 144.

На 2016 год предусмотрено 5 000,0 тыс. руб.; фактическое финансирование не производилось. Получатель средств – администрация Всеволожского района. Согласно данным официального сайта госзакупок (адрес: www.zakupki.gov.ru), муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в 2017 году – от 29.06.2017 №704851 с единственным поставщиком (ООО «Строительное управление №60») по начальной максимальной цене – 222 863,5 тыс. руб. Срок окончания работ – ноябрь 2018 года. На 2017 год выделено средств областного бюджета в сумме 130 960,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 профинансировано на сумму 42 121,2 тыс. руб. (32,2%);

- строительство детского сада на 140 мест в г. Всеволожск, ул. Победы, 17.

В 2016 году на строительство объекта выделено 5 000,0 тыс. руб.; фактическое финансирование также не производилось. Получатель средств – администрация Всеволожского района. Согласно данным официального

сайта госзакупок, муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в 2017 году – от 26.06.2017 №695353 с единственным поставщиком (ООО « Энерго Строительная Компания») по начальной максимальной цене – 202 795,33 тыс. руб. Срок окончания работ – ноябрь 2018 года. На 2017 год выделено средств областного бюджета в сумме 62 244,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 профинансировано на сумму 36 497,3 тыс. руб. (58,6%).

Два объекта – переходящие с 2015 года:

- строительство детского сада на 160 мест в г. Всеволожск, ул. Героев, д.5.

Финансирование объекта в 2015 году составило 87 877,0 тыс. руб. (при плане 96 926,0 тыс. руб., 90,7%); в 2016 году – при плане 9 049,2 тыс. руб. финансирование объекта не осуществлялось; по итогам работы за 9 месяцев 2017 года, при плане на 2017 год в размере 9 049,0 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2017 финансирование также не производилось.

По информации комитета по строительству Ленинградской области в 2016 году средства областного бюджета в сумме 9 049,0 тыс. руб. не были освоены по причине судебных разбирательств с подрядной организацией (ООО «Альфа»).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 12.12.2016, в настоящее время детский сад функционирует в штатном режиме;

- строительство детского сада на 220 мест п. Янино-1, Всеволожского района.

Финансирование объекта в 2015 году составило 81 353,2 тыс. руб. (при плане 147 112,0 тыс. руб., 55,3%); в 2016 году – при плане 65 758,8 тыс. руб. фактическое финансирование отсутствовало. По итогам работы за 9 месяцев 2017 года, при плане на 2017 год в размере 65 759,0 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 100%. Открытие детского сада состоялось в ноябре 2017 года.

Более подробная информация по указанным двум объектам детского дошкольного образования, а также по строительству дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в дер. Романовка Всеволожского района представлена в разделе 1.3. настоящего Заключение.

Еще один объект, начало реконструкции которого предусматривалось в 2016 году – здание лабораторного корпуса ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» в г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 4.

В 2016 году на реконструкцию здания выделено 35 282,3 тыс. руб., финансирование не производилось. Получатель средств – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Согласно данным официального сайта госзакупок, государственный контракт на реконструкцию объекта был заключен в 2017 году – от 10.01.2017

№595507 с единственным поставщиком (ООО «Стройстандарт»); цена контракта (с учетом дополнительного соглашения от 15.11.2017) – 150 626,04 тыс. руб. Срок окончания работ – 16 месяцев с момента передачи подрядчику строительной площадки.

На реконструкцию объекта в 2017 году за счет средств областного бюджета выделено 119 409,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование составило 94 259,8 тыс. руб. (78,9%).

1.2.2. ГП ЛО «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

Снижение удельного показателя фактического финансирования относительно удельного показателя планового финансирования государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» с 16,1% до 6,2%, соответственно, вызвано низким (одним из самых низких из 11 государственных программ) уровнем исполнения программы в 2016 году – 26,3% (при плане в размере 1 635 249,8 тыс. руб. фактическое финансирование государственной программы в части объектов АИП составило 429 450,1 тыс. руб.).

Низкий уровень исполнения государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» связан со строительством перинатального центра в Гатчинском районе Ленинградской области. На указанные цели в рамках программы в 2016 году предусмотрено 1 072 574,0 тыс. руб. (что составляло 65,6% от общей суммы плановых назначений по программе в целом); фактически профинансировано 21 662,6 тыс. руб. (2% от плана).

Строительство перинатального центра в г. Гатчина предусматривалось в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра».

По итогам исполнения программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» за 2015 год, при плане в размере 944 018 тыс. руб. кассовые расходы составили 356 736 тыс. руб. Программы была исполнена на 37,8%.

При этом, на строительство перинатального центра в г. Гатчина при плане в сумме 566 453 тыс. руб. фактически перечислено в 2015 году 87 111 тыс. руб. (15,4%).

АИП на 2017 год на строительство объекта предусмотрено 1 050 911,4 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование составило 766 499,9 тыс. руб. (72,9%).

Справочно. Государственным заказчиком строительства перинатального центра в г. Гатчина является Государственная корпорация «Ростех», генеральный подрядчик – ООО «РТ-Соцстрой». Источники финансирования – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средства областного бюджета. Стоимость исполнения договора генерального подряда (включая оборудование) – 2 261 895,1 тыс. руб. Строительство объекта начато в 2015 году.

Всего на строительство областного перинатального центра, государственному заказчику в 2014-2016 годах (включая указанные выше 21 662,6 тыс. руб.) перечислено 1 436 073,7 тыс. руб. (в том числе – 1 193 753 тыс. руб. – средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, полностью перечисленные государственному заказчику еще в 2015 году).

Срок ввода областного перинатального центра в эксплуатацию, который изначально предполагался в мае 2016 года, был перенесен на декабрь 2016 года. Однако, по состоянию на 01.01.2017 общая стоимость числившихся выполненными и принятыми к оплате строительно-монтажных работ составляла только 406 323,5 тыс. руб. –18% от общей стоимости в соответствии с договором генерального подряда, заключенного на строительство областного перинатального центра.

По состоянию на 01.12.2017:

- общая стоимость числившихся выполненными строительно-монтажных работ составляла 494 941,9 тыс. руб. (21,9% от стоимости исполнения договора генерального подряда, заключенного на строительство перинатального центра);

- общий размер средств, перечисленных государственному заказчику на финансирование всех мероприятий, связанных со строительством перинатального центра, составлял 2 214 467,8 тыс. руб.

Согласно содержанию пояснительной записки к отчету об освоении Государственной корпорацией средств субсидий, полученных из бюджета Ленинградской области, по состоянию на 01.12.2017, на объекте велись работы по:

- кладке наружных стен здания из керамзитобетонных блоков;
- устройству стяжки полов и кирпичной кладки вертикальных шахт инженерных сетей;
- оштукатуриванию кирпичных перегородок;
- усилению дверных проемов, монтажу оконных блоков с заполнением проемов;
- монтажу воздухоотводов;
- установке защитной гофры для прокладки электрических сетей;
- установке дверей и конвекторов.

По итогам конкурсных процедур заключены договоры на поставку и монтаж основного медицинского оборудования (включая 2 реанимобиля), всего на сумму 625 506,6 тыс. руб.

Кроме того, по итогам исполнения АИП за 2016 год в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» (подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения»):

- 53,5% (146 895,5 тыс. руб. при плане 274 500,0 тыс. руб.) составило финансирование строительства детской поликлиники в г. Всеволожск на 600 посещений в смену.

В 2015 году уровень финансирования объекта составлял 97,2% (97 162 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях на 2015 год в размере 100 000,0 тыс. руб.). По итогам работы за 9 месяцев 2017 года фактическое финансирование объекта составило 144 230,0 тыс. руб. при плане 243 970,0 тыс. руб. (59,1%);

- 66% (27 243,4 тыс. руб. при плане 41 308,0 тыс. руб.) составило финансирование строительства корпуса №3 на 50 койко-мест Ульяновской психиатрической больницы в Тосненском районе Ленинградской области.

В 2015 году уровень финансирования объекта составлял 30,7% (44 949,0 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях на 2015 год в размере 146 243,0 тыс. руб.). По итогам работы за 9 месяцев 2017 года финансирование составило 38 824,5 тыс. руб. при плане 161 365,9 тыс. руб. (24%).

1.2.3. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

Удельный вес в общем объеме планового и фактического финансирования государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в рамках АИП практически остался неизменным – на уровне более 15,3%.

В то же время уровень исполнения программы (по объектам, включенным в АИП) по итогам 2016 года составил 67,3% - при плане в размере 1 584 971,0 тыс. руб. фактически профинансировано объектов на сумму 1 067 124,7 тыс. руб.

В рамках рассматриваемой государственной программы осуществлялось проектирование, строительство и реконструкция объектов газификации, водоснабжения и водоотведения, завершалось строительство котельных.

На объекты газоснабжения АИП в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» в 2016 году выделено 720 912,7 тыс. руб., фактически профинансировано объектов на сумму 417 015,5 тыс. руб. (57,9%).

Из 73 объектов газификации, включенных в АИП на 2016 год в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (подпрограмма «Газификация Ленинградской области») на общую сумму 720 912,7 тыс. руб., финансирование 14 объектов с общей суммой плановых назначений в размере 261 636,9 тыс. руб. (36,3% в общем объеме средств, выделенных на эти цели) в 2016 году не осуществлялось.

Из указанных 14 объектов наибольший объем финансирования был предусмотрен:

- 79 428,0 тыс. руб. – на строительство межпоселкового газопровода ГРС «Тосно» - пос. Строеие Тосненского района.

По итогам исполнения АИП за 2017 год, по состоянию на 01.10.2017, при плане в размере 33 000,0 тыс. руб., финансирование объекта также не осуществлялось. Получатель средств областного бюджета – администрация Тосненского района.

Согласно данным официального сайта госзакупок, муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в 2017 году – от 15.11.2017 №0145200000417001565 с единственным участником (ООО «Строительное управление №60») по начальной максимальной цене – 83 947,07 тыс. руб. Срок окончания работ – 8 месяцев с момента передачи объекта подрядчику;

- 55 051,6 тыс. руб. – на проектирование и строительство распределительного газопровода пос. Запорожское Приозерского района.

В 2015 году, объект был профинансирован на уровне 100% (на сумму 5 656,0 тыс. руб., ПИР).

В 2017 году, по состоянию на 01.10.2017, финансирование объекта не производилось (план на 2017 год – 65 810,0 тыс. руб.). Получатель средств областного бюджета – администрация Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района.

Согласно данным официального сайта госзакупок, муниципальный заказ на строительство газопровода был размещен на сайте 24.10.2017. Аукцион признан несостоявшимся. Единственный участник – ООО «Невская строительная компания». Стартовая цена контракта – 71 120,91 тыс. руб. Сроки выполнения работ – до 30.11.2018. Заключение муниципального контракта приостановлено с 24.11.2017 УФАС по Ленинградской области (в связи с жалобой);

- 49 711,0 тыс. руб. – на строительство газораспределительного газопровода высокого давления в микрорайоне Петровский г. Выборг.

В 2017 году, по состоянию на 01.10.2017, фактическое финансирование объекта составило 10,8% (10 005,1 тыс. руб. при плане 93 000,0 тыс. руб.). Получатель средств областного бюджета – администрация Выборгского района.

Согласно данным официального сайта госзакупок, муниципальный контракт на строительство распределительного газопровода был заключен в 2017 году – от 07.02.2017 №615187 с единственным участником аукциона (ООО «СЗИ-Комплекс»), признанного несостоявшимся. Цена контракта – 141 477,78 тыс. руб. (максимальная);

- 37 695,8 тыс. руб. – на строительство распределительного газопровода для жилых домов пос. Вырица, улицы: Вокзальная, Оредежская, Оредежский проезд, Сиверское шоссе, Баркановская, Удельная, Восковская, Слуцкая, Колхозный пер., Кочкарная; дер. Никольское.

АИП на 2017 год на строительство объекта предусмотрено 37 695,8 тыс. руб. В 2017 году, по состоянию на 01.10.2017, финансирование объекта не осуществлялось. Получатель средств областного бюджета – администрация Вырицкого городского поселения.

Согласно данным официального сайта госзакупок, муниципальный контракт на строительство распределительного газопровода был заключен в 2017 году – от 22.08.2017 №15/2017, по итогам конкурсных процедур с ООО «Невская строительная компания». Цена контракта – 38 302,75 тыс. руб. Сроки выполнения работ – до февраля 2018 года;

- 18 444,0 тыс. руб. – на строительство распределительного газопровода п. Вырица, микрорайон 1-я платформа.

Объем финансирования, запланированный на строительство объекта на 2017 год, составил 18 444,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не производилось.

Получатель средств областного бюджета – администрация Вырицкого городского поселения.

В соответствии с данными официального сайта госзакупок, муниципальный контракт на строительство объекта был заключен в 2017 году – от 21.08.2017 №13/2017, по результатам аукциона с ООО «Межрегионтеплострой». Цена контракта – 18 479,35 тыс. руб.; срок выполнения работ – до ноября 2017 года;

- 10 388,8 тыс. руб. – на строительство распределительного газопровода п. Пятиречье Приозерского района.

Плановый объем финансирования объекта на 2017 год установлен в размере 24 670,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не производилось.

Получатель средств областного бюджета – администрация Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района.

Согласно данным официального сайта госзакупок, муниципальный заказ на строительство распределительного газопровода был размещен в октябре 2017 года. Подана единственная заявка участника (ООО «Невская строительная компания»), аукцион признан несостоявшимся (протокол от 16.11.2017).

Определение поставщика и заключение муниципального контракта приостановлено с 24.11.2017 УФАС по Ленинградской области (в связи с жалобой). Стартовая цена контракта – 26 664,74 тыс. руб.

На объекты водоснабжения и водоотведения АИП в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» в 2016 году выделено 844 924,6 тыс. руб., фактически профинансировано объектов на сумму 632 210,5 тыс. руб. (74,8%).

Из 39 объектов водоснабжения и водоотведения, включенных в АИП на 2016 год в рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области») на общую сумму 844 924,6 тыс. руб., не осуществлялось финансирование 7 объектов с общей суммой плановых назначений в размере 109 879,3 тыс. руб. (13% в общем объеме средств, выделенных на эти цели).

Из указанных 7 объектов наибольший объем финансирования был предусмотрен:

- 43 086,3 тыс. руб. – на реконструкцию водопроводных сооружений с установкой станции водоподготовки в г. Любань Тосненского района.

АИП на 2017 год на реконструкцию объекта за счет средств областного бюджета выделено 46 176,5 тыс. руб.

Получатель средств областного бюджета – администрация Любанского городского поселения Тосненского района.

Согласно данным официального сайта госзакупок, муниципальный заказ на реконструкцию объекта был размещен 02.10.2017. Аукцион признан несостоявшимся. Муниципальный контракт был заключен в 2017 году – от 08.11.2017 №815935, с единственным участником – ООО «Андерком». Цена контракта – 46 490,92 тыс. руб. Срок выполнения работ – 31.12.2017.

По состоянию на 01.10.2017 финансирование работ не осуществлялось;

- 26 309,3 тыс. руб. – на реконструкцию участков первой и второй ниток Ладожского водовода диаметром 800 мм и диаметром 900 мм в районе Ладожской насосной станции пос. им. Морозова.

В 2015 году на указанные цели за счет средств областного бюджета выделено 74 300,0 тыс. руб., фактически профинансировано работ на сумму 3 600,0 тыс. руб. (4,9%).

Получатель средств областного бюджета – администрация Всеволожского района.

Согласно данным официального сайта госзакупок, муниципальный заказ на реконструкцию объекта был размещен в декабре 2015 года – 18.12.2015. Извещением об отказе от проведения закупки от 24.12.2015

закупка отменена. Начальная максимальная цена контракта составляла 72 903,76 тыс. руб.

АИП на 2017 год на реконструкцию участков первой и второй ниток Ладожского водовода диаметром 800 мм и диаметром 900 мм в районе Ладожской насосной станции пос. им. Морозова в рамках реализации ГП ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области») средств областного бюджета не предусмотрено;

- 20 000,0 тыс. руб. – на строительство наружной сети канализации микрорайона «Аэрогеодезия» г. Отрадное Кировского района.

Получатель средств областного бюджета – администрация МО «Город Отрадное».

АИП на 2017 год на строительство объекта предусмотрено 20 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование отсутствовало.

Согласно данным официального сайта госзакупок, муниципальный заказ на строительство объекта размещен 26.12.2016. Начальная максимальная цена контракта – 19 632,61 тыс. руб.

Закупка не проведена в связи с извещением об отмене определения поставщика от 03.03.2017.

1.2.4. ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

Доля плановых назначений, предусмотренных на объекты АИП на 2016 год в рамках реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в общем объеме плановых назначений составляла 13,9%.

По результатам исполнения государственной программы за 2016 год в части АИП удельный вес фактического финансирования увеличился до 20,3%, что связано с самым высоким уровнем исполнения программы – 99,8% (1 417 295,1 тыс. руб. при плане в размере 1 420 137,3 тыс. руб.).

При этом, 2 831,9 тыс. руб. из 1 420 137,3 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств областного бюджета (в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области»).

Высокий уровень исполнения государственной программы был обеспечен механизмом ее реализации – посредством предоставления средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на соответствующие мероприятия.

В 2015 году уровень исполнения программы составил 98,1% (789 821 тыс. руб. при плане в размере 804 801 тыс. руб.).

По итогам работы за 9 месяцев 2017 года средства бюджета Ленинградской области перечислены в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области (в основном, в бюджеты городских и сельских поселений) в сумме 499 953,9 тыс. руб., что составило 90,6% от планового показателя (551 782,5 тыс. руб.).

В этой связи необходимо отметить, что практика проведения Контрольно-счетной палатой Ленинградской области контрольных и экспертно-аналитических мероприятий показала, что при предоставлении бюджетам муниципальных образований средств областного бюджета в форме субсидий на софинансирование объектов муниципальной собственности без учета фактически выполненных работ, в дальнейшем может приводить, в том числе, к образованию дебиторской задолженности и возврату средств в областной бюджет в следующем финансовом периоде (году).

Так, например, в ходе проведения в 2016 году внешней проверки отчета об исполнении бюджета Ленинградской области комитета по строительству Ленинградской области за 2015 год, было установлено, что по состоянию на 01.01.2016 числилась дебиторская задолженность в размере 1 016 714,0 тыс. руб.

Согласно предоставленным к проверке документам, данная дебиторская задолженность сформирована по счету 206.51 «Расчеты по выданным авансам». Авансы на сумму 1 016 714,0 тыс. руб. были выданы администрациям муниципальных образований Ленинградской области в соответствии с заключенными Соглашениями о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований (в том числе прошлых лет).

По состоянию на 05.02.2016 средства, предоставленные в 2015 году бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в сумме 1 016 714,0 тыс. руб., были возвращены в областной бюджет в полном объеме.

В рамках АИП на 2016 год в части государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» осуществлялась реализация мероприятий трех подпрограмм:

- «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда».

На поддержку граждан, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда в бюджеты муниципальных образований (городских и сельских поселений) в 2016 году за счет средств областного бюджета в форме субсидий направлено 146 477,9 тыс. руб. (практически 100% от плановых назначений (146 488,2 тыс. руб.)).

В 2015 году на указанные цели перечислено 79 228 тыс. руб. (рост финансирования подпрограммы в 2016 году к факту 2015 года составил 84,9%).

АИП на 2017 год, по состоянию на 01.10.2017, в рамках подпрограммы в бюджеты муниципальных образований перечислено 65 808,2 тыс. руб. (100% от утвержденных лимитов).

Снижение уровня финансирования подпрограммы в 2017 году относительно уровня 2016 года составило 54%, по отношению к уровню 2015 года – 16,9%.

На протяжении всех трех рассматриваемых лет – 2015 – 2017, стабильно выделялись средства областного бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда в Волосовском городском поселении Волосовского района (сумма финансирования за три года составила 4 208,9 тыс. руб.), Лужском городском поселении Лужского района (12 740,4 тыс. руб.), Роцинском городском поселении Выборгского района (16 264,9 тыс. руб.), Тихвинском городском поселении Тихвинского района (13 875,5 тыс. руб.);

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области».

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета в рамках АИП на 2016 год выделено 1 048 649,2 тыс. руб.

Средства областного бюджета предоставлялись бюджетам муниципальных образований (городских и сельских поселений) в форме субсидий на приобретение квартир в строящихся домах для расселения аварийного фонда.

В 2016 году в бюджеты городских и сельских поселений на указанные цели перечислено 1 045 817,3 тыс. руб. (99,7% от плана).

В 2015 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда выделено 500 235 тыс. руб., направлено в бюджеты муниципальных образований средств областного бюджета в сумме 485 593 тыс. руб. (97%).

В рамках АИП на 2017 год, по состоянию на 01.10.2017, в бюджеты муниципальных образований в рамках рассматриваемой подпрограммы перечислено 120 551,2 тыс. руб. (при плане в размере 121 691,6 тыс. руб., 99,1%); 1 140,4 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств областного бюджета.

Относительно уровня 2016 года в 2017 году плановый объем финансирования подпрограммы сократился в 8,6 раза – с 1 048 649,2 тыс. руб. до 121 691,6 тыс. руб., по отношению к уровню 2015 года – в 4,1 раза.

- «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки».

На реализацию мероприятий указанной подпрограммы ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в рамках АИП в 2016 году предусмотрено 224 999,9 тыс. руб. Средства перечислены в бюджеты городских и сельских поселений в форме субсидий – на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей, в полном объеме, на сумму 224 999,9 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы в 2015 и 2016 годах оставалось на одном уровне – 225 000,0 тыс. руб. В 2017 году плановый объем финансирования увеличился в 1,6 раза и составил 364 282,7 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование подпрограммы составило 313 594,5 тыс. руб. (86,1%).

1.2.5. ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

Доля бюджетных инвестиций, выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2016 году (подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»), в общей структуре АИП составила 12,3%.

В 2015 – 2017 годах имела место динамика увеличения планового финансирования мероприятий подпрограммы. Так, если в 2015 и 2016 годах на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог было выделено 1 120 429 тыс. руб. и 1 262 868 тыс. руб., соответственно, то в 2017 году на указанные цели за счет средств областного бюджета предусмотрено в 1,3 раза больше, чем в 2016 году.

Однако по итогам исполнения АИП, в части реализации (финансирования) мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования», в указанном периоде, по состоянию на 01.10.2017, наблюдалась обратная тенденция – если в 2015 году уровень исполнения подпрограммы составлял 67,1% (752 175 тыс. руб. при плане в размере 1 120 429 тыс. руб.), то по итогам 2016 года уровень исполнения составил 57,6% (727 064,6 тыс. руб. при плане 1 262 868,0 тыс. руб.), за 9 месяцев 2017 года – 32,8% (537 121 тыс. руб. при плане 1 638 815,3 тыс. руб.).

В 2016 году, из 18 объектов, включенных в АИП в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» на общую сумму 1 193 886,5 тыс. руб., не осуществлялось финансирование трех объектов с общей суммой плановых назначений в размере 71 883,9

тыс. руб. (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области):

- строительство мостового перехода через Староладожский канал в дер. Загубье» (получатель средств областного бюджета – администрация Свирицкого сельского поселения Волховского района).

В 2016 году на строительство объекта за счет средств областного бюджета выделено 26 000,0 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство мостового перехода размещен от 30.08.2016. По результатам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт от 19.10.2016 №535197 с ООО «Спецстрой». Цена контракта – 24 329,8 тыс. руб. Срок выполнения работ – 30.08.2017.

АИП на 2017 год из бюджета области выделено 24 000,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составляло 1 356,4 тыс. руб. (5,7%).

Информация о расторжении муниципального контракта на сайте госзакупок отсутствовала.

По информации комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области работы на объекте приостановлены в связи с необходимостью внесения изменений в проектные решения; ввод объекта в 2017 году не обеспечен;

- строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина» (получатель средств – администрация города Гатчина).

На строительство объекта в 2016 году выделено 43 933,4 тыс. руб.

В 2015 году средства областного бюджета Ленинградской области были выделены на проектно-сметную документацию на строительство объекта в сумме 3 202 тыс. руб. Фактическое финансирование в 2015 году составило 2 779 тыс. руб. (86,8%).

АИП на 2017 год на строительство подъезда к наноцентру предусмотрено 38 756,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 18 015,3 тыс. руб. (46,5%).

По данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области выполнение всего комплекса работ на объекте ожидается в 2017 году;

- проектирование и строительство пешеходного мостового перехода через реку Оредеж в дер. Даймище (получатель средств – администрация Рождественского городского поселения Гатчинского района).

В 2016 году за счет средств областного бюджета в рамках АИП на проектирование объекта выделено 1 950,5 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на проектирование объекта был размещен 23.06.2016. По

результатам проведенных конкурсных процедур, в июле 2016 года был заключен муниципальный контракт от 28.07.2016 №0145300008216000011 с ООО «Стройдормост Проект». Цена контракта – 2 065,5 тыс. руб. Срок выполнения работ – 15.12.2016.

АИП на 2017 год на указанные цели выделено 1 950,5 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не осуществлялось.

По информации комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области выполнение ожидается в декабре 2017 года, после получения положительного заключения государственной экспертизы.

По объекту «Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг – Таммисуо участка Выборг – Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26+30.92, ПК 1276+10.8 и ПК 15+89.60» исполнение составило 12 187,6 тыс. руб. при плановом значении показателя в размере 105 723,6 тыс. руб. (11,5%). Сроки выполнения работ на объекте перенесены по причине длительности оформления лесного участка для производства работ. Кроме того возникла необходимость корректировки проектных решений с прохождением повторной государственной экспертизы проекта.

В 2017 году на строительство объекта выделено 210 202,7 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 фактически профинансировано работ на сумму 133 360,9 тыс. руб. (63,4%). По данным комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, ввод объекта планируется в 2017 году.

По объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги «Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области» освоение по итогам 2016 года составило 1 953,1 тыс. руб. или 35,6% от плана (5 487,8 тыс. руб.). Неиспользованный остаток средств в общей сумме 3 534,7 тыс. руб., в том числе:

- 1 855,3 тыс. руб. – в связи с приостановкой работ по 3 этапу комплекса инженерно-технических услуг из-за отказа Кадастровой палаты по постановке на кадастровый учет двух земельных участков;

- 923,9 тыс. руб. – по разработке рабочей документации в связи с отсутствием положительного заключения экспертизы сметной стоимости;

- 755,5 тыс. руб. – по разработке рабочей документации в связи с невозможностью проведения конкурсных процедур из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы.

В 2017 году на строительство объекта предусмотрено 70 874,5 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 923,9 тыс. руб. (1,3%).

По состоянию на 01.10.2017 завершены работы по разработке проектно-сметной документации, получено положительное заключение

государственной экспертизы. Оставшийся лимит финансирования предусмотрен на возмещение стоимости земельных участков и сносимых строений, землеустроительные и кадастровые работы.

На проектно-изыскательские работы и отвод земель будущих лет на 2016 год были запланированы бюджетные средства в сумме 68 981,5 тыс. руб., исполнено (профинансировано) работ на сумму 23 291,0 тыс. руб. (33,8%).

1.2.6. ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Средства областного бюджета, предусмотренные в 2016 году на реализацию мероприятий АИП в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»), израсходованы в объеме 53,8% - при плане в размере 1 090 237,9 тыс. руб. размер фактического финансирования составил 586 983,0 тыс. руб.


В 2015 году уровень исполнения мероприятий АИП в рамках подпрограммы составлял 68% (847 326 тыс. руб. при плане 1 245 256 тыс. руб.). По итогам работы за 9 месяцев 2017 года при плане 1 535 699,8 тыс. руб. финансирование объектов АИП составило 266 461,1 тыс. руб. (17,4%). За аналогичный период 2016 года (9 месяцев 2016 года) уровень финансирования объектов АИП подпрограммы составлял 19,3 % (210 956,9 тыс. руб.) от скорректированного плана года.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году в части объектов АИП осуществлялось финансирование строительства и реконструкции объектов газификации, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения, культуры и спорта, автомобильных дорог, расположенных в сельской местности.

В рамках подпрограммы в 2015-2016 годах осуществлялось также строительство двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции.

На диаграмме №4 представлена плановая структура бюджетных инвестиций на 2016 год, с учетом объектов АИП, включенных в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в разрезе отдельных отраслей социально-экономического развития Ленинградской области.


Диаграмма №4

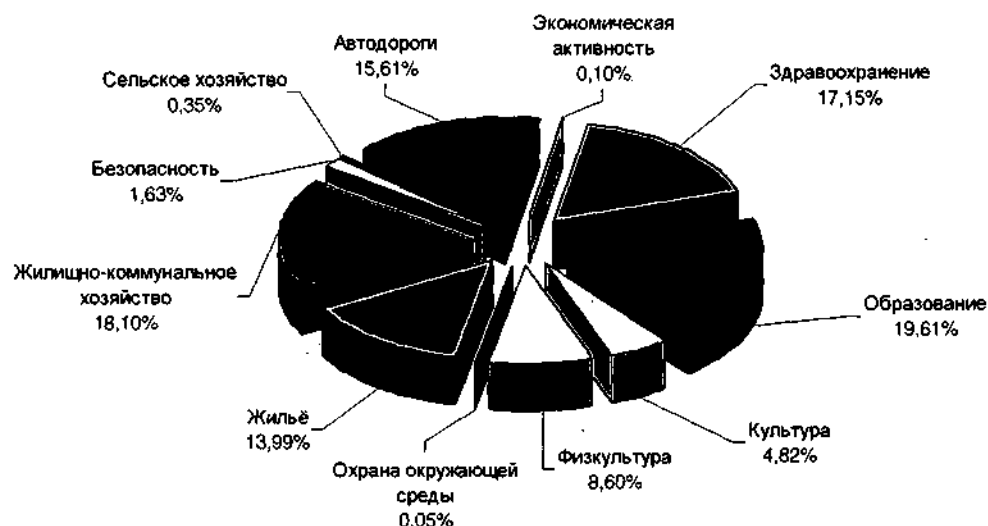

Таким образом, наиболее приоритетными направлениями бюджетного инвестирования в целом по Ленинградской области в 2016 году, в том числе в сельских населенных пунктах, было определено образование (19,6%), жилищно-коммунальное хозяйство (18,1%) и здравоохранение (17,2%).

На диаграмме №5 представлена структура фактического финансирования, направленного в 2016 году на капитальные объекты (в том числе, включенных в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»), в разрезе отдельных отраслей социально-экономического развития Ленинградской области.

Диаграмма №5

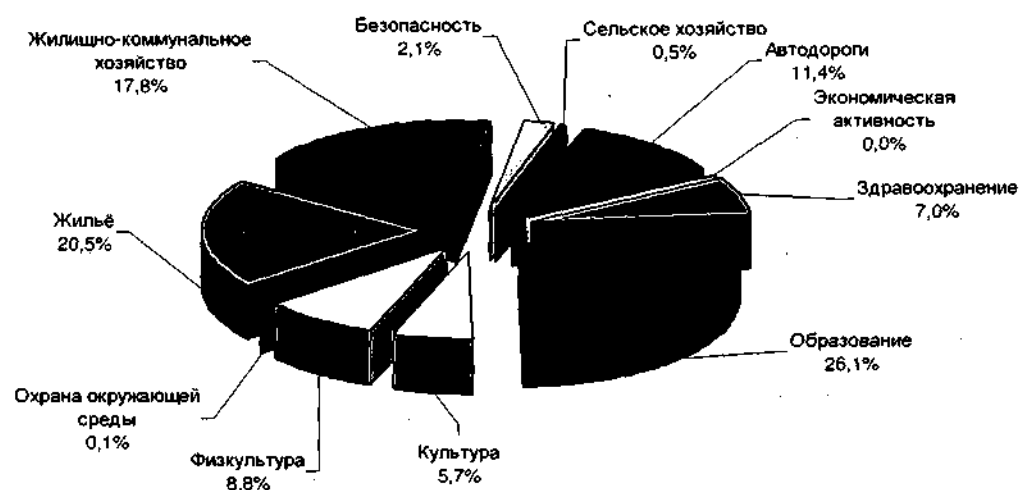

Как видно из представленной выше диаграммы наибольший объем финансирования (инвестиций) в 2016 году был направлен на объекты образования (26,1%), улучшение жилищных условий (объекты муниципальной собственности, 20,5%) и жилищно-коммунальное

хозяйство (17,8%). Объекты здравоохранения в структуре фактических затрат составили только 7%, что связано, прежде всего, со строительством перинатального центра в г. Гатчина.

В АИП на 2016 год в рамках реализации ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» был включен 71 объект проектирования, строительства и реконструкции в сельских населенных пунктах, на общую сумму 1 090 237,9 тыс. руб., в том числе:

- 8 объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 116 665 тыс. руб.

Фактическое финансирование по итогам года составило 34 784,9 тыс. руб. (29,8%). Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; получатели средств областного бюджета – администрации сельских поселений Волосовского, Волховского, Всеволожского, Кировского, Лодейнопольского и Приозерского районов Ленинградской области;

- 8 объектов культуры (строительство и реконструкция сельских Домов культуры) на общую сумму 312 071,1 тыс. руб.

Фактическое финансирование объектов культуры составило 229 134,1 тыс. руб. (73,4%). Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатели средств областного бюджета – администрации сельских поселений Бокситогорского, Волосовского, Лодейнопольского, Ломоносовского и Лужского районов Ленинградской области;

- 7 объектов спортивного назначения (строительство и реконструкция спортивных площадок) на общую сумму 63 514,4 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 46 852,9 тыс. руб. (73,7%). Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатели средств областного бюджета – администрации сельских поселений Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Приозерского и Лужского районов Ленинградской области;

- 10 объектов здравоохранения (строительство фельдшерско-акушерских пунктов, проектирование и реконструкция амбулаторий) на сумму 105 299,9 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 51 789,1 тыс. руб. (49,2%). Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатель средств областного бюджета – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Строительство ФАПов, проектирование и реконструкция амбулаторий в 2016 году осуществлялось в сельских населенных пунктах Гатчинского, Всеволожского, Волховского, Приозерского, Сланцевского, Кингисеппского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского и Лужского районов Ленинградской области;

- 28 объектов газификации на общую сумму 78 197,9 тыс. руб.

Фактическое финансирование составило 69 334,6 тыс. руб. (88,7%).
Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; получатели средств областного бюджета – администрации сельских поселений Ленинградской области Бокситогорского, Волосовского, Всеволожского, Волховского, Кингисеппского, Кировского, Лодейнопольского и Приозерского районов Ленинградской области;

- 2 объекта проектирования и строительства инженерных сетей (в рамках комплексного обустройства площадок под компактную жилую застройку) на сумму 57 313,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование объектов составило 100%.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатели средств областного бюджета – администрации Гатчинского района Ленинградской области и Ям-Тесовского сельского поселения Лужского района Ленинградской области;

- 7 объектов дорожного хозяйства (строительство и реконструкция подъездов к поселкам: Сопки, Клеверное, Маслово, Яшино, Токарево Выборгского района, дер. Силино Приозерского района, пос. Мехбаза Тихвинского района) на общую сумму 321 634,7 тыс. руб.

Фактическое финансирование объектов составило 62 235,4 тыс. руб. (19,3%).

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области;

- 1 объект на сумму 35 542,0 тыс. руб. – строительство двухэтажного здания Кингисеппской ветеринарной инспекции.

Фактическое финансирование составило 35 538,9 тыс. руб. (практически 100%). Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатель средств областного бюджета – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Как было отмечено выше, при плане на 2016 год в размере 1 090 237,9 тыс. руб., кассовое исполнение АИП в части ГП «Развитие сельского хозяйства в Ленинградской области» составило 586 983,0 тыс. руб. (53,8%).

Из 71 объекта, включенного в АИП в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», не осуществлялось финансирование 8 объектов, предусмотренных планом на 2016 год на общую сумму 177 086,3 тыс. руб. (16,2% от общего объема финансирования программы), в том числе:

- 2 объекта водоснабжения и водоотведения на сумму 9 750,0 тыс. руб.:

- техническое перевооружение водозаборных сооружений с установкой станции очистки исходной воды в пос. Аврово Волховского района – на указанные цели в 2016 году предусмотрено 2 250,0 тыс. руб.

В 2015 году на проектные работы по реконструкции системы водоснабжения в пос. Аврово АИП предусмотрено 950 тыс. руб.; финансирование составило 100%.

Согласно данным официального сайта госзакупок, в августе 2015 года был размещен заказ на разработку проекта на техническое перевооружение водозаборных сооружений с установкой станции очистки исходной воды в пос. Аврово. Аукцион был признан несостоявшимся, муниципальный контракт был заключен с единственным участником (ООО «Северо-Западная Индустриальная компания») от 24.09.2015 №0145300003015000020. Цена контракта – 2 366,7 тыс. руб. Срок выполнения работ – 1 месяц с момента заключения контракта.

Информация об исполнении или расторжении контракта на сайте госзакупок отсутствовала.

АИП на 2017 год финансирование объекта не предусмотрено.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области; получатель – администрация Сясьстройского городского поселения Волховского района;

- реконструкция канализационных сооружений (КОС) в пос. Мельниково Приозерского района – в 2016 году за счет средств областного бюджета на эти цели выделено 7 500,0 тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области; получатель – администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского района.

В 2015 году на реконструкцию КОС в пос. Мельниково выделено 26 077 тыс. руб.; финансирование составило 100%.

АИП на 2017 год финансирование объекта не предусмотрено.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на проведение реконструкции КОС в пос. Мельниково был размещен в 2013 году – от 03.12.2013. По результатам проведенных конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт от 29.01.2014 № ЭА2-01/2014 с ООО «Альянс Электро». Цена контракта – 144 615,9 тыс. руб. Срок выполнения работ – 16.11.2016. Контракт исполнен. Оплачено 144 615,9 тыс. руб.

Кроме того, не в полном объеме в 2016 году – на 28,4% и на 9%, соответственно, были профинансированы работы по строительству водоочистных сооружений (ВОС) в пос. Мельниково (23 865,4 тыс. руб. при плане в размере 84 127,0 тыс. руб.) и строительству 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожск до ВНС пос. Романовка, реконструкции

ВНС в пос. Романовка (1 149,5 тыс. руб. при плане в размере 12 806,0 тыс. руб.).

В 2015 году на строительство ВОС в пос. Мельниково предусмотрено 16 665 тыс. руб.; финансирование объекта не осуществлялось.

АИП на 2017 год на строительство объекта выделено 90 843,6 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование составило 4 666,0 тыс. руб. (5,1%).

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области; получатель – администрация Мельниковского сельского поселения Приозерского района.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство ВОС в пос. Мельниково был размещен от 30.11.2015. По результатам проведенных конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт от 10.03.2016 №ЭА8-12/15 с ООО «Альянс Электро». Цена контракта – 186 523,0 тыс. руб. Срок выполнения работ – 01.07.2018.

На строительство (проектирование) 2-й нитки водовода от ВОС г. Всеволожск до ВНС пос. Романовка в 2015 году выделено 5 000,0 тыс. руб.; финансирование составило 100%.

В 2017 году на строительство объекта выделено 33 556,5 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование составило 2 476,2 тыс. руб. (7,4%).

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области; получатель – администрация Романовского сельского поселения Всеволожского района;

- 1 объект газоснабжения – строительство распределительного (уличного) газопровода с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул. Леспромхозовская, ул. Чернецкого в Колчановском сельском поселении Волховского района – на сумму 7 372,0 тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области; получатель – администрация Колчановского сельского поселения Волховского района.

В 2015 году на строительство (проектирование) объекта выделено 2 565 тыс. руб.; финансирование объекта составило 100%.

В 2017 году в рамках АИП на строительство объекта выделено 7 372,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирования объекта не осуществлялось.

Согласно данным официального сайта госзакупок, заказ на строительство объекта был размещен 18.09.2017. Аукцион был признан

несостоявшимся, муниципальный контракт был заключен с единственным участником (ООО «Межрегионтеплострой») от 16.10.2017 №803421. Цена контракта – 7 760,2 тыс. руб. Срок выполнения работ – до 15.12.2017;

- **4 объекта дорожного хозяйства** на общую сумму 159 864,3 тыс. руб. (14,7% в структуре плановых назначений ГП «Развитие сельского хозяйства в Ленинградской области» и 90,3% в структуре не профинансированных в 2016 году объектов программы):

- строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Сопки» в Полянском сельском поселении Выборгского района.

На строительство объекта в 2016 году за счет средств областного бюджета предусмотрено 10 348,8 тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; получатель – администрация Выборгского района.

По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство подъезда к пос. Сопки размещен от 27.09.2016. По результатам конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт от 09.11.2016 №549653 с ООО «Стройком». Цена контракта – 14 657,4 тыс. руб. Сроки выполнения работ – 11.10.2017.

АИП на 2017 год на строительство объекта выделено 10 200,8 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не осуществлялось.

По информации комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, причиной задержки проведения работ является длительность решения вопросов в получении технических условий по присоединению съездов строящейся дороги. Выполнение всего комплекса работ планируется до конца 2017 года;

- реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Клеверное» в Полянском сельском поселении Выборгского района Ленинградской области.

На реконструкцию автомобильной дороги в 2016 году выделено 36 813,5 тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; получатель – администрация Выборгского района.

АИП на 2017 год на реконструкцию подъезда к пос. Клеверное выделено 36 328,7 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не осуществлялось.

По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство подъезда к пос. Клеверное размещен от 27.09.2016. По результатам конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт от 09.11.2016 №552653 с ООО «Стройком». Цена контракта – 48 002,3 тыс. руб. Сроки выполнения работ – 05.05.2017.

По информации комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, ввод объекта в 2017 году не обеспечен, в связи с длительностью утверждения проекта освоения лесов муниципальным заказчиком;

- строительство автомобильной дороги «Подъезд к пос. Яшино» в Селезневском сельском поселении Выборгского района.

На строительство объекта в 2016 году предусмотрено 13 500,0 тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; получатель – администрация Селезневского сельского поселения Выборгского района.

В 2015 году средства областного бюджета на строительство объекта были выделены в сумме 13 500 тыс. руб.; финансирование также не производилось.

АИП на 2017 год на строительство подъезда к пос. Яшино выделено 15 700,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составляло 2 844,5 тыс. руб. (18,1%).

По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство подъезда к пос. Яшино размещен от 25.11.2015. По результатам конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт от 21.12.2015 №0145200000415002343 с ООО «Стройком». Цена контракта – 16 556,9 тыс. руб. Сроки выполнения работ – 09.02.2018.

По информации комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, ввод объекта в 2017 году не обеспечен, в связи с необходимостью корректировки проектных решений;

- реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Токарево» в Советском городском поселении Выборгского района.

На реконструкцию автомобильной дороги в 2016 году выделено 99 202,0 тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области; получатель – администрация Советского городского поселения Выборгского района.

АИП на 2017 год на реконструкцию подъезда к пос. Токарево выделено 76 336,1 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 14 474,6 тыс. руб. (19%).

По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство подъезда к пос. Токарево размещен от 31.10.2016. По результатам конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт от 15.12.2016 №46 с ООО «Дортекс». Цена контракта – 96 263,8 тыс. руб. Сроки выполнения работ – 30.11.2017.

По информации комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, выполнение всего комплекса работ ожидается в 2017 году;

- **1 объект здравоохранения** – строительство ФАПа (в том числе проектные работы) в дер. Нурма Тосненского района – в 2016 году было

выделено 100 тыс. руб. АИП на 2017 год на проектные работы предусмотрено 2 500,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не осуществлялось.

1.2.7. ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

На объекты физической культуры и спорта АИП на 2016 год в рамках ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области») предусмотрено 809 691,5 тыс. руб. (7,9% в структуре плановых назначений АИП).

Фактическое финансирование программы в 2016 году составило 560 180,7 тыс. руб. (69,2%).

В 2016 году в рамках реализации программы планировалось строительство и реконструкция 16 объектов на общую сумму 748 691,5 тыс. руб. (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области) и выкуп 1 объекта на сумму 61 000,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области).

Из 16 объектов в 2016 году финансирование не осуществлялось по 3 объектам на общую сумму 40 217,0 тыс. руб. (5,4% от запланированного на эти цели объема финансирования), в том числе:

- на завершение реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кингисепп (ул. Воровского) предусмотрено 14 217,0 тыс. руб.

Получатель средств областного бюджета – администрация Кингисеппского района.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на реконструкцию объекта размещен от 28.10.2016. Аукцион признан несостоявшимся, муниципальный контракт был заключен с единственным участником (ООО «Стройсила») от 10.01.2017 №599691. Цена контракта – 47 544,1 тыс. руб. Срок выполнения работ – 30.06.2017.

АИП на 2017 год на реконструкцию объекта предусмотрено 38 899,8 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 33 777,6 тыс. руб. (86,8%);

- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом в г. Подпорожье (ул. Волкова, д.28) в 2016 году выделено 16 000,0 тыс. руб.

Получатель средств областного бюджета – администрация Подпорожского района.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство объекта размещен от 29.05.2017.

Аукцион признан несостоявшимся, муниципальный контракт был заключен с единственным участником (ООО «Петербургская Производственно-Строительная Компания») от 04.09.2017 №764157. Цена контракта – 49 320,8 тыс. руб. Срок выполнения работ – 30.04.2018.

АИП на 2017 год на строительство объекта выделено 31 178,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 14 136,2 тыс. руб. (45,3%);

- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Приозерск (ул. Ленина, д.22) в 2016 году выделено 10 000,0 тыс. руб.

Получатель средств областного бюджета – администрация Приозерского района.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство объекта размещен от 30.12.2016. По результатам конкурсных процедур был заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная компания Юнит» от 25.01.2017 №2771. Цена контракта – 42 600,3 тыс. руб. Срок выполнения работ – 25.08.2018.

АИП на 2017 год на строительство объекта предусмотрено 32 320,2 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 16 191,3 тыс. руб. (50,1%);

Кроме того, в 2016 году в рамках программы были предусмотрены средства областного бюджета на приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Вистино Кинсеппского района. На указанные цели выделено 61 000,0 тыс. руб.; средства областного бюджета в сумме 61 000,0 тыс. руб. в 2016 году израсходованы не были.

АИП на 2017 год на приобретение комплекса было выделено 61 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 средства областного бюджета не использованы.

Менее 50% от запланированного объема профинансировано 4 объекта:

- реконструкция стадиона «Локомотив» в г. Волхов – 30% (12 000,0 тыс. руб. при плане 40 000,0 тыс. руб.); по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 3,9% (3 113,0 тыс. руб. при плане в размере 79 162,6 тыс. руб.); получатель средств областного бюджета – администрация города Волхов;

- строительство универсального спортивного зала у средней образовательной школы г. Высоцк – 30% (11 595,3 тыс. руб. при плане 38 651,0 тыс. руб.); по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не осуществлялось, план на 2017 год – 33 055,7 тыс. руб.; получатель средств областного бюджета – администрация Выборгского района;

- строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рошино (ул. Советская) – 47,4% (11 494,8 тыс. руб. при плане 24 240,0 тыс. руб.); по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 12,5% (19 443,5 тыс. руб. при плане в размере 155 405,0 тыс. руб.); получатель

средств областного бюджета – администрация Рошинского городского поселения;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе № 12» в г. Сланцы (ул. Грибоедова, 19-а) – 42,7% (2 784,0 тыс. руб. при плане 6 519,0 тыс. руб.); по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 52,8% (3 962,1 тыс. руб. при плане в размере 7 500,0 тыс. руб.); получатель средств областного бюджета – администрация Сланцевского района.

1.2.8. ГП ЛО «Развитие культуры в Ленинградской области»

АИП на 2016 год в рамках реализации ГП ЛО «Развитие культуры в Ленинградской области» (подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы») выделено средств областного бюджета в общей сумме 176 778,0 тыс. руб. (1,7% в общей структуре плановых назначений в целом по АИП).

Финансирование объектов АИП в 2016 в рамках государственной программы составило 166 667,1 тыс. руб. (94,3%).

Главным распорядителем средств областного бюджета являлся комитет по строительству Ленинградской области.

В 2016 году программой предусмотрено строительство и реконструкция трех объектов культуры; финансирование одного объекта в 2016 году не осуществлялось:

- на строительство репетиционного (концертного) зала «МБОУ ДОД «Сосновоборская детская школа искусств «Балтика»» (г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.18) выделено 10 000,0 тыс. руб.

АИП на 2017 год на строительство объекта выделено 86 289,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 33 086,8 тыс. руб. (38,3%).

1.2.9. ГП ЛО «Безопасность Ленинградской области»

На проектирование, строительство и реконструкцию объектов АИП на 2016 год в рамках реализации ГП ЛО «Безопасность Ленинградской области» (подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности») выделено средств областного бюджета в сумме 165 116,8 тыс. руб. (1,6% в общей структуре плановых назначений в целом по АИП).

Фактическое финансирование программы в 2016 году составило 145 889,8 тыс. руб. (88,4%).

В рамках государственной программы в 2016 году планировались работы по проектированию, строительству и реконструкции 9 объектов.

В 2016 году из 9 объектов не осуществлялось финансирование только 1 объекта:

- проектирование строительства здания пожарного депо V типа на 2 машино-выезда в пос. Семиозерье Выборгского района. В 2016 году на проектирование объекта выделено 2 000,0 тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; бюджетополучатель – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

АИП на 2017 год на указанные цели предусмотрено 2 385,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 525,9 тыс. руб. (22,1%).

1.2.10. ГП ЛО «Стимулирование экономической активности Ленинградской области»

В рамках ГП ЛО «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (подпрограмма «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области») АИП на 2016 год предусматривалось строительство 1 объекта – бизнес-инкубатора производственного типа в г. Всеволожск.

На указанные цели в 2016 году выделено 10 000,0 тыс. руб. Финансирование объекта в 2016 году не производилось.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; бюджетополучатель – администрация города Всеволожск.

АИП на 2017 год на строительство бизнес-инкубатора в г. Всеволожск предусмотрено 7 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не осуществлялось.

1.2.11. ГП ЛО «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

На строительство полигона твердых бытовых отходов в Подпорожском районе Ленинградской области в рамках реализации ГП ЛО «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (подпрограмма «Обращение с отходами») АИП на 2016 год предусмотрено 5 000,0 тыс. руб. Объект профинансирован на 100%.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; бюджетополучатель – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

АИП на 2017 год на указанные цели выделено 68 203,2 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 71,3% (48 636,9 тыс. руб.)

В состав **непрограммной части АИП** были включены проектные работы по 33 объектам социальной инфраструктуры (проектирование школ, детских садов, поликлиник, больниц, домов культур и пр. объектов).

Удельный вес расходов на непрограммную часть составил 0,9% от общего объема утвержденных ассигнований на реализацию АИП.

Главным распорядителем бюджетных средств по непрограммной части АИП являлся комитет по строительству Ленинградской области, получателем бюджетных средств – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

При плановом назначении бюджетных ассигнований на 2016 год в размере 93 175,0 тыс. руб., фактически непрограммная часть АИП была исполнена на сумму 78 768,5 тыс. руб. (84,5%).

Проектные работы были включены также и в программную часть АИП.

Следует отметить, что уровень исполнения мероприятий АИП на протяжении 2013 – 2016 годов имел тенденцию к ежегодному снижению. Так, если в 2013 году АИП была исполнена на 86,2% от плановых назначений, то по итогам 2016 года – на 68,2%. Средний процент исполнения АИП за период 2013-2016 годов составил 78%. Данные приведены в таблице №3.

Таблица №3, тыс. руб.

| Год/период | План | Факт | % отношение план/факт |
|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 2013 год | 5 953 398 | 5 129 468 | 86,2 |
| 2014 год | 6 278 652 | 4 979 387 | 79,3 |
| 2015 год | 9 022 637 | 6 956 319 | 77,1 |
| 2016 год | 10 244 156 | 6 989 871 | 68,2 |

Как показала практика проведения предыдущих проверок Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, в том числе отдельных государственных программ и отдельных объектов АИП, основными причинами относительно невысокого ежегодного уровня исполнения адресной инвестиционной программы являлось:

- некачественная (в том числе, дающая основания для направления жалоб со стороны подрядных организаций в Управление федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области) подготовка конкурсной документации;

- позднее проведение конкурсных процедур и, соответственно, позднее заключение государственных контрактов (ноябрь-декабрь соответствующего финансового года);

- некачественное проектирование объектов капитального строительства (реконструкции) или отклонения подрядчиком от проектных решений в ходе проведения строительно-монтажных работ, требующих прохождения повторной государственной экспертизы;


- длительность процесса изъятия (выкупа земельных участков у их собственников для государственных нужд Ленинградской области (для строительства новых линейных объектов (автомобильных дорог));

- несоблюдение подрядчиками условий государственных и муниципальных контрактов;

- неприменение (выборочное применение, применение не в полной мере) заказчиками штрафных санкций, предусмотренных государственными и муниципальными контрактами к подрядным организациям за нарушение их условий.

На диаграмме №6 представлена структура плановых назначений бюджетных инвестиций на 2016 год в разрезе районов Ленинградской области (программная часть АИП, без учета ПИР в рамках ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и без учета нераспределенных остатков средств областного бюджета в рамках ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»).

Диаграмма №6, тыс. руб.

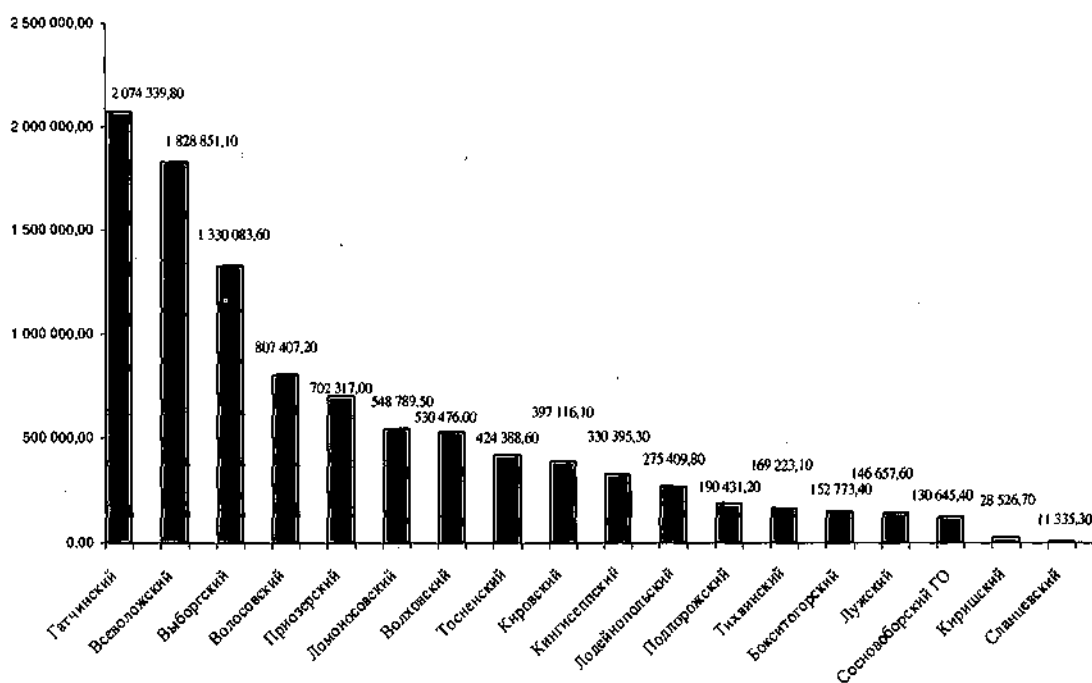

Самый высокий плановый объем бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в 2016 году наблюдался в Гатчинском районе, что объясняется планированием строительства перинатального центра в г. Гатчина (на 2016 год – 1 072 574,0 тыс. руб.).


В объекты, расположенные на территории Всеволожского района, в 2016 году планировалось направить 1 828 851,1 тыс. руб., что составило бы в общем объеме инвестиций 18,1%.

Доля инвестиций Выборгского района в 2016 году составила бы 13,2% (1 330 083,6 тыс. руб.).

Меньше всего бюджетных инвестиций планировалось реализовать в Сланцевском и Киришском районах – 11 335,3 тыс. руб. (0,1%) и 28 526,7 тыс. руб. (0,3%), соответственно.

На диаграмме №7 представлена структура фактического финансирования программной части АИП в 2016 году (также без учета ПИР программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и без учета нераспределенных остатков средств областного бюджета в рамках ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»), в разрезе районов Ленинградской области.

Диаграмма №7, тыс. руб.

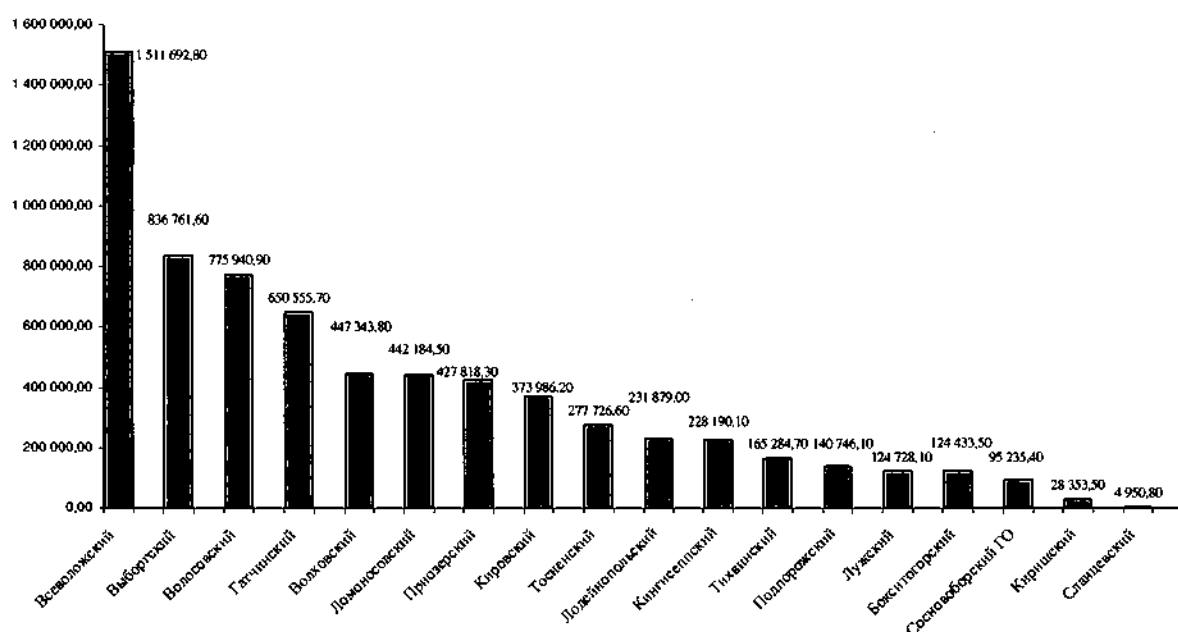

В структуре фактического размещения бюджетных инвестиций в 2016 году наибольший объем приходился на Всеволожский район – 21,9% (1 511 692,8 тыс. руб.). На Выборгский район направлено – 12,1% от общего объема инвестиций (836 761,6 тыс. руб.); Волосовский – 9,4% (775 940,9 тыс. руб.).

При этом, уровень финансирования капитальных вложений в Волосовском районе в 2016 году – один из самых высоких – 96,1% (план 2016 года составлял 807 407,2 тыс. руб.). Выше показатели уровня финансирования только в Киришском – 99,4% (28 353,5 тыс. руб. при плане 28 526,7 тыс. руб.) и Тихвинском – 97,7% (165 284,7 тыс. руб. при плане 169 223,1 тыс. руб.) районах. Однако доля инвестиций в этих районах в общей структуре произведенных расходов значительно ниже и составляло 0,3% и 2,4%, соответственно.

Наименьший объем бюджетных инвестиций в 2016 году был направлен в Сланцевский район – 4 950,8 тыс. руб. (при плане в размере 11 335,3 тыс. руб. (43,7%)).

Средства областного бюджета в сумме 11 335,3 тыс. руб. предусматривались на проектирование, строительство и реконструкцию трех объектов, в том числе по двум объектам финансирование в 2016 году в полном объеме не осуществлялось:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта (в том числе проектные работы) пос. Овсище (450,4 тыс. руб. при плане 3 100,0 тыс. руб., бюджетополучатель ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»); АИП на 2017 год на проектирование объекта предусмотрено 1 696,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 200,2 тыс. руб. (11,9%);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы №3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе №12 в г. Сланцы (ул. Грибоедова, 19-а) – при плане в размере 6 519,0 тыс. руб. фактически профинансировано 2 784,0 тыс. руб.; бюджетополучатель – администрация Сланцевского района. АИП на 2017 год предусмотрено финансирование в объеме 7 500,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 3 962,1 тыс. руб. (52,8%).

В таблице №4 приведены данные об исполнении мероприятий программной части АИП на 2016 год в разрезе муниципальных районов Ленинградской области (без учета ПИР программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и без учета нераспределенных остатков средств областного бюджета в рамках ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»).

Таблица №4, тыс. руб.

| № п/п | Муниципальный район | План на 2016 год | Факт (финансирование) | % исполнения |
|-------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Всеволожский | 1 828 851,1 | 1 511 692,8 | 82,7 |
| 2. | Выборгский | 1 330 083,6 | 836 761,6 | 62,9 |
| 3. | Волосовский | 807 407,2 | 775 940,9 | 96,1 |
| 4. | Гатчинский | 2 074 339,8 | 650 555,7 | 31,4 |
| 5. | Волховский | 530 476,0 | 447 343,8 | 84,3 |
| 6. | Ломоносовский | 548 789,5 | 442 184,5 | 80,6 |
| 7. | Приозерский | 702 317,0 | 427 818,3 | 60,9 |
| 8. | Кировский | 397 116,1 | 373 986,2 | 94,2 |
| 9. | Тосненский | 424 388,6 | 277 726,6 | 65,4 |
| 10. | Лодейнопольский | 275 409,8 | 231 879,0 | 84,2 |
| 11. | Кингисеппский | 330 395,3 | 228 190,1 | 69,1 |
| 12. | Тихвинский | 169 223,1 | 165 284,7 | 97,7 |
| 13. | Подпорожский | 190 431,2 | 140 746,1 | 73,9 |
| 14. | Лужский | 146 657,6 | 124 728,1 | 85,1 |

| | | | | |
|-----|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 15. | Бокситогорский | 152 773,4 | 124 433,5 | 81,5 |
| 16. | Сосновоборский ГО | 130 645,4 | 95 235,4 | 72,9 |
| 17. | Киришский | 28 526,7 | 28 353,5 | 99,4 |
| 18. | Сланцевский | 11 335,3 | 4 950,8 | 43,7 |
| | Всего | 10 079 166,7 | 6 887 811,6 | 68,3 |

В таблице №5 приведены данные о численности населения Ленинградской области по состоянию на 01.01.2016, объемах фактического (2016 год) и планового (2017 год) финансирования в разрезе районов Ленинградской области и размер бюджетных инвестиций в расчете на 1 жителя соответствующего района.

Таблица №5

| Муниципальный район | Численность населения, тыс. чел. | Размер бюджетных инвестиций (фактическое финансирование в 2016 году), тыс. руб. | Размер бюджетных инвестиций в расчете на 1 жителя (факт 2016 года), руб. на 1 человека | Размер бюджетных инвестиций (план 2017 года, по состоянию на 01.10.2017) | Планируемый размер бюджетных инвестиций в 2017 году в расчете на 1 жителя, руб. на 1 человека |
|---------------------|----------------------------------|---|--|--|---|
| Всеволожский | 307,8 | 1 511 692,8 | 4 911,3 | 2 265 262,6 | 7 359,5 |
| Гатчинский | 246,0 | 650 666,7 | 2 645,0 | 2 537 757,9 | 10 316,1 |
| Выборгский | 204,0 | 836 761,6 | 4 101,8 | 1 147 525,9 | 5 625,1 |
| Тосненский | 130,0 | 277 726,6 | 2 136,4 | 911 443,9 | 7 011,1 |
| Кировский | 104,6 | 373 986,2 | 3 575,4 | 325 609,9 | 3 112,9 |
| Волховский | 92,3 | 447 343,8 | 4 846,6 | 474 215,7 | 5 137,8 |
| Кингисеппский | 79,1 | 228 190,1 | 2 884,8 | 790 471,9 | 9 993,3 |
| Лужский | 75,0 | 124 728,1 | 1 663,0 | 319 814,1 | 4 264,2 |
| Тихвинский | 70,0 | 165 284,7 | 2 361,2 | 125 670,2 | 1 795,3 |
| Ломоносовский | 69,6 | 442 184,5 | 6 353,2 | 176 372,6 | 2 534,1 |
| Сосновоборский ГО | 67,6 | 95 235,4 | 1 408,8 | 318 204,8 | 4 707,2 |
| Киришский | 64,2 | 28 353,5 | 441,6 | 27 034,9 | 421,1 |
| Приозерский | 62,6 | 427 818,3 | 6 834,2 | 765 435,5 | 12 227,4 |
| Волосовский | 51,8 | 775 940,9 | 14 979,6 | 766 626,9 | 14 799,7 |
| Бокситогорский | 50,8 | 124 433,5 | 2 449,5 | 175 510,0 | 3 454,9 |
| Сланцевский | 43,6 | 4 950,8 | 136,5 | 24 196,0 | 555,0 |
| Подпорожский | 30,2 | 140 746,1 | 4 660,5 | 391 929,6 | 12 977,8 |
| Лодейнопольский | 29,7 | 231 879,0 | 7 807,4 | 143 738,2 | 4 839,7 |
| Всего | 1 778,9 | 6 887 811,6 | 3 872 | 11 686 820,6 | 6 569,7 |

Как видно из представленной таблицы, размер бюджетных инвестиций, направленных на объекты АИП в 2016 году (программная часть) в расчете на 1 жителя Ленинградской области, составляла от 136,5 руб. на человека – в Сланцевском районе, до 14 979,6 руб. на человека – в Волосовском районе. В среднем по Ленинградской области в 2016 году объем бюджетных инвестиций составил 3 872 руб. на 1 жителя.

В 2017 году планировалось направить бюджетные средства на капитальные объекты (программная часть АИП, без учета нераспределенных средств) в сумме 11 686 820,6 тыс. руб., что в среднем на 1 жителя области составит 6 569,7 руб.

По данным комитета финансов Ленинградской области по состоянию на 01.10.2017 исполнение адресной инвестиционной программы на 2017 год в целом составило 35,6% (4 588 373,3 тыс. руб. из 12 902 902,0 тыс. руб.)

На диаграммах №8 и №9, соответственно, представлены графические данные по размеру фактического (2016 год) и планового (2017 год) финансирования объектов капитального строительства в рамках программной части АИП (без учета нераспределенного остатка средств и без учета ПИР в рамках ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области») в расчете на каждого жителя Ленинградской области в разрезе районов Ленинградской области.

Диаграмма №8, руб. на 1 жителя



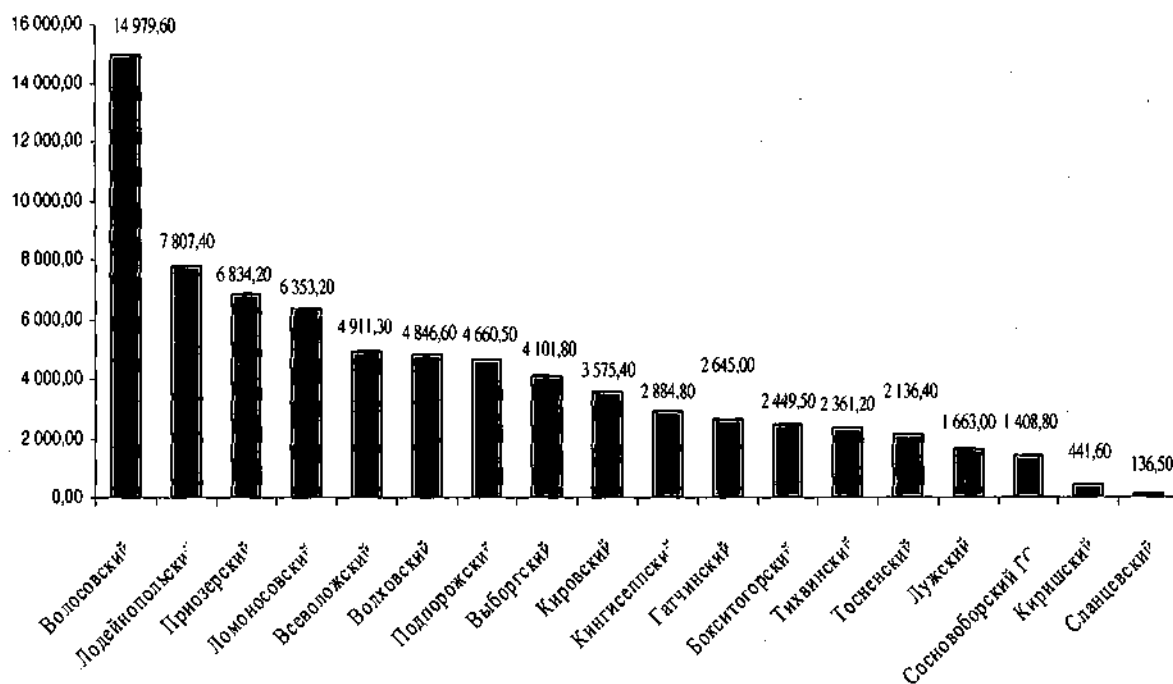


Диаграмма №9, руб. на 1 жителя

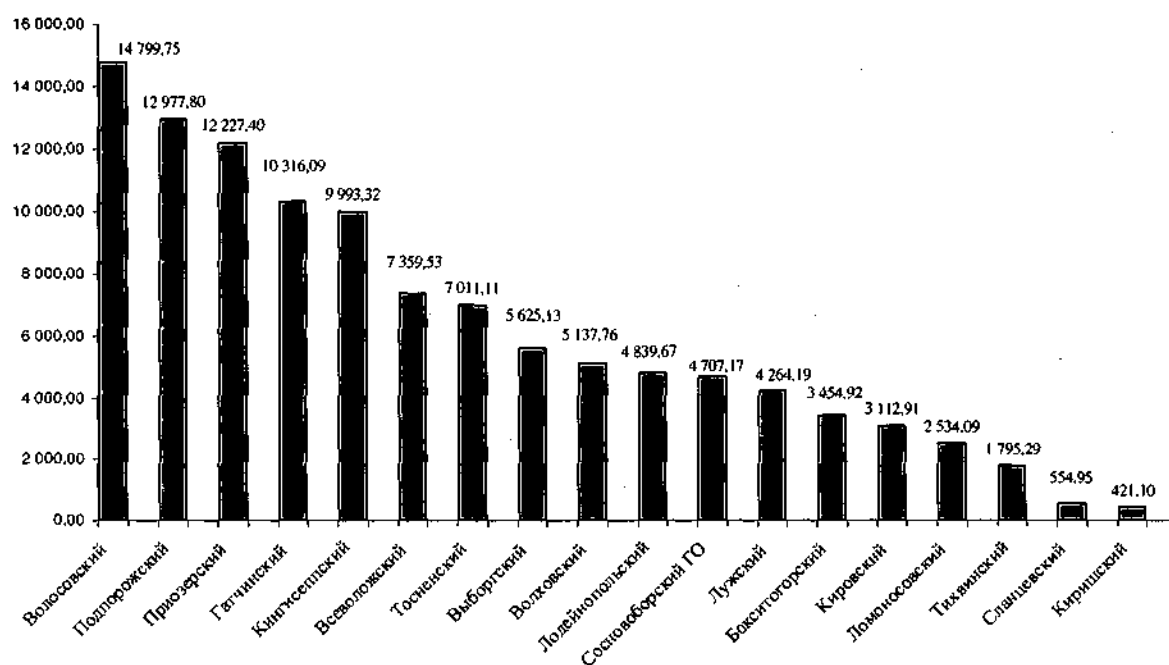

На диаграмме №10 представлены графические данные по размеру планового финансирования объектов АИП на 2017 год, также в расчете на каждого жителя Ленинградской области, в разрезе районов Ленинградской области, – без учета объема средств, предусмотренных на строительство перинатального центра в г. Гатчина.

Диаграмма №10, руб. на 1 жителя

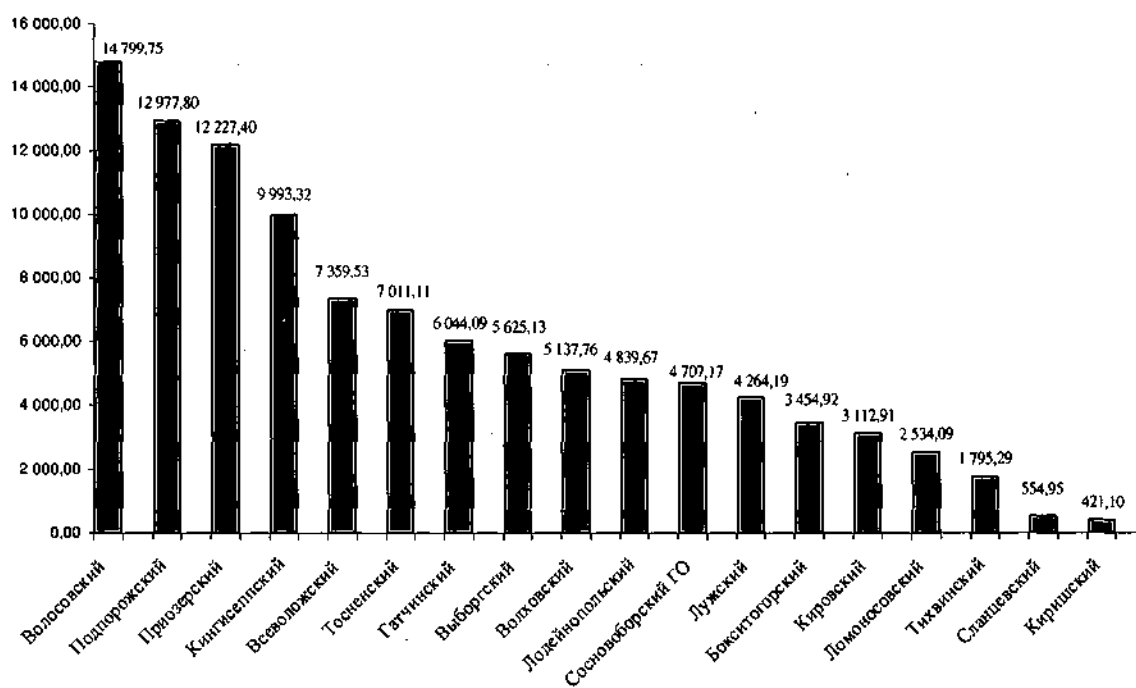

1.3. Анализ использования средств областного бюджета, выделенных на строительство детских садов Всеволожского района Ленинградской области, которые не введены в эксплуатацию или введены в эксплуатацию с нарушением сроков сдачи в 2015-2016 годах (по состоянию на 01.12.2017, с учетом изменений, внесенных областным законом от 31.10.2017 №67-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»)

Проверкой документов, представленных комитетом финансов Ленинградской области и комитетом по строительству Ленинградской области, было установлено, что не введены в эксплуатацию или введены в эксплуатацию с нарушением сроков сдачи в 2015-2016 годах 3 детских сада во Всеволожском районе Ленинградской области, включенных в адресную инвестиционную программу соответствующих лет:

- детский сад на 220 мест п. Янино-1;
- детский сад на 160 мест г. Всеволожск, ул. Героев, д.5;
- детский сад на 280 мест в дер.¹ Романовка.

Строительство указанных детских садов осуществлялось в рамках ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №398 (с последующими изменениями), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» (мероприятие 1.9. «Строительство и реконструкция объектов для организации дошкольного образования»), в соответствии с «Перечнем объектов строительства, реконструкции с применением энергоэффективных технологий и материалов, приобретения (выкупа)...», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 14.12.2015 №479 (с учетом изменений от 07.07.2016).

Строительство объектов осуществлялось с использованием средств областного бюджета на условиях софинансирования с привлечением средств местного бюджета Всеволожского муниципального района, посредством предоставления бюджету последнего субсидий.

Комитетом по строительству Ленинградской области с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ежегодно заключались соглашения о порядке предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на софинансирование объектов строительства, являющихся муниципальной собственностью, и включенных в государственную программу Ленинградской области.

¹ В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14.12.2015 №479 (с последующими изменениями)

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; бюджетополучатель – администрация Всеволожского муниципального района.

1.3.1. Строительство детского сада на 220 мест п. Янино-1

В соответствии с «Перечнем объектов строительства, реконструкции с применением энергоэффективных технологий и материалов, приобретения (выкупа)...», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 14.12.2015 №479 (с изменениями от 07.07.2016), на строительство детского сада в п. Янино-1 предусматривалось финансирование в объеме 367 164,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – в сумме 252 604,0 тыс. руб. (в том числе по годам: 2014 год – 39 733,0 тыс. руб., 2015 год – 147 112,0 тыс. руб., 2016 год – 65 759,0 тыс. руб.) и за счет средств местного бюджета – в сумме 114 560,0 тыс. руб. (в том числе по годам: 2014 год – 11 661,0 тыс. руб., 2015 год – 63 048,0 тыс. руб., 2016 год – 39 851,0 тыс. руб.).

Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 10.09.2013 №47-1-4-0216-13 и от 08.10.2013 №47-1-8-0665-13. Сметная стоимость строительства объекта в ценах 2013 года – 259 466,0 тыс. руб.

Контроль за ходом строительства детского сада осуществляло ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (договор от 30.10.2014 б/н, на безвозмездной основе).

Авторский надзор осуществлялся подрядной организацией – ООО ГК «СТК» (договор от 10.12.2015 №77/03-05; цена – 479,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета).

Адресной инвестиционной программой на 2014 год на строительство детского сада за счет средств областного бюджета было предусмотрено и перечислено в бюджет муниципального образования 39 733,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада на 220 мест МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области (муниципальный заказчик) был заключен 02 октября 2014 года №34/03-02/0145300005214000024-0238349-06 с ООО ГК «СТК».

Стоимость работ по контракту составила 241 701,7 тыс. руб.; с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 15.03.2016 №3/03/03-02, стоимость работ была увеличена на 10% и составила 265 871,9 тыс. руб. Срок выполнения работ – 02.01.2016.

Строительство объекта планировалось на условиях софинансирования с привлечением средств бюджета Всеволожского района.

На строительство объекта за счет средств областного бюджета АИП на 2015 год предусмотрено 147 112,0 тыс. руб.; перечислено в бюджет муниципального образования – 81 353,2 тыс. руб.; на 2016 год – 65 759,0 тыс. руб. Средства областного бюджета в сумме 65 759,0 тыс. руб., предусмотренные на строительство объекта, в 2016 году в бюджет муниципального образования перечислены не были.

В соответствии с информацией комитета по строительству Ленинградской области, средства областного бюджета в 2016 году в объеме 65 759,0 тыс. руб. не были освоены по причине судебных разбирательств с подрядной организацией (ООО ГК «СТК»). Данные средства были перечислены 16.06.2017 по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании задолженности с заказчика.

Строительство детского сада в п. Янино-1 было завершено в 2016 году. Объект своевременно не был введен в эксплуатацию в связи с отсутствием к нему свободного прохода и проезда.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от 13.10.2017 (№47-RU47504303-68/14-2014). Открытие сада состоялось в ноябре 2017 года.

Всего в 2014, 2015 и 2017 годах за счет средств областного бюджета на строительство детского сада перечислено 186 845,2 тыс. руб.

В ноябре-декабре 2015 года муниципальным заказчиком в целях оснащения детского сада инвентарем и оборудованием был заключен еще ряд муниципальных контрактов, в том числе: 8 муниципальных контрактов с ООО «Профбизнес» - на поставку оборудования (технологического оборудования, спортивного инвентаря, оснащения медицинского кабинета, ванн и пр.) на общую сумму 6 064,5 тыс. руб., 1 муниципальный контракт – с ООО «Тоговый дом «СпецТехМаш» на сумму 2 785,83 тыс. руб. – на поставку мебели. Оплата предусматривалась за счет средств местного бюджета.

По данным комитета по строительству Ленинградской области, всего выполнено работ на сумму 275 266,3 тыс. руб., из них строительно-монтажные работы по контракту составили 265 871,9 тыс. руб. (100%).

Вместимость – 220 мест, количество этажей – 3, общая площадь объекта – 5 781 м².

1.3.2. Строительство детского сада на 160 мест г. Всеволожск, ул. Героев, д.5

В соответствии с «Перечнем объектов строительства, реконструкции с применением энергоэффективных технологий и материалов, приобретения (выкупа)...», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 14.12.2015 №479 (с изменениями от 07.07.2016),

на строительство детского сада в г. Всеволожск (ул. Героев, д.5) предусматривалось финансирование в объеме 221 750,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – в сумме 144 868,0 тыс. руб. (в том числе по годам: 2014 год – 38 893,0 тыс. руб., 2015 год – 96 926,0 тыс. руб., 2016 год – 9 049,0 тыс. руб.) и за счет средств местного бюджета – в сумме 76 882,0 тыс. руб. (в том числе по годам: 2014 год – 11 000,0 тыс. руб., 2015 год – 41 540,0 тыс. руб., 2016 год – 24 342,0 тыс. руб.).

Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 12.11.2013 №47-1-4-0285-13 и от 14.02.2014 №47-1-7-0030-14. Сметная стоимость строительства объекта в ценах 2013 года – 190 705,0 тыс. руб.

Адресной инвестиционной программой на 2014 год на строительство детского сада за счет средств областного бюджета было предусмотрено 38 893,0 тыс. руб. Средства областного бюджета перечислены в бюджет муниципального образования в 2014 году в полном объеме.

Муниципальный контракт на строительство детского сада на 160 мест в г. Всеволожск, ул. Героев, д. 5 (без поставки технологического оборудования) заказчиком (МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области) был заключен от 06 августа 2014 года №28/03-02/0145300005214000006-0238349-02 с ЗАО «Альфа».

Строительство должно было осуществляться на условиях софинансирования с привлечением средств бюджета Всеволожского муниципального района.

Стоимость работ по контракту составляла 186 616,98 тыс. руб. С учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 30.10.2015 №68/03-02, стоимость работ составила 205 108,78 тыс. руб. Срок выполнения работ – 06.11.2015.

Контроль за ходом строительства детского сада осуществляло ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» (договор от 30.10.2014 б/н, на безвозмездной основе).

Авторский надзор осуществлялся ООО «Группа Олимп» (договор от 02.12.2014 №77/03-05; цена – 359,95 тыс. руб., за счет средств местного бюджета).

На строительство объекта за счет средств областного бюджета АИП на 2015 год предусмотрено 96 926 тыс. руб.; перечислено в бюджет муниципального образования 87 786,84 тыс. руб.; на 2016 год – 9 049,0 тыс. руб.

В соответствии с информацией комитета по строительству Ленинградской области, в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком – ЗАО «Альфа» финансирование строительно-монтажных работ в 2016 году не производилось.

Решение суда о взыскании задолженности с заказчика в размере 11 917,32 тыс. руб. принято 09.01.2017 (исполнительный лист от 13.02.2017). Оплата по исполнительному листу была произведена из местного бюджета 22.02.2017 в требуемом размере.

Областным законом от 31.10.2017 №67-оз «О внесении изменений в областной закон об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» лимиты на финансирование детского сада не предусмотрены.

Таким образом, всего в 2014-2015 годах на строительство детского сада в г. Всеволожск (ул. Героев д. 5) из областного бюджета перечислено 126 769,6 тыс. руб. В 2016 – 2017 годах финансирование объекта за счет средств областного бюджета не производилось.

В ноябре-декабре 2015 года муниципальным заказчиком было заключено еще 7 муниципальных контрактов с ООО «Профбизнес» - на поставку оборудования (технологического оборудования, спортивного инвентаря, мебели и общего оснащения, электроприборов, бытовой, компьютерной техники, игровых наборов и пр.) на общую сумму 4 468,52 тыс. руб. Оплата производилась за счет средств местного бюджета.

Вместимость сада – 160 мест, количество этажей - 3, общая площадь объекта – 5 091,09 м².

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 12.12.2016, в настоящее время детский сад функционирует в штатном режиме.

1.3.3. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в дер. Романовка

В соответствии с «Перечнем объектов строительства, реконструкции с применением энергоэффективных технологий и материалов, приобретения (выкупа)...», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 14.12.2015 №479 (с изменениями от 07.07.2016), на строительство детского сада в дер. Романовка предусматривалось финансирование в объеме 276 237,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – в сумме 193 366,8 тыс. руб. (в том числе по годам: 2015 год – 30 000,0 тыс. руб., 2016 год – 50 000,0 тыс. руб., 2017 год – 113 366,8 тыс. руб.) и за счет средств местного бюджета – в сумме 82 871,0 тыс. руб. (в том числе по годам: 2015 год – 12 857,0 тыс. руб., 2016 год – 21 429,0 тыс. руб., 2017 год – 48 585,0 тыс. руб.).

Положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 14.11.2014 №47-1-4-0258-14 и от 12.12.2014 №47-1-7-0422-14. Сметная стоимость строительства объекта в ценах 2014 года – 291 834,0 тыс. руб.

Адресной инвестиционной программой на 2015 год на строительство детского сада за счет средств областного бюджета предусмотрено и перечислено в бюджет района 30 000,0 тыс. руб.

Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада в дер. Романовка Всеволожского района на 280 мест был заключен заказчиком (МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области) с ООО «Группа ABC» от 21.07.2015 №27/03-02/0145300005215000118-0238349-03.

Стоимость работ по контракту составила 250 103,4 тыс. руб., с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 24.10.2016, стоимость работ составила 274 712,9 тыс. руб.

Строительство объекта предусматривалось на условиях софинансирования с привлечением средств местного бюджета.

Срок завершения работ – декабрь 2016 года.

АИП на 2016 год на строительство объекта предусмотрено 50 000,0 тыс. руб.; перечислено в бюджет муниципального образования – 47 966,22 тыс. руб.

В 2017 году на строительство детского сада за счет средств областного бюджета выделено 64 809,0 тыс. руб. (с учетом изменений от 31.10.2017).

Средства областного бюджета в сумме 64 809,0 тыс. руб. в бюджет муниципального образования по состоянию на 01.12.2017 не перечислены.

В соответствии с информацией комитета по строительству Ленинградской области с февраля 2017 года работы на объекте не ведутся. Строительная готовность – 46%. Выполнено устройство внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, кровли, благоустройство.

На основании уведомления заказчика от 16.02.2017 в адрес подрядчика контракт расторгнут с 27.02.2017 в одностороннем порядке в связи с невыполнением в срок работы подрядчиком (акт невыполненных работ от 21.12.2016, решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 02.02.2017).

Решением арбитражного суда от 08.06.2017 расторжение контракта в одностороннем порядке признано недействительным.

Постановлением апелляционного суда решение суда оставлено в силе (07.11.2017 решение вступило в законную силу), расторжение контракта признано недействительным. Ожидается возобновление работ ООО «Группа ABC».

В 2015-2016 годах за счет средств областного бюджета на финансирование объекта перечислены денежные средства в сумме 77 966,2 тыс. руб.

В рамках проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия вопрос о соблюдении порядка предоставления субсидий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» и их расходования, не рассматривался.

В рамках проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Ленинградской области был проведен краткий анализ прогнозной потребности обеспечения детей Ленинградской области дошкольным образованием в муниципальных детских дошкольных образовательных учреждениях, а также в детских дошкольных отделениях иных муниципальных учреждений и организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

По результатам проведенного анализа следует отметить следующее.

Согласно данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, общая **прогнозная потребность** в дополнительных местах в детских дошкольных образовательных учреждениях Ленинградской области на 2018-2020 годы составит 13 846 мест.

Самая сложная ситуация с обеспечением детей дошкольным образованием в дошкольных учреждениях сложилась во Всеволожском районе Ленинградской области. Прогнозная потребность в местах на 2018 – 2020 годы в этом муниципальном районе составит 7 150 мест. (51,6% от общей прогнозной потребности в целом по Ленинградской области).

По данным системы «Электронный детский сад» по состоянию на 01.01.2017 **на очередь** в детские дошкольные учреждения Всеволожского района записано 18 860 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 5 313 детей. (информация размещена на официальном сайте Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, электронный адрес: <http://komitet.vsevcit.ru/publicnyj-otchet/>, Публичный отчет Комитета от 03.03.2017, стр.5).

Согласно постановлению администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 28.03.2017 №735 в дошкольные образовательные учреждения Всеволожского района, например, на 2016-2017 учебный год имелось только 2 656 свободных мест.

Исходя из наличия в каждом из детских дошкольных учреждений, например, по 280 мест, в течение указанных 3-х лет необходимо построить (приобрести) еще 50 таких учреждений ($13\ 846\ \text{мест} : 280\ \text{мест} = 49,5$)

Сметная стоимость строительства детского сада на 280 мест, например, в дер. Романовка Всеволожского района в ценах 2014 года составляла 291 834,0 тыс. руб.

Таким образом, стоимость 1 места в новом (построенном) дошкольном образовательном учреждении, даже в ценах 2014 года, составляла более 1 млн. руб.

Решение вопроса с обеспечением детей дошкольным образованием до 2020 года посредством строительства (приобретения) новых дошкольных образовательных учреждений потребует капитальных вложений в сумме более 14 млрд. руб. (50 учреждений x 291 834,0 тыс. руб. = 14 591 700,0 тыс. руб.), из них более 5 млрд. руб. (1 млн. руб. x 5 313 детей) – только на Всеволожский район.

АИП на 2017 год в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области» предусмотрено продолжение строительства детских садов во Всеволожском районе: на 280 мест в пос. Романовка, на 220 мест в пос. Янино-1, на 160 мест в г. Всеволожск (ул. Героев, д. 5) и начало строительства 2 новых детских садов в г. Всеволожск: на 220 мест в (Торговый пр.) и на 140 мест (ул. Победы).

На строительство детского сада в г. Всеволожск на 220 мест (Торговый пр.) в 2017 году предусмотрено 130 960,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование составило 42 121,2 тыс. руб. (32,1%).

На строительство детского сада в г. Всеволожск на 140 мест (ул. Победы) в 2017 году предусмотрено 62 244,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование составило 36 497,3 тыс. руб. (58,6%).

На строительство детского сада в пос. Янино-1 на 220 мест в 2017 году направлено средств областного бюджета в сумме 65 759,0 тыс. руб. (100% от плана). Детский сад в п. Янино-1 введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года. На строительство объекта за весь период его строительства (2014 – 2017 годы) за счет средств областного бюджета израсходовано 186 845,2 тыс. руб., без учета софинансирования за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район».

Детский сад в г. Всеволожск (ул. Героев д.5) на 160 мест введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. На его строительство в 2014-2015 годах за счет средств областного бюджета израсходовано 126 769,6 тыс. руб., также без учета софинансирования за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район». Финансирование объекта осуществлялось в период с 2014 по 2017 год (2016, 2017 год – за счет средств бюджета Всеволожского района).

Финансирование детских садов в пос. Романовка и в г. Всеволожск (ул. Героев, д. 5) в 2017 году за счет средств областного бюджета не осуществлялось.

Подпрограммой «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» на 2017 год также был предусмотрен выкуп (приобретение) детских дошкольных образовательных учреждений во Всеволожском районе на общую сумму 660 792,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 в рамках реализации подпрограммы произведено финансирование на общую сумму 660 345,0 тыс. руб., в том числе на:

- приобретение дошкольного образовательного учреждения (организации) на 190 мест в микрорайоне Южный Всеволожского района в сумме 217 970,9 тыс. руб. (при плане в размере 218 418,3 тыс. руб.);

- приобретение детского дошкольного учреждения на 240 мест, с оборудованием, по адресу: Ленинградская область, пос. Мурино, ул. Шоссе Лаврики, д.87, корп. 1 в сумме 142 444,8 тыс. руб. (100% от плана);

- приобретение помещения ДООУ на 110 мест, с оборудованием, по адресу: Ленинградская область, д. Кудрово, просп. Европейский, д. 5 на сумму 86 300,0 тыс. руб. (100% от плана);

- приобретение детского дошкольного учреждения на 240 мест, с оборудованием, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, проезд. Березовая роща, д.9 на сумму 213 628,8 тыс. руб. (100% от плана).

Всего на строительство и приобретение детских садов в рамках рассматриваемой подпрограммы за счет средств областного бюджета на 2017 год предусмотрено 1 448 470,9 тыс. руб., в том числе на дошкольные образовательные учреждения Всеволожского района (строительство и приобретение) – в сумме 1 042 171,4 тыс. руб. (72% от общего объема предусмотренных на эти цели средств).

Фактическое финансирование объектов по состоянию на 01.10.2017 составило 804 722,5 тыс. руб. Весь объем финансирования направлен на строительство и приобретение объектов дошкольного образования Всеволожского района.

Кроме того, АИП на 2017 год в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» предусмотрено строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Кудрово», участок №2 (квартал 4, участок 4-13). На эти цели АИП на 2017 год предусмотрено 58 659,7 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 8 571,4 тыс. руб. (14,6%).

Всего по состоянию на 01.10.2017 за счет средств областного бюджета на строительство и приобретение детских дошкольных учреждений во Всеволожском районе в рамках АИП на 2017 год направлено 813 293,9 тыс. руб. Это сумма затрат без учета средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район».

Исходя из содержания отчета об исполнении АИП на 2017 год по состоянию на 01.10.2017, ввод в эксплуатацию строящихся детских дошкольных образовательных учреждений во Всеволожском районе в 2017 году не предусматривается.

Согласно проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение №11) на реализацию в 2018 году подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области» ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области» в части строительства трех дошкольных образовательных учреждений во Всеволожском районе предусмотрено выделение 343 млн. руб., в том числе:

- на 220 мест в г. Всеволожске, Торговый проспект;
- на 140 мест в г. Всеволожске, ул. Победы;
- на 280 мест в пос. Романовка.

Сведения о финансировании строительства во Всеволожском муниципальном районе детских дошкольных учреждений в 2019-2020 годах в указанном проекте отсутствовали.

В 2016 – 2017 годах после завершения строительства введено в эксплуатацию два детских сада (п. Янино-1) на 220 мест и в г. Всеволожск (ул. Героев, д. 5) на 160 мест. Приобретено в муниципальную собственность Всеволожского района в 2017 году еще 5 детских садов с общим количеством – 890 мест. Итого – 1 270 мест.

При условии ввода всех указанных выше объектов в эксплуатацию до 2020 года, посредством строительства и приобретения детских дошкольных образовательных учреждений, увеличится число новых мест в учреждениях Всеволожского района до 1 910.

Прогнозная потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях в районе к 2020 году ожидается в количестве 7 150 мест.

Как было отмечено выше, на строительство и приобретение дошкольных образовательных учреждений во Всеволожском районе в 2017 году предусмотрено 1 042 171,4 тыс. руб. Строительство детских садов в пос. Романовка, Янино-1 и г. Всеволожск (ул. Героев, д. 5) осуществлялось 2-3 года.

Во Всеволожском районе в 2016 году основную общеобразовательную программу дошкольного образования осваивало 11 139 детей, т.е. каждый седьмой ребенок, охваченный дошкольным образованием в Ленинградской области, проживает во Всеволожском районе.

Согласно содержанию отчета об исполнении консолидированного бюджета Ленинградской области за 2016 год (форма по ОКУД 05003317), на дошкольное образование в 2016 году израсходовано 11 043,3 млн. руб., в том числе капитальные вложения в объекты дошкольного образования составили 694,5 млн. руб. (6,3%).

В соответствии с публичным отчетом комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 03.03.2017 (размещен на официальном сайте администрации района, адрес: vsevreg.ru) в 2016 году на приобретение в муниципальную собственность помещений дошкольных учреждений направлено 125,0 млн. руб. (в 2015 году на указанные цели израсходовано 417,18 млн. руб.); на строительство дошкольных учреждений – 412,3 млн. руб. (в 2015 году – 478,7 млн. руб.).

Всего в 2016 году на приобретение и строительство дошкольных учреждений во Всеволожском районе за счет средств консолидированного бюджета израсходовано 537,3 млн. руб.

Таким образом, в 2016 году строительство и приобретение в муниципальную собственность дошкольных учреждений наиболее интенсивно осуществлялось на территории Всеволожского муниципального района.

Кроме того, как следовало из содержания указанного публичного отчета, во Всеволожском районе в 2016 году начало осуществлять свою деятельность МДОБУ «Муринский ДСКВ №1» на 240 мест (п. Мурино). В 2016 году здание детского сада использовалось на основании договора безвозмездного пользования, заключенного между учреждением и собственником имущества – застройщиком ЗАО «Унисто». АИП на 2017 год был предусмотрен выкуп указанного объекта. По состоянию на 01.10.2017 за счет средств областного бюджета перечислено 142 444,8 тыс. руб. (100% от плана).

В 2016 году открылось второе дошкольное отделение на 110 мест в МОБУ «Кудровская средняя образовательная школа №1». Школа осуществляет свою деятельность в здании, собственником которого является ЗАО «РТ «Петербургская недвижимость». Эксплуатация этого здания также осуществлялась на основании договора безвозмездного пользования. АИП на 2017 год был предусмотрен выкуп данного объекта у застройщика. По состоянию на 01.10.2017 за счет средств областного бюджета перечислено 86 300,5 тыс. руб. (100% от плана).

Согласно публичному отчету комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» в районе ведется работа по расширению форм и способов получения детьми дошкольного образования, например, путем создания групп кратковременного пребывания (без организации питания и сна), семейных групп, предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Создаются дополнительные места в действующих дошкольных и школьных образовательных учреждениях путем укомплектования дополнительной мебелью, инвентарем и оборудованием помещений с изменением их функционального назначения (например, 25 мест в МДОУ

«ДСКВ №12» в пос. Романовка; 50 мест в МДОБУ «Агалатовский ДСКВ», 26 мест в МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (дошкольное отделение)).

Путем укомплектования дополнительной мебелью помещений с изменением их функционального назначения, создано еще 137 дополнительных мест в зданиях дошкольных учреждений, приобретенных в муниципальную собственность в 2015 году.

Согласно данным отчета о социально-экономическом развитии Всеволожского района, также размещенном на официальном сайте администрации, на территории района осуществляют деятельность 2 частных дошкольных организации: детский сад-клуб «Чадорадо» и «Центр семейного воспитания и образования» (д. Порошкино), которые посещают 51 ребенок.

По данным Петростата численность воспитанников в организациях, осуществлявших дошкольную образовательную деятельность в 2016 году, составляла 77,6 тысяч.

По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, содержание одного ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении (с учетом внебюджетных средств) в среднем составляла 152 тыс. руб. в год.

1.4. Информация об итогах реализации адресной инвестиционной программы, финансируемой за счет средств областного бюджета за 9 месяцев 2017 года


В соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.12.2016 №90-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 17.07.2017), на реализацию АИП за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 2017 году было предусмотрено 12 902 902,0 тыс. руб., что на 37,3% больше первоначально утвержденного объема средств на 2017 год (9 396 283,2 тыс. руб.), на 26% больше планового показателя 2016 года (10 244 156,0 тыс. руб.) и в 1,9 раза больше фактического уровня финансирования 2016 года (6 989 871 тыс. руб.) – максимального достигнутого показателя за последние истекшие 4 года.

Программная часть АИП на 2017 год запланирована в сумме 12 762 902,0 тыс. руб., непрограммная часть – 140 000,0 тыс. руб.

Структура АИП на 2017 год, как и в 2016 году, формировалась на основе 11 государственных программ Ленинградской области и непрограммной части.

Удельный вес бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию программной части АИП на 2017 год (плановые назначения), в разрезе государственных программ Ленинградской области представлен на диаграмме №11.

Диаграмма №11

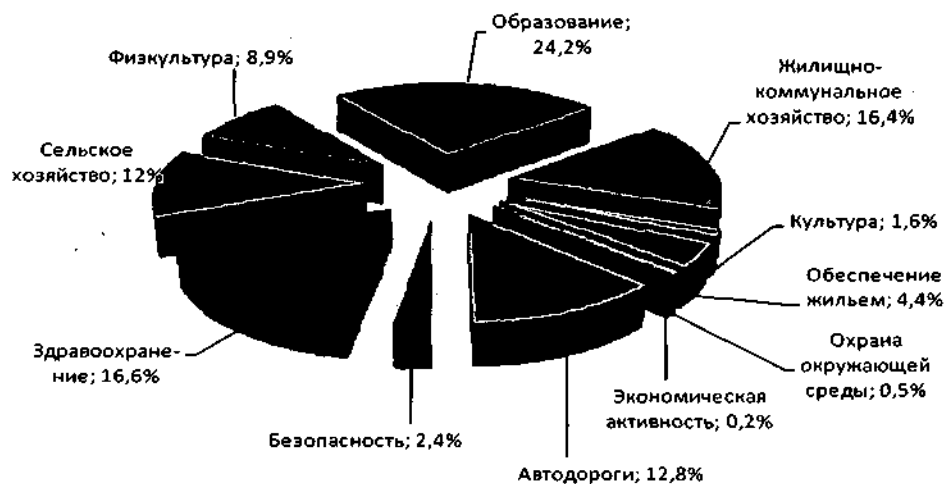

Как видно из диаграммы №11, как и в 2016 году, наибольший удельный вес плановых бюджетных ассигнований АИП на 2017 год приходился на реализацию мероприятий государственных программ Ленинградской области: «Современное образование Ленинградской области», «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» и «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Следует отметить снижение плановых расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» по сравнению с 2016 годом (-9,6%).

Исполнение АИП за счет средств областного бюджета Ленинградской области по итогам 9 месяцев 2017 года составило 4 588 373,2 тыс. руб. или 35,6% от планового показателя на 2017 год (12 902 902,0 тыс. руб.), в т.ч. по программной части – 35,8% (4 565 768,5 тыс. руб. при плане в размере 12 762 902,0 тыс. руб.), по непрограммной части – 16,1% (22 604,8 тыс. руб. при плане 140 000,0 тыс. руб.).

По итогам работы за аналогичный период 2016 года (9 месяцев) уровень исполнения (финансирования) АИП составлял 32,4% (4 027 955,3 тыс. руб. при плане на год (по состоянию на 01.10.2016) в размере 12 437 986,5 тыс. руб.).

Следует отметить, что областным законом от 31.10.2017 №67-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019


годов», АИП за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2017 год была изложена в новой редакции.

В результате внесенных в октябре изменений, объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий АИП на 2017 год, в целом сократился на 1 109 477,6 тыс. руб. (-8,6%).

Информация об исполнении мероприятий АИП в разрезе государственных программ и главных распорядителей средств областного бюджета, по состоянию на 01.10.2017, и с учётом изменений, внесённых областным законом от 31.10.2017 №67-оз, приведена в таблице приложения №2 к настоящему Заклучению.

Информация об уровне исполнения **программной** части АИП по итогам 9 месяцев 2017 года в разрезе государственных программ Ленинградской области представлена на диаграмме №12.

Диаграмма №12

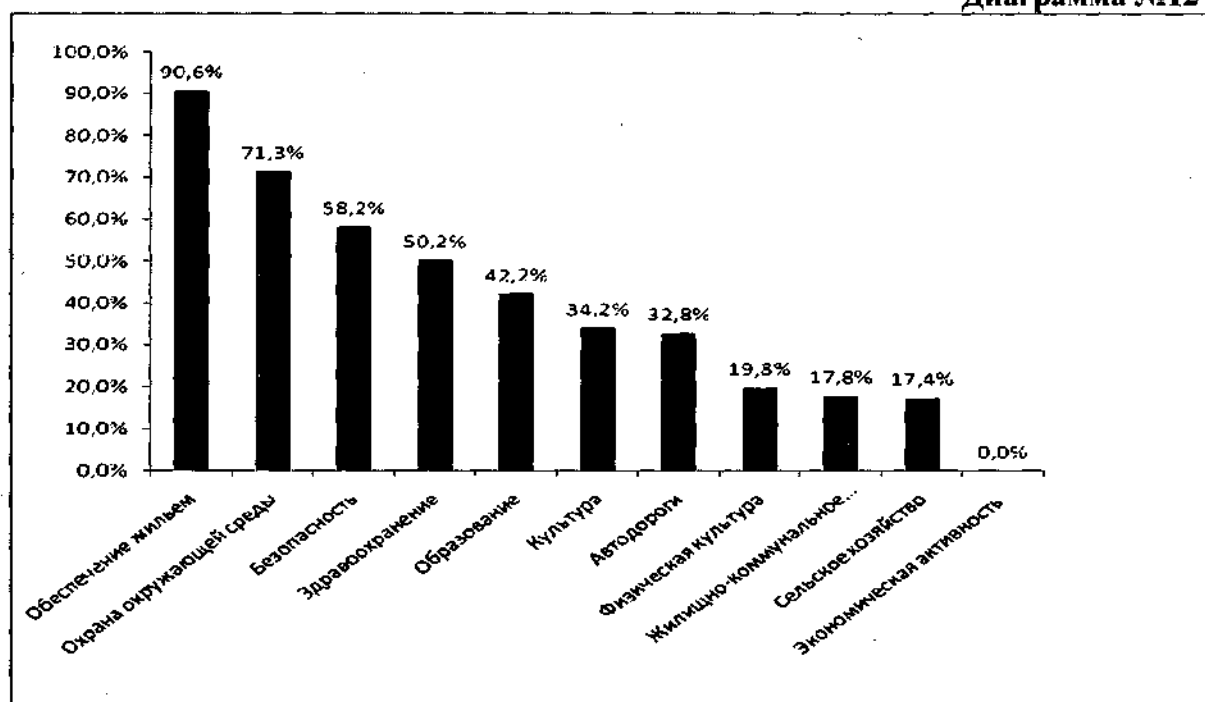

Как видно из диаграммы №12, по состоянию на 01.10.2017, финансирование объектов АИП на 2017 год в рамках ГП ЛО «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» не производилось. Программой предусматривалось строительство нового и реконструкция существующего зданий под размещение бизнес-инкубаторов в г. Всеволожск и пос. Тайцы Гатчинского района. На указанные цели за счет средств областного бюджета предусматривалось выделение 20 000,0 тыс. руб. (7 000,0 тыс. руб. и 13 000,0 тыс. руб., соответственно).

АИП на 2016 год, в рамках реализации указанной государственной программы предусматривалось строительство только 1 объекта – здания

под размещение бизнес-инкубатора в г. Всеволожск (выделено 10 000,0 тыс. руб.). Исполнение по программе в 2016 году не числилось.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предназначенных на строительство бизнес-инкубаторов сокращен на 13 776,2 тыс. руб. (-68,9%).

Финансирование трех государственных программ Ленинградской области – «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» – составило менее 20%.

1.4.1. ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

Исполнение мероприятий АИП на 2017 год в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года») по итогам 9 месяцев 2017 года составило 17,4% (266 461,1 тыс. руб.).

В рамках государственной программы в 2017 году планировалось финансирование проектирования, строительства и реконструкции 82 объектов здравоохранения, культуры, спорта, автомобильных дорог и инженерных сетей (объекты газоснабжения, водоснабжения и водоотведения), расположенных в сельской местности, на общую сумму 1 535 699,8 тыс. руб.

В 2017 году по 48 объектам АИП с общей суммой плановых назначений в размере 473 303,9 тыс. руб. (расположенным в Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Тосненском, Кингисеппском, Кировском и Приозерском районах Ленинградской области), входящих в состав рассматриваемой государственной программы, финансирование по состоянию на 01.10.2017 не осуществлялось, в том числе по:

- **28 объектам газоснабжения** на общую сумму плановых назначений в размере 56 113,4 тыс. руб. (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, получатели средств областного бюджета – администрации 18 сельских поселений Волховского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского районов, администрации Гатчинского и Кингисеппского районов).

АИП на 2017 год, по состоянию на 01.10.2017, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» было предусмотрено проектирование и строительство 35 объектов газификации на общую сумму 100 542,0 тыс. руб. По состоянию на указанную дату финансирование составило 18 214,8 тыс. руб. (18,1%);

- **4 объектам дорожного хозяйства** на общую сумму 169 900,1 тыс. руб. (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, получатели средств – администрации Волховского и Выборгского района, администрация Каменногорского городского поселения Выборгского района).

АИП на 2017 год, по состоянию на 01.10.2017, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» на подъезды к сельским населенным пунктам Волховского, Выборгского и Приозерского районов было выделено 304 613,6 тыс. руб. По состоянию на указанную дату финансирование составило 38 495,4 тыс. руб. (12,6%);

- **4 объектам водоснабжения и водоотведения** на общую сумму 17 305,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области; получатели – администрации 4 сельских поселений Волосовского, Кировского, Лодейнопольского и Лужского районов).

АИП на 2017 год, по состоянию на 01.10.2017, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусматривалось строительство и реконструкция 7 объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 146 880,1 тыс. руб. По состоянию на указанную дату финансирование составило 8 185,0 тыс. руб. (5,6%);

- **6 объектам здравоохранения** (проектные работы, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории) – на общую сумму 59 682,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств – комитет по строительству Ленинградской области; получатель – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»);

- **3 объектам спортивного назначения** – на общую сумму 21 784,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств – комитет по строительству Ленинградской области; получатели – администрации Гатчинского, Тосненского районов, Бережковского сельского поселения Волховского района);

- **2 объектам по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку** (инженерные сети, д. Истинка Гатчинского района) – на общую сумму 99 284,4 тыс. руб. (главный распорядитель средств – комитет по строительству Ленинградской области; получатель – администрация Гатчинского района);

- 1 объекту культуры на сумму 49 235,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств – комитет по строительству Ленинградской области; получатель – администрация Аннинского сельского поселения Ломоносовского района).

Кроме того, по состоянию на 01.10.2017, по 2 объектам программы (объекты спорта) на общую сумму в размере 28 053,0 тыс. руб. финансирование составило 1% от плана (292,0 тыс. руб.). Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области, получатели средств – администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского района и Кикеринского сельского поселения Волосовского района.

До 5% от планового показателя составило финансирование еще 3 объектов программы, из которых 2 объекта здравоохранения на общую сумму 166 873,0 тыс. руб. Общая сумма финансирования по состоянию на 01.10.2017 составила 6 635,6 тыс. руб. (3,9%). Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области, получатель средств – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Уровень финансирования еще 1 объекта (объект газификации, в том числе проектные работы) за 9 месяцев 2017 года составил 2,2% - 272,0 тыс. руб. из предусмотренных на эти цели 12 061,0 тыс. руб. Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, получатель средств – администрация Путиловского сельского поселения Кировского района.

Финансирование строительства спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на 40 человек в пос. Плодовое Приозерского района по итогам 9 месяцев 2017 года составило 6% - 3 912,5 тыс. руб. при плане в размере 65 522,0 тыс. руб. Главный распорядитель средств – комитет по строительству Ленинградской области, получатель – администрация Плодовского сельского поселения.

До 10% от планового показателя составило финансирование 2 объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 124 400,1 тыс. руб. Общая сумма финансирования по состоянию на 01.10.2017 составила 7 142,2 тыс. руб. (в среднем – 5,7%). Главный распорядитель средств – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, получатели средств – администрации Романовского сельского поселения Всеволожского района и Мельниковского сельского поселения Приозерского района.

На уровне 18-19% произведено финансирование 2 объектов дорожного хозяйства – подъездов к сельским населенным пунктам – при плане на общую сумму 92 036,1 тыс. руб. фактическое финансирование за 9 месяцев 2017 года составило 17 319,1 тыс. руб. Главный распорядитель средств – комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области,

получатели средств – администрации Селезневского сельского и Советского городского поселений Выборгского района.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предназначенных в рамках рассматриваемой государственной программы на объекты АИП, был сокращен только на 157 971,0 тыс. руб. (-10,3%).

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения государственной программы по объектам АИП за 9 месяцев увеличился с 17,4% до 19,3%.

Как показал анализ АИП за 2016 год и 9 месяцев 2017 года, а также предыдущие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проведенные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области, администрации сельских поселений муниципальных образований Ленинградской области (получатели средств областного бюджета на капитальные объекты муниципальной собственности, находящиеся в их компетенции – в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») не в полной мере справлялись с функциями муниципальных заказчиков, что соответствующим образом отражалось на уровне исполнения АИП.

1.4.2. ГП ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

Уровень финансирования государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», по состоянию на 01.10.2017, составил 17,8% (373 971,2 тыс. руб. при плановых назначениях на реализацию мероприятий программы в сумме 2 097 079,2 тыс. руб.)

АИП на 2017 год в рамках государственной программы планировалось проектирование, строительство и реконструкция 160 объектов жилищно-коммунального хозяйства (газификации, водоснабжения и водоотведения, газовых блочно-модульных котельных).

Из 160 объектов, включенных в АИП на 2017 год в рамках реализации государственной программы, по состоянию на 01.10.2017, по 114 объектам на общую сумму 1 083 592,0 тыс. руб. (51,7% от общего объема) финансирование не осуществлялось.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предназначенных на проектирование, строительство и

реконструкцию объектов АИП на 2017 год в рамках ГП ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», был сокращен на 374 368,4 тыс. руб. (-17,8%).

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения (финансирования) государственной программы за 9 месяцев увеличился с 17,8% до 21,7%.

Как и в 2016 году, структура государственной программы в части объектов, включенных в АИП на 2017 год, была представлена тремя подпрограммами:

- **«Газификация Ленинградской области»** (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, получатели средств областного бюджета – администрации городских и сельских поселений муниципальных образований Ленинградской области, администрации Бокситогорского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Лужского, Подпорожского, Тосненского районов и Сосновоборского городского округа Ленинградской области).

АИП на 2017 год в рамках реализации подпрограммы «Газификация Ленинградской области» было предусмотрено проектирование и строительство 107 объектов газификации на общую сумму 960 727,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование подпрограммы составило 199 195,8 тыс. руб. (20,7%).

Из 107 объектов газификации, предусмотренных в рамках подпрограммы АИП на 2017 год, по 73 объектам на сумму 425 094,0 тыс. руб. по состоянию на указанную дату финансирование не производилось.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предназначенных на проектирование и строительство объектов газификации в рамках подпрограммы, был сокращен на 288 420,2 тыс. руб. (-30%).

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения подпрограммы за 9 месяцев увеличился с 20,7% до 29,6%;

- **«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области»** (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, получатели средств областного бюджета – ГУП «Водоканал Ленинградской области», администрации городских и сельских поселений муниципальных образований Ленинградской области, администрации Волосовского,

Всеволожского, Гатчинского, Кировского, Приозерского и Тосненского районов Ленинградской области).

АИП на 2017 год в рамках реализации подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» было предусмотрено строительство и реконструкция 49 объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму 1 055 529,5 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование подпрограммы составило 130 283,0 тыс. руб. (12%).

Из 49 объектов водоснабжения и водоотведения, предусмотренных в рамках подпрограммы АИП на 2017 год, по 40 объектам на общую сумму 649 578,9 тыс. руб. по состоянию на указанную дату финансирование не производилось.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предназначенных на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы, был сокращен на 77 029,0 тыс. руб. (-7,3%).

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения подпрограммы за 9 месяцев увеличился с 12% до 13,3%;

- **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области»** (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области, получатель средств областного бюджета – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»).

В рамках подпрограммы АИП на 2017 год было предусмотрено завершение строительства 4 газовых блочно-модульных котельных (ГБМК) на общую сумму плановых назначений 80 822,7 тыс. руб., в том числе:

- 32 579,5 тыс. руб. – ГБМК для ГКОУ ЛО «Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат», п. Ефимовский (Бокситогорский район); по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 18 672,5 тыс. руб. (57,3% от плана);

- 3 324,0 тыс. руб. – ГБМК для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» в п. Вырица (Гатчинский район); по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 3 323,0 тыс. руб. (практически 100%);

- 36 000,0 тыс. руб. – ГБМК для ГОУ ЛО «Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат» в п. Мга (Кировский район); по состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта составило 22 496,8 (62,5%);

- 8 919,2 тыс. руб. – ГБМК для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница», пос. Ульяновка (Тосненский район).

По состоянию на 01.10.2017 произведено финансирование трех котельных на сумму 44 492,4 тыс. руб. (55%).

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели, сокращен на 8 919,2 тыс. руб. (-8,9%). Из АИП на 2017 год исключен 1 объект с плановыми бюджетными назначениями в сумме 8 919,2 тыс. руб. – «Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО «Ульяновская областная психиатрическая больница».

Объект введен в эксплуатацию в марте 2017 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 17.03.2017 №47-RU47517106-581-2016). Строительство объекта было начато в 2013 году. За весь период строительства (по состоянию на 15.12.2017) финансирование объекта за счет средств областного бюджета составило 87 461,7 тыс. руб. Строительство продолжалось 5 лет.

В 2013-2014 годах Контрольно-счётной палатой Ленинградской области были проведены проверки использования средств областного бюджета, выделенных на строительство ГБМК и теплотрасс для теплоснабжения следующих образовательных учреждений: ГОУ ЛО «Мгинская специальная школа-интернат», ГОУ ЛО «Ефимовская специальная коррекционная школа-интернат», ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк».

Строительство указанных выше трех котельных было начато в 2011 году.

За весь период строительства ГБМК и теплотрасс ГОУ ЛО «Ефимовская специальная коррекционная школа-интернат», по состоянию на 15.12.2017, за счет средств областного бюджета было направлено 78 052,1 тыс. руб. На момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия работы на объекте не завершены. Планируемый срок окончания работ – до конца 2017 года.

За весь период строительства ГБМК и теплотрасс ГОУ ЛО «Мгинская специальная школа-интернат», по состоянию на 15.12.2017, за счет средств областного бюджета было направлено 66 943,9 тыс. руб. Планируемый срок окончания работ – также до конца 2017 года.

На строительство ГБМК для ГОУ ДОД ДООЦ «Маяк» за счет средств областного бюджета было израсходовано 52 473,7 тыс. руб. Объект введен в эксплуатацию в июне 2017 года (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 02.06.2017 №RU47506101-011/17).

Таким образом, строительство указанных выше трех объектов продолжалось более 6 лет; 2 объекта – ГБМК ГОУ ЛО «Ефимовская специальная коррекционная школа-интернат» и ГБМК ГОУ ЛО «Мгинская специальная школа-интернат» до настоящего времени в эксплуатацию не введены.

Проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020

годов», АИП на 2018 год в рамках рассматриваемой подпрограммы, средств областного бюджета на завершение строительства котельных не предусмотрено.

1.4.3. ГП ЛО «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»

Финансирование мероприятий АИП на 2017 год, предусмотренных в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области») по итогам 9 месяцев 2017 года составило 19,8% (223 826,2 тыс. руб. при плане в размере 1 130 640,2 тыс. руб.).

В рамках государственной программы в 2017 году планировалось финансирование строительства и реконструкции 16 объектов спортивного назначения, расположенных в сельской местности, на общую сумму 1 069 640,2 тыс. руб. (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области, получатели средств – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», администрации 3 городских и сельских поселений муниципальных районов Ленинградской области, администрации 6 муниципальных районов).

Из 16 запланированных к строительству и реконструкции объектов, в 2017 году, по состоянию на 01.10.2017, по 5 объектам АИП с общей суммой плановых назначений в размере 351 440,1 тыс. руб. (во Всеволожском, Выборгском, Кингисеппском, Приозерском районах и Сосновоборском городском округе), входящих в состав рассматриваемой государственной программы, финансирование не осуществлялось.

На уровне 3,9% по состоянию на 01.10.2017 профинансирована реконструкция стадиона «Локомотив» (3 113,0 тыс. руб. при плане 79 162,6 тыс. руб.); на уровне 12,5% (19 443,5 тыс. руб. при плане 155 405,0 тыс. руб.) профинансировано строительство тренировочной площадки на стадионе в пос. Рошино Выборгского района.

Кроме того, в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» (АИП на 2017 год) были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 61 000,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области) на приобретение физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Вистино Кингисеппского района. По состоянию на 01.10.2017 средства на приобретение объекта израсходованы не были.

В целом по государственной программе, по состоянию на 01.10.2017 не осуществлялось финансирование 17 объектов (включая выкуп объекта) на общую сумму 412 440,1 тыс. руб.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предназначенных в рамках государственной программы на объекты АИП, был сокращен на 197 764,7 тыс. руб. (-17,5%).

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения государственной программы за 9 месяцев в части объектов АИП увеличился с 19,8% до 24%.

1.4.4. ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»

Государственная программа «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»), в части объектов АИП на 2017 год, по состоянию на 01.10.2017, исполнена (профинансирована) на 32,8% (537 121,0 тыс. руб. при плане в размере 1 638 815,3 тыс. руб.).

Главным распорядителем средств областного бюджета являлся комитет по дорожному хозяйству, получателями средств областного бюджета – ГКУ «Ленавтодор» (в части региональных автомобильных дорог, 15 объектов строительства и реконструкции), администрации городских и сельских поселений муниципальных образований, администрации муниципальных районов и городского округа Ленинградской области (в части субсидий, предоставленных за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, на условиях софинансирования с привлечением средств местных бюджетов).

Из 1 638 815,3 тыс. руб., выделенных на проектирование, строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства, на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения (включая проектирование объектов местного значения (средства предоставлялись в форме субсидий – с учетом объемов выполненных работ)) АИП на 2017 год предусмотрено 1 526 153,4 тыс. руб., на проектно-изыскательские работы (строительство и реконструкция) и отвод земель – 112 661,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 финансирование проектно-изыскательских работ и работ по отводу земель составило 9,8% (11 049,0 тыс. руб.). Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции региональных и местных автомобильных дорог составило 34,5% (526 072,0 тыс. руб.)

Программой на 2017 год предусмотрено финансирование 24 объектов проектирования, строительства и реконструкции регионального и местного значения (без учета проектно-изыскательских работ и работ по отводу земель).

Из указанных 24 объектов с плановым объемом бюджетных назначений в размере 1 526 153,4 тыс. руб., по 13 объектам на общую сумму в размере 121 814,0 тыс. руб. (8%) в течение 9 месяцев текущего года финансирование не осуществлялось.

Из 121 814,0 тыс. руб. на сумму 55 176,8 тыс. руб. получателем средств областного бюджета являлось ГКУ «Ленавтодор», на сумму 66 637,2 тыс. руб. – администрации муниципальных образований Ленинградской области.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на объекты АИП в рамках реализации ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области», сокращен на 232 090,6 тыс. руб. (-14,2%).

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения программы за 9 месяцев увеличился с 32,8% до 38,2%.

1.4.5. ГП ЛО «Развитие культуры в Ленинградской области»

Государственная программа «Развитие культуры в Ленинградской области», в части объектов АИП на 2017 год, по состоянию на 01.10.2017, при плане в размере 204 119,0 тыс. руб. профинансирована на сумму 69 889,4 тыс. руб. (34,2%).

Главным распорядителем средств областного бюджета являлся комитет по строительству Ленинградской области, получателями средств – администрации трех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» ГП ЛО «Развитие культуры в Ленинградской области» предусматривалось строительство и реконструкция 4 объектов культуры во Всеволожском, Подпорожском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области на общую сумму 187 119,0 тыс. руб. Фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2017 составило 69 889,4 тыс. руб. (37,4%).

Из указанных 4 объектов 1 объект в течение 9 месяцев 2017 года не финансировался. Плановая сумма финансирования – 40 830,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области» ГП ЛО «Развитие культуры в Ленинградской области» планировалось проведение реставрации объекта культурного наследия «Усадебный дом Демидова, 1774-1780, архитектор И.Е. Старов» в пос. Тайцы Гатчинского района. На указанные цели в 2017 году было выделено 17 000,0 тыс. руб. По

состоянию на 01.10.2017 финансирование работ по реставрации не осуществлялось.

В отношении указанного объекта следует отметить следующее.

Проектная документация на реставрацию усадебного дома Демидова имела положительное заключение **негосударственной** экспертизы.

В то же время, из содержания проекта реставрации усадебного дома следует, что должны затрагиваться его конструктивные характеристики.

Согласно части 1 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случаях, если при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия (реставрация, воссоздание и др.) затрагиваются конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности, указанные работы должны проводиться при наличии положительных заключений **государственной** экспертизы проектной документации.

Кроме того, проектная документация на работы, подлежащие выполнению на объекте культурного наследия федерального значения «Усадебный дом Демидова, 1774-1780, архитектор И.Е. Старов», должна являться объектом государственной историко-культурной экспертизы – на предмет соответствия работ по сохранению объекта культурного наследия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

При этом, основаниями для принятия решений о возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, а также землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное влияние на такие объекты, должны являться только положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы (статьи 28, 30, часть 1 статьи 31, часть 2 статьи 32 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ; Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569).

Согласно перечню работ сметного расчёта и оборудования, проект реставрации предполагает сохранение объемно - пространственной структуры здания в целом. Также, согласно содержанию общей пояснительной записки, данных для научной реставрации здания на какой-либо конкретный период времени не выявлено, проект реставрации и приспособления здания ориентирован на сохранение современного состояния памятника, его объемно-пространственной композиции и планировочной структуры в целом.

Общей пояснительной запиской, входящей в состав проектно-сметной документации, определено предполагаемое использование памятника – под представительские функции Правительства Ленинградской области (в здании предполагается проведение

торжественных приемов, деловых встреч с фуршетами и конференций с возможностью временного размещения почетных гостей).

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований был уменьшен на сумму 17 000,0 тыс. руб.

Объект «Усадебный дом Демидова, 1774-1780, архитектор И.Е. Старов» из АИП на 2017 год был исключен – согласно содержанию пояснительной записки к проекту закона о внесении изменений в областной бюджет на 2017 год – по причине отсутствия технических условий по присоединению к электрическим сетям.

Проектом бюджета Ленинградской области на 2018 год на реставрацию объекта предусмотрено 187 191,0 тыс. руб.

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения программы за 9 месяцев в целом увеличился с 34,2% до 37,4%.

1.4.6. ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области»

На реализацию мероприятий АИП на 2017 год в рамках ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области» было предусмотрено 3 094 880,4 тыс. руб. Фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2017 составило 1 305 672,7 тыс. руб. (42,2%).

Главным распорядителем средств областного бюджета на сумму 3 087 485,4 тыс. руб. (99,8%) являлся комитет по строительству Ленинградской области, на сумму 7 395,0 тыс. руб. (0,2%) – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (в части приобретения средней общеобразовательной школы №37 ОАО «РЖД» в пос. Мга Кировского района).

Получателями средств областного бюджета являлись администрации муниципальных районов Ленинградской области и ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Согласно содержанию отчета комитета финансов Ленинградской области об исполнении АИП за 9 месяцев 2017 года, по состоянию на 01.10.2017, из 3 094 880,4 тыс. руб., выделенных в 2017 году на реализацию АИП в части объектов, включенных в ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области», средства областного бюджета в общей сумме 796 280,1 тыс. руб. (25,7%) распределены не были.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы,

был уменьшен на сумму 7 197,1 тыс. руб. (-0,2%) и составил 3 087 701,3 тыс. руб.

Финансирование мероприятий АИП на 2017 год, предусмотренных в рамках ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области», также как и в 2016 году, осуществлялось в рамках 4 подпрограмм, в том числе:

- «Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области».

В рамках подпрограммы в 2017 году предусмотрено строительство 5 и приобретение (выкуп) 4 детских дошкольных образовательных учреждений.

На указанные цели АИП на 2017 год было предусмотрено 1 448 470,0 тыс. руб., из которых 1 042 171,4 тыс. руб. (72%) – на строительство и приобретение детских дошкольных учреждений во Всеволожском районе.

По состоянию на 01.10.2017 финансирование объектов составило 804 722,5 тыс. руб. (55,6%). Средства областного бюджета в сумме 804 722,5 тыс. руб. направлены на строительство и приобретение детских дошкольных учреждений во Всеволожском районе.

Кроме строительства и приобретения дошкольных образовательных учреждений Всеволожского района, АИП на 2017 год предусмотрено строительство 2 дошкольных учреждений в Подпорожском и Тосненском районах Ленинградской области.

На строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном» в пос. Винницы Подпорожского района за счет средств областного бюджета выделено 102 858,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта не производилось.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство детского сада в пос. Винницы был размещен от 27.09.2017. Аукцион признан несостоявшимся, муниципальный контракт от 31.10.2017 №813317 заключен с единственным участником – с ООО «Строительная компания «Индиго».

Цена контракта – 136 960,7 тыс. руб., сроки завершения работ – 14,5 месяцев с момента заключения государственного контракта.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатель – администрация Подпорожского района.

На строительство дошкольного образовательного учреждения в г. Тосно, микрорайон 3, выделено 50 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование объекта также не производилось.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство объекта размещен от 17.10.2017.

24.11.2017 размещен протокол рассмотрения заявок. Все заявки были признаны несоответствующими условиям аукциона и не допущены к участию в аукционе.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатель – администрация Тосненского района.

В соответствии с содержанием отчета комитета финансов Ленинградской области об исполнении АИП за 9 месяцев 2017 года, по состоянию на 01.10.2017, средства в сумме 253 441,5 тыс. руб. (17,5%), предусмотренные на строительство, реконструкцию и приобретение зданий дошкольных образовательных учреждений (организаций), распределены не были;

- «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году было предусмотрено 1 267 051,6 тыс. руб.

Фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2017 составило 285 185,3 тыс. руб. (22,5%).

В рамках подпрограммы в 2017 году было предусмотрено строительство и реконструкция 6 объектов – средних образовательных школ в 6 муниципальных районах Ленинградской области. На указанные цели за счет средств областного бюджета было выделено 716 818,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование составило 277 790,3 тыс. руб. (38,8%).

В течение 9 месяцев 2017 года не осуществлялось финансирование двух объектов:

- строительства МОУ «Средняя общеобразовательная школа на 600 мест» в г. Шлиссельбург Кировского района – на указанные цели за счет средств областного бюджета на 2017 год было предусмотрено 20 110,0 тыс. руб.;

- строительства пристройки к МКОУ «Федоровская СОШ» в дер. Федоровское Тосненского района; в 2017 году на строительство пристройки выделено 51 401,0 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство пристройки (спортивного зала) размещен от 27.10.2017. Определение поставщика и заключение муниципального контракта приостановлено с 12.12.2017 Управлением федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (в связи с жалобой).

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатель – администрация Тосненского района.

АИП на 2017 год в рамках подпрограммы было запланировано также приобретение зданий муниципальных образовательных учреждений на общую сумму в размере 542 838,6 тыс. руб.

Согласно содержанию отчета комитета финансов Ленинградской области об исполнении АИП за 9 месяцев 2017 года, по состоянию на 01.10.2017, средства в сумме 542 838,6 тыс. руб. (42,8%), предназначенные для приобретения зданий средних образовательных учреждений, распределены не были.

Главным распорядителем средств областного бюджета являлся комитет по строительству Ленинградской области, бюджетополучателями – администрации муниципальных районов Ленинградской области.

Кроме того, в рамках рассматриваемой подпрограммы планировалось приобретение средней общеобразовательной школы №37 ОАО «РЖД» в пос. Мга Кировского района на сумму 7 395,0 тыс. руб.

Главный распорядитель средств – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; бюджетополучатель – администрация Кировского района.

По состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 100%;

- «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области».

АИП на 2017 год в рамках подпрограммы предусмотрен 1 объект – реконструкция МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Рериха со строительством пристройки» (с разработкой рабочей документации) с плановым объемом финансирования в размере 259 949,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 121 505,4 тыс. руб. (46,7%).

Главный распорядитель средств – комитет по строительству Ленинградской области, бюджетополучатель – администрация Волосовского района Ленинградской области;

- «Развитие профессионального образования».

АИП на 2017 год в рамках подпрограммы также предусмотрен 1 объект – реконструкция здания лабораторного корпуса ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» в г. Всеволожск (ул. Шишканя, д. 4) с плановым объемом финансирования в размере 119 409,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 94 259,8 тыс. руб. (78,9%).

Главный распорядитель средств – комитет по строительству Ленинградской области, бюджетополучатель – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

АИП на 2017 год в рамках ГП ЛО «Современное образование Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2017 было предусмотрено строительство и реконструкция 15 объектов образования на общую сумму 1 630 413,0 тыс. руб., из которых по 6 объектам на общую сумму плановых бюджетных назначений в размере 346 785,0 тыс. руб., финансирование в 2017 году не осуществлялось.

1.4.7. ГП ЛО «Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

На реализацию мероприятий АИП на 2017 год в рамках ГП ЛО «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» было предусмотрено 2 120 373,1 тыс. руб. Фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2017 составило 1 064 953,0 тыс. руб. (50,2%).

Главным распорядителем средств областного бюджета на сумму 1 954 373,1 тыс. руб. (92,2%) являлся комитет по строительству Ленинградской области, на сумму 166 000,0 тыс. руб. (7,8%) – комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Получателями средств областного бюджета являлись: ГКУ «Управление строительства Ленинградской области», ГК «Ростех», комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, был уменьшен на сумму 50 874,8 тыс. руб. (-2,4%) и составил 2 069 498,3 тыс. руб.

Финансирование мероприятий АИП на 2017 год, предусмотренных в рамках ГП ЛО «Развитие здравоохранения в Ленинградской области», в 2017 году осуществлялось в рамках 3 подпрограмм, в том числе:

- «Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения».

На реализацию мероприятий АИП в части подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения» на 2017 год было предусмотрено 991 461,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование составило 253 078,3 тыс. руб. (25,5%).

В рамках подпрограммы в 2017 году планировалось проектирование, строительство и реконструкция 5 объектов здравоохранения на общую

сумму 903 461,0 тыс. руб. (главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатель – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»). Фактическое финансирование строительства и реконструкции объектов здравоохранения составило 253 078,3 тыс. руб. (28%).

По состоянию на 01.10.2017 из указанных 5 капитальных объектов финансирование не производилось только по 1 объекту – областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района.

На строительство указанного объекта в 2017 году было предусмотрено 156 350,0 тыс. руб.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, заказ на строительство поликлиники в г. Сертолово (1 этап) был размещен от 01.06.2017. Аукцион признан несостоявшимся, муниципальный контракт от 29.09.2017 №792967 заключен с единственным участником – с ООО «Теплосфера».

Цена контракта (1 этапа) – 2 275 046,0 тыс. руб., сроки завершения работ – 27 месяцев с момента передачи государственным заказчиком строительной площадки.

Главный распорядитель средств областного бюджета – комитет по строительству Ленинградской области; получатель – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Финансирование строительства корпуса №3 на 50 койко-мест Ульяновской психиатрической больницы Тосненского района, по состоянию на 01.10.2017, составило 24% (38 824,5 тыс. руб. при плане в размере 161 365,9 тыс. руб.). По итогам работы за 2016 год финансирование строительства корпуса составляло 66% (27 243,4 тыс. руб. при плане в размере 41 308,0 тыс. руб.), 2015 года – 30,7% (44 949,0 тыс. руб. при плане 146 243,0).

Кроме того, в рамках рассматриваемой подпрограммы планировалось приобретение в государственную собственность Ленинградской области нежилых помещений в дер. Вистино Кингисеппского района – на эти цели было выделено 50 000,0 тыс. руб. и приобретение в государственную собственность зданий фельдшерско-акушерских пунктов – на эти цели было выделено 38 000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 финансирование указанных выше двух мероприятий подпрограммы не осуществлялось.

Главный распорядитель и получатель средств областного бюджета – комитет по здравоохранению Ленинградской области;

- «Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра».

На строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Гатчина АИП на 2017 год предусмотрено 1 050 911,4 тыс. руб.; фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2017 составило 766 499,9 тыс. руб. (72,9%).

Подробная информация о ходе производства работ по состоянию на 01.12.2017 представлена в разделе 1.2.2. настоящего Заключения;

- «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

На приобретение жилья для медицинских работников в 2017 году было выделено 78 000,0 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 расходы областного бюджета на указанные цели составили 45 374,8 тыс. руб. (58,2%).

Приобретение жилых помещений для предоставления их медицинским работникам в порядке исполнения подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в рамках АИП осуществляется с 2017 года.

АИП на 2017 год в рамках ГП ЛО «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» по состоянию на 01.10.2017 было предусмотрено строительство и реконструкция 6 объектов здравоохранения на общую сумму 1 954 373,1 тыс. руб., из которых финансирование не осуществлялось только по 1 объекту на сумму 156 350,0 тыс. руб.

1.4.8. ГП ЛО «Безопасность Ленинградской области»

АИП на 2017 год в рамках реализации ГП ЛО «Безопасность Ленинградской области» (подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности») предусмотрено строительство и реконструкция 13 объектов (в том числе, пожарных депо) на общую сумму 301 309,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 175 283,0 тыс. руб. (58,2%).

По финансированию 11 из 13 объектов, на сумму 181 113,0 тыс. руб., главным распорядителем средств областного бюджета являлся комитет по строительству Ленинградской области; получателем – ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

По состоянию на 01.10.2017 финансирование этих 11 объектов составило 93 799,5 тыс. руб. (51,8%).

По 5 из 11 объектов с плановым размером бюджетных назначений в сумме 18 776,0 тыс. руб. в течение 9 месяцев 2017 года финансирование не осуществлялось.

Еще по двум объектам на общую сумму 120 196,3 тыс. руб. (106 303,0 тыс. руб. и 13 893,3 тыс. руб., соответственно), главными распорядителями средств областного бюджета являлись комитет по связи и информатизации Ленинградской области и комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области. По состоянию на 01.10.2017 финансирование этих двух объектов составило 81 483,5 тыс. руб. (67,8%).

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, был уменьшен на сумму 17 312,5 тыс. руб. (-5,7%) и составил 283 996,8 тыс. руб.

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения программы за 9 месяцев в целом увеличился с 58,2% до 61,7%.

1.4.9. ГП ЛО «Охрана окружающей среды Ленинградской области»

В рамках АИП по государственной программе «Охрана окружающей среды Ленинградской области» предусмотрено выполнение единственного мероприятия - строительство полигона твердых бытовых отходов и отдельных видов промышленных отходов в Подпорожском районе Ленинградской области.

Исполнение бюджетных ассигнований за период 9 месяцев 2017 года по данному объекту составило 71,3% (48 636,9 тыс. руб. при плане в размере 68 203,2 тыс. руб.).

По итогам реализации АИП в 2016 году, исполнение по данной программе составило 100%.

1.4.10. ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

На реализацию мероприятий АИП на 2017 год в рамках ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» было предусмотрено 551 782,5 тыс. руб. Фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2017 составило 499 953,9 тыс. руб. (90,6%).

Главным распорядителем средств областного бюджета являлся комитет по строительству Ленинградской области, получателями – администрации городских и сельских поселений районов Ленинградской области, администрации Всеволожского района и Сосновоборского городского округа Ленинградской области.

Как уже было отмечено в разделе 1.2.4., высокий уровень исполнения государственной программы обеспечен механизмом ее

реализации (и отдельных подпрограмм) – посредством предоставления средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий на соответствующие мероприятия.

АИП на 2017 год в рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» за счет средств областного бюджета было предусмотрено предоставление бюджету Всеволожского муниципального района субсидии на строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Кудрово», участок №2 (квартал 4, участок 4-13) в размере 58 659,7 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2017 финансирование составило 8 571,4 тыс. руб. (14,6%).

В рамках рассматриваемой подпрограммы, по состоянию на 01.10.2017, не была предоставлена субсидия бюджету Кингисеппского городского поселения на сумму 599,9 тыс. руб. (на решение вопросов местного значения по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей).

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области» 1 140,4 тыс. руб. составил объем нераспределенных бюджетных ассигнований. Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, был уменьшен на сумму нераспределенного остатка – 1 140,4 тыс. руб. (-0,2%) и составил 550 642,1 тыс. руб.

Всего в 2017 году в рамках АИП (программной ее части, без учета ПИР ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и субсидий, предоставленных в рамках реализации ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области») за счет средств областного бюджета планировалось финансирование проектирования, строительства и реконструкции 325 объектов на общую сумму 10 465 649,9 тыс. руб. Из 325 объектов в течение 9 месяцев 2017 года по 196 объектам (практически каждый второй объект) на общую сумму 2 629 891,1 тыс. руб. финансирование не осуществлялось.

Нераспределенные средства АИП в рамках государственных программ Ленинградской области по состоянию на 01.10.2017 составили в общей сумме 797 420,5 тыс. руб.

Кроме того, только в рамках одной ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» насчитывалось 14 объектов на общую

сумму 641 341,8 тыс. руб., финансирование каждого из которых в отдельности за 9 месяцев 2017 года составляло менее 20%.

Изменениями, внесенными в бюджет Ленинградской области на 2017 год законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программной части АИП, был уменьшен на сумму 1 069 477,6 тыс. руб. (-8,4%) и составил 11 693 424,4 тыс. руб.

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения АИП за 9 месяцев в целом увеличился с 35,8% до 39%.

В рамках непрограммной части АИП на 2017 год были предусмотрены бюджетные ассигнования на проектирование объектов социально-культурного назначения в сумме 140 000,0 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2017 года исполнение (финансирование) составило 16,1%.

Законом от 31.10.2017 №67-оз «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», размер бюджетных назначений на реализацию непрограммной части АИП был уменьшен на 40 000,0 тыс. руб. (-28,6%) и составил 100 000,0 тыс. руб.

С учетом сокращения в октябре 2017 года плановых назначений, уровень исполнения непрограммной части АИП за 9 месяцев в целом увеличился с 16,1% до 22,6%.

В таблице №6 представлена информация об исполнении мероприятий АИП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 9 месяцев 2017 года (с учётом внесения изменений в областной бюджет в соответствии с 67-оз).

Таблица №6, тыс. руб.

| Главный распорядитель бюджетных средств | План на 2017 год | | Фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2017 | Исполнение, % | |
|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | в редакции областного закона от 17.07.2017 №50-оз | в редакции областного закона от 31.10.2017 №67-оз | | в редакции от 17.07.2017 | в редакции от 31.10.2017 |
| Комитет по строительству Ленинградской области | 8 341 203,2 | 7 872 837,3 | 3 522 624,9 | 42,2 | 44,7 |
| Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | 106 303,0 | 105 462,0 | 79 251,6 | 74,5 | 75,1 |
| Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | 13 893,3 | 13 893,3 | 2 231,9 | 16,1 | 16,1 |
| Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 166 000,0 | 118 000,0 | 45 374,8 | 27,3 | 38,5 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Комитет по ТЭК Ленинградской области | 1 061 269,0 | 756 679,4 | 217 410,6 | 20,5 | 28,7 |
| Комитет по ЖКХ Ленинградской области | 1 202 409,6 | 1 136 380,6 | 138 468,0 | 11,5 | 12,2 |
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 1 943 428,9 | 1 711 338,3 | 575 616,4 | 29,6 | 33,6 |
| Комитет по физкультуре и спорту Ленинградской области | 61 000,0 | 61 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | 7 395,0 | 17 833,4 | 7395,0 | 100,0 | 41,5 |
| ИТОГО по АИП | 12 902 902,0 | 11 793 424,4 | 4 588 373,2 | 35,6 | 38,9 |

Как видно из таблицы №6, в 2017 году (как и в 2016 году), наибольший удельный вес в структуре расходов приходился на комитет по строительству Ленинградской области (64,6%).

В таблице №7 представлена информация об исполнении АИП за период 2013-2016 годов и 9 месяцев 2017 года

Таблица №7

| Период | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Отношение план/факт, % |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 2013 год | 5 953 398,0 | 5 129 468,0 | 86,2 |
| 2014 год | 6 278 652,0 | 4 979 387,0 | 79,3 |
| 2015 год | 9 022 637,0 | 6 956 319,0 | 77,1 |
| 9 месяцев 2016 года | 12 437 987,0 | 4 027 955,0 | 32,4 |
| 2016 год | 10 244 156,0 | 6 989 871,0 | 68,2 |
| 9 месяцев 2017 года | 12 902 902,0 | 4 588 373,2 | 35,6 |

Как видно из таблицы №7, в целом уровень исполнения мероприятий АИП за 9 месяцев 2017 года составил 35,6% (4 588 373,2 тыс. руб.). Данный показатель сопоставим с показателем за аналогичный период 2016 года – 32,4% (4 027 955,0 тыс. руб.).

В 2016 году уровень исполнения АИП по итогам года составил 68,2% – самый низкий показатель за последние 4 года (2013 – 2016). В то же время, в денежном выражении этот показатель самый высокий – 6 989 871,0 тыс. руб.

С 2013 года наблюдался устойчивый рост бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности.

Так, на реализацию мероприятий АИП в 2016 году (10 244 156 тыс. руб.), средств областного бюджета выделено в 1,7 раза больше, чем в 2013 году (5 953 398 тыс. руб.).

С учетом изменений, внесенных областным законом от 31.10.2017 №67-оз, плановые назначения на реализацию мероприятий АИП на 2017 год составили 11 793 424 тыс. руб.

Как показал проведенный анализ исполнения АИП за 9 месяцев 2017 года, по состоянию на 01.10.2017, средства областного бюджета, выделенные на проектирование, строительство и реконструкцию объектов АИП, финансирование которых за указанный период не осуществлялось, а также нераспределенные средства составили 3 427 311,6 тыс. руб.

Изменениями от 31.10.2017 объем бюджетных назначений, выделенных на мероприятия АИП на 2017 год, был сокращен на 1 109 477,6 тыс. руб.

Если предположить, что финансирование сокращалось именно по объектам, финансирование которых в течение 9 месяцев 2017 года не производилось, из 3 427 311,6 тыс. руб. может остаться еще 2 317 834,0 тыс. руб., использование которых в полном объеме до конца 2017 года, по мнению Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, остается под сомнением.

Учитывая, что средний уровень исполнения АИП за последние 4 года составил 78%, прогнозный уровень исполнения АИП за 2017 год может составить порядка 9 млрд. руб. (благоприятный прогноз); прогнозное неисполнение бюджетных назначений в рамках реализации мероприятий АИП на 2017 год может составить более 2 млрд. руб.

2. Основные краткие выводы.

1. На реализацию мероприятий АИП на 2016 год за счет средств областного бюджета выделено 10 244,2 млн. руб.

Фактическое финансирование составило 6 989,9 млн. руб.

В 2016 году уровень исполнения АИП составил 68,2% – в процентном соотношении это самый низкий показатель за последние 4 года (2013 – 2016). В то же время, в денежном выражении этот показатель самый высокий – 6 989 871,0 тыс. руб.

С 2013 года наблюдался устойчивый рост плановых бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности – с 5 953,4 млн. руб. (2013 год) до 10 244,2 млн. руб. (2016 год). С учетом изменений, внесенных областным законом от 31.10.2017 №67-оз, плановый размер бюджетных назначений на 2017 год утвержден в размере 11 793,4 млн. руб.

На реализацию мероприятий АИП в 2016 году, средств областного бюджета выделено в 1,7 раза больше, чем в 2013 году.

Структура АИП на 2016 год сформирована на основе 11 государственных программ Ленинградской области и непрограммной части.

Главными распорядителями средств областного бюджета в части мероприятий АИП в 2016 году являлись 8 отраслевых комитетов Правительства Ленинградской области, из которых доля комитета по строительству Ленинградской области составила 65,3% (6 689,2 млн. руб.).

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований приходился на реализацию мероприятий государственных программ Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» и «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» - 19,6% и 16,1% от общего объема, соответственно.

На реализацию мероприятий АИП в рамках ГП ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» выделено 1 585,0 млн. руб., что составило в структуре программной части АИП на 2016 год 15,6%.

В рамках реализации ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» предусматривалось проектирование, строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства, газификации, водоснабжения и водоотведения, здравоохранения, культуры, спорта – только в сельской местности.

С учетом отраслевой принадлежности объектов АИП на 2016 год, включенных в ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», наиболее приоритетными направлениями бюджетного инвестирования в Ленинградской области в 2016 году, в том числе в сельских населенных пунктах, было определено образование (19,6%), жилищно-коммунальное хозяйство (18,1%) и здравоохранение (17,2%).

По итогам реализации АИП за 2016 год не исполнены бюджетные назначения, предусмотренные на строительство бизнес-инкубатора в г. Всеволожск в рамках реализации ГП ЛО «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». По итогам исполнения АИП за 9 месяцев 2017 года финансирование строительства бизнес-инкубаторов (в 2017 году программой предусматривалось строительство и реконструкция двух объектов) также не осуществлялось.

Самый низкий процент исполнения отмечен по объектам АИП в рамках ГП ЛО «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» - 26,3%. Сложившаяся ситуация, прежде всего, связана со строительством перинатального центра в г. Гатчина.

В рамках АИП на 2016 год (программной ее части, без учета ПИР в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и субсидий, предоставленных в рамках реализации ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области») за счет средств областного бюджета

планировалось финансирование проектирования, строительства и реконструкции 254 объектов на общую сумму 7 579,6 млн. руб., из которых по 43 объектам (практически 1/6 часть от общего числа объектов) на общую сумму 802,8 млн. руб. (10,6%) финансирование не осуществлялось.

Самый высокий плановый объем бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета в 2016 году отмечен в Гатчинском районе, что объясняется планированием строительства перинатального центра в г. Гатчина (на 2016 год – 1 072,6 млн. руб.).

В объекты, расположенные на территории Всеволожского района, в 2016 году планировалось направить 1 828,9 млн. руб., что составило бы в общем объеме инвестиций 18,1%.

Доля инвестиций Выборгского района в 2016 году составила бы 13,2% (1 330,1 млн. руб.).

Меньше всего бюджетных инвестиций планировалось реализовать в Сланцевском и Киришском районах – 11,3 млн. руб. (0,1%) и 28,5 млн. руб. (0,3%), соответственно.

По итогам исполнения АИП за 2016 год наибольший объем бюджетных инвестиций приходился на Всеволожский район – 21,9% (1 511,7 млн. руб.). На объекты, расположенные в Выборгском районе направлено 12,1% (836,8 млн. руб.) от общего объема инвестиций; Волосовский – 9,4% (775,9 млн. руб.).

При этом, уровень финансирования капитальных вложений в Волосовском районе в 2016 году – один из самых высоких – 96,1% (план 2016 года составлял 807,4 тыс. руб.).

В результате реализации АИП за 2016 год (программная часть) размер бюджетных инвестиций в расчете на 1 жителя Ленинградской области, составлял от 136,5 руб. на человека – в Сланцевском районе, до 14 979,6 руб. на 1 жителя – в Волосовском районе. В среднем по Ленинградской области в 2016 году объем бюджетных инвестиций составил 3 872 руб. на 1 жителя.

2. Начиная с 2017 года, планирование капитальных вложений в рамках АИП в разрезе государственных программ Ленинградской области осуществляется на 3 года.

На реализацию мероприятий АИП на 2017 год за счет средств областного бюджета было выделено 12 902,6 млн. руб. (в редакции закона от 17.07.2017 №50-оз). С учетом изменений, внесенных областным законом от 31.10.2017 №67-оз, объем плановых бюджетных назначений на указанные цели был сокращен на 1 109,5 млн. руб. и составил 11 793,4 млн. руб.

По состоянию на 01.10.2017 фактическое финансирование АИП составило 4 588,4 млн. руб. – 35,6% от утвержденного плана и 38,9% от скорректированного планового показателя.

За аналогичный период предшествующего года (9 месяцев 2016 года) финансирование АИП составляло 4 028,0 млн. руб. (32,4%).

Структура АИП на 2017 год, также как и в 2016 году, сформирована на основе 11 государственных программ Ленинградской области и непрограммной части.

Главными распорядителями средств областного бюджета в части мероприятий АИП в 2017 году являлись 9 отраслевых комитетов Правительства Ленинградской области, из которых доля комитета по строительству Ленинградской области составила 64,7% (8 341,2 млн. руб.)

Как и в 2016 году, наибольший удельный вес плановых бюджетных назначений приходился на реализацию мероприятий государственных программ Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» – 24,% (в 2016 году – 19,6%), «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» – 16,6% (в 2016 году – 16,1%) и «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» – 16,4% (в 2016 году – 15,6%).

По итогам исполнения мероприятий АИП за 9 месяцев 2017 года, как и в 2016 году, не исполнены в полном объеме бюджетные назначения, предусмотренные на реализацию ГП ЛО «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» (строительство и реконструкция 2 бизнес-инкубаторов).

Исполнение по еще четырем государственным программам, в части выполнения мероприятий АИП, составило менее 20%: «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» – 17,4%; «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» – 17,8%; «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» – 19,8%.

Относительно низкий уровень финансирования АИП в части ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» наблюдался в течение с 2015 года по 01.10.2017 – в 2015 году уровень финансирования капитальных объектов программы составлял 68%, в 2016 году – 53,8%.

Получателями средств областного бюджета в рамках ГП ЛО «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», в основном, являлись администрации сельских поселений муниципальных образований Ленинградской области. Они же, соответственно, являлись муниципальными заказчиками – по объектам муниципальной собственности, находящиеся в их компетенции – в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Как показал анализ АИП за 2016 год и 9 месяцев 2017 года, а также предыдущие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, проведенные Контрольно-счетной палатой Ленинградской области,

администрации практически всех сельских поселений муниципальных образований Ленинградской области не в полной мере справлялись с функциями муниципальных заказчиков, что соответствующим образом отражалось на уровне исполнения АИП в части указанной государственной программы.

Кроме того, основными причинами относительно невысокого ежегодного уровня исполнения адресной инвестиционной программы являлось:

- некачественная (в том числе, дающая основания для направления жалоб со стороны подрядных организаций в Управление федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области) подготовка конкурсной документации;

- позднее проведение конкурсных процедур и, соответственно, позднее заключение государственных контрактов (ноябрь-декабрь соответствующего финансового года);

- некачественное проектирование объектов капитального строительства (реконструкции) или отклонения подрядчиком от проектных решений в ходе проведения строительно-монтажных работ, требующих прохождения повторной государственной экспертизы;

- длительность процесса изъятия (выкупа земельных участков у их собственников для государственных нужд Ленинградской области (для строительства новых линейных объектов (автомобильных дорог));

- несоблюдение подрядчиками условий государственных и муниципальных контрактов;

- неприменение (выборочное применение, применение не в полной мере) заказчиками штрафных санкций, предусмотренных государственными и муниципальными контрактами к подрядным организациям за нарушение их условий.

В рамках АИП на 2017 год (программной ее части, без учета ПИР ГП ЛО «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и субсидий, предоставленных в рамках реализации ГП ЛО «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области») за счет средств областного бюджета планировалось финансирование (проектирование, строительство и реконструкция) 325 объектов, из которых по 196 объектам (практически каждый второй объект) на общую сумму 2 629,9 млн. руб. по состоянию на 01.10.2017 финансирование не осуществлялось.

Нераспределенные средства АИП в рамках государственных программ Ленинградской области по состоянию на 01.10.2017 составили в общей сумме 797,4 млн. руб.

Всего по состоянию на 01.10.2017, средства областного бюджета, выделенные на проектирование, строительство и реконструкцию объектов АИП, финансирование которых за указанный период не осуществлялось, а также нераспределенные средства, составили 3 427,3 млн. руб.

Изменениями от 31.10.2017 объем бюджетных назначений, выделенных на мероприятия АИП на 2017 год, был сокращен только на 1 109,5 млн. руб.

Таким образом, прогнозируемый объем неиспользованных средств областного бюджета, предусмотренных на мероприятия АИП в 2017 году, по состоянию на 01.01.2018 может составить более 2 млрд. руб.

3. По обращению депутата Законодательного собрания Ленинградской области Илларионовой Р.А., в рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия был рассмотрен вопрос о причинах несоблюдения сроков строительства в 2015-2016 годах детских садов во Всеволожском районе Ленинградской области.

Не были введены в эксплуатацию или введены в эксплуатацию с нарушением сроков в 2015-2016 годах во Всеволожском районе 3 детских сада, включенных в АИП соответствующих лет – детский сад на 220 мест в п. Янино-1; детский сад на 160 мест в г. Всеволожск (ул. Героев, д.5); детский сад на 280 мест в дер. Романовка.

Строительство детского сада в п. Янино-1 было завершено в 2016 году. Объект своевременно не был введен в эксплуатацию в связи с отсутствием к нему свободного прохода и проезда.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено от 13.10.2017. Открытие сада состоялось в ноябре 2017 года.

Всего в 2014, 2015 и 2017 годах за счет средств областного бюджета на строительство детского сада было перечислено 186,8млн. руб.

Разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада в г. Всеволожск (ул. Героев д. 5) выдано 12.12.2016, в настоящее время детский сад функционирует в штатном режиме.

Финансирование строительно-монтажных работ за счет средств областного бюджета в 2016 году не производилось в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком – ЗАО «Альфа».

В 2014-2015 годах на строительство детского сада в г. Всеволожск (ул. Героев д. 5) из областного бюджета было перечислено 126,8 млн. руб.

Строительство детского сада на 280 мест в дер. Романовка Всеволожского района было приостановлено в феврале 2017 года из-за судебных разбирательств с подрядчиком – ООО «Группа АВС».

Строительная готовность объекта составляла 46%. Выполнено устройство внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, кровли, благоустройство. Срок завершения работ – декабрь 2016 года.

В феврале 2017 года заказчиком (МКУ «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области), в связи с невыполнением работ в соответствии с условиями муниципального контракта, в адрес

подрядчика было направлено уведомление о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке.

Решением арбитражного суда от 08.06.2017 расторжение контракта в одностороннем порядке признано недействительным.

Постановлением апелляционного суда решение суда оставлено в силе, расторжение контракта признано недействительным.

Ожидается возобновление работ ООО «Группа АВС».

В 2015-2016 годах за счет средств областного бюджета на финансирование объекта перечислены денежные средства в сумме 78 млн. руб.

4. Согласно данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, общая **прогнозная потребность** в дополнительных местах в детских дошкольных образовательных учреждениях Ленинградской области на 2018-2020 годы составит 13 846 мест.

Самая сложная ситуация с обеспечением детей дошкольным образованием в дошкольных учреждениях сложилась во Всеволожском районе Ленинградской области. Прогнозная потребность в местах на 2018 – 2020 годы в этом муниципальном районе составит 7 150 мест. (51,6% от общей прогнозной потребности в целом по Ленинградской области).

По данным системы «Электронный детский сад» по состоянию на 01.01.2017 **на очередь** в детские дошкольные учреждения Всеволожского района записано 18 860 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 5 313 детей.

В дошкольных образовательных учреждениях Всеволожского района, например, на 2016-2017 учебный год имелось только 2 656 свободных мест.

Во Всеволожском районе создаются дополнительные места в действующих дошкольных и школьных образовательных учреждениях путем укомплектования дополнительной мебелью, инвентарем и оборудованием помещений с изменением их функционального назначения.

Исходя из наличия в каждом из детских дошкольных учреждений, например, по 280 мест, в течение указанных 3-х лет необходимо построить (приобрести) еще 50 таких учреждений.

Сметная стоимость строительства детского сада на 280 мест, например, в дер. Романовка Всеволожского района в ценах 2014 года составляла 291 834,0 тыс. руб.

Таким образом, стоимость 1 места в новом (построенном) дошкольном образовательном учреждении, даже в ценах 2014 года, составляла более 1 млн. руб.

Решение вопроса с обеспечением детей дошкольным образованием до 2020 года посредством строительства (приобретения) новых дошкольных образовательных учреждений потребует капитальных

вложений в сумме более 14 млрд. руб., из них более 5 млрд. руб. – только на объекты Всеволожского района.

На дошкольное образование в 2016 году за счет средств консолидированного бюджета было израсходовано порядка 11 млрд. руб. – практически вся сумма предназначена на содержание учреждений дошкольного образования.

По данным Петростата численность воспитанников в организациях, осуществлявших дошкольную образовательную деятельность в 2016 году, составляла 77,6 тысяч.

По данным комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, содержание одного ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении (с учетом внебюджетных средств) в среднем составляла 152 тыс. руб. в год.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области




С.В. Гнилицкий

Информация о финансировании адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области на 2015, 2016, 2017 годы (по состоянию на 01.10.2017)

| № п/п | Наименование государственных программ Ленинградской области, Подпрограмм | 2015 год | | | | 2016 год | | | | | 2017 год (по состоянию на 01.10.2017) | | | | | Примечание |
|-------|--|-----------|-----------|--------|---------------------|-------------|-------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------|--------|------------------------|---------------------|--|
| | | план | факт. | % исп. | доля в структуре, % | план | факт | % исп. | динамика | доля в структуре, % | план | факт | % исп. | динамика | доля в структуре, % | |
| 1 | «Современное образование Ленинградской области» | 2 094 159 | 1 834 770 | 87,6 | 23,8 | 1 990 930,5 | 1 805 447,4 | 90,7 | уменьшение на 4,9% | 19,6 | 3 094 880,4 | 1 305 672,7 | 42,2 | уменьшение на 1,6 раза | 24,2 | |
| 1.1. | "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области", в т.ч. нераспределенный остаток | 1 759 716 | 1 676 522 | 95,3 | | 500 193,1 | 413 351,3 | 82,6 | уменьшение на 71,6 % | | 1 448 430,9 | 804 722,5 | 55,6 | уменьшение на 2,9 раза | | остаток нераспределенных средств областного бюджета, предусмотренных на приобретение ДОУ |
| | | 8 386 | 0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | 542 838,6 | 0,0 | | | | |
| 1.2. | "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Ленинградской области", в т.ч. нераспределенный остаток | 304 444 | 142 058 | 46,7 | | 1 255 455,2 | 1 192 337,3 | 95,0 | уменьшение на 4,1 раза | | 1 267 051,6 | 285 185,3 | 22,5 | уменьшение на 0,9% | | остаток нераспределенных средств областного бюджета, предусмотренных на приобретение зданий муниципальных образовательных бюджетных учреждений |
| | | 0 | 0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | 253 441,5 | 0,0 | | | | |
| 1.3. | "Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области" | 30 000 | 16 190 | 54,0 | | 200 000,0 | 199 758,8 | 99,9 | уменьшение на 6,7 раза | | 259 949,0 | 321 505,4 | 46,7 | уменьшение на 30% | | |
| 1.4. | "Развитие профессионального образования " | 0 | 0 | | | 35 282,3 | 0,0 | 0,0 | | | 119 409,0 | 94 259,8 | 78,9 | уменьшение на 3,4 раза | | |
| 2. | "Развитие здравоохранения в Ленинградской области" | 944 018 | 356 736 | 37,8 | 10,7 | 1 635 249,8 | 429 450,1 | 26,3 | уменьшение на 1,7 раза | 16,1 | 2 120 373,1 | 1 064 953,0 | 50,2 | уменьшение на 29,7% | 16,6 | |
| 2.1. | "Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения" | 377 565 | 269 624 | 71,4 | | 562 675,8 | 407 787,4 | 72,5 | уменьшение на 49% | | 991 461,0 | 253 078,3 | 25,5 | уменьшение на 1,8 раза | | |
| 2.2. | "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | 566 453 | 87 111 | 15,4 | | 1 072 574,0 | 21 662,6 | 2,0 | уменьшение на 1,9 раза | | 1 050 911,4 | 766 499,9 | 72,9 | уменьшение на 2% | | |
| 2.3. | "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 0 | 0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | 78 000,0 | 45 374,8 | 58,2 | | | |
| 3. | "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" | 1 543 538 | 1 425 425 | 92,3 | 17,5 | 1 584 971,0 | 1 067 124,7 | 67,3 | уменьшение на 2,7% | 15,6 | 2 097 079,2 | 373 971,2 | 17,8 | уменьшение на 32,3% | 16,4 | |
| 3.1. | "Газификация Ленинградской области" | 517 865 | 508 818 | 98,3 | | 720 912,7 | 417 015,5 | 57,8 | уменьшение на 39,2% | | 960 727,0 | 199 195,8 | 20,7 | уменьшение на 33,3% | | |
| 3.2. | "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | 933 924 | 833 349 | 89,2 | | 844 924,6 | 632 210,5 | 74,8 | уменьшение на 9,3% | | 1 055 529,5 | 130 283,0 | 12,3 | уменьшение на 24,9% | | |
| 3.3. | "Энергобережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | 91 749 | 83 258 | 90,7 | | 19 133,3 | 17 898,7 | 93,5 | уменьшение на 4,8 раза | | 80 822,7 | 44 492,4 | 55,0 | уменьшение на 4,2 раза | | |
| 4. | "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | 804 801 | 789 821 | 98,1 | 9,1 | 1 420 137,3 | 1 417 295,1 | 99,8 | уменьшение на 1,3 раза | 14,0 | 551 782,5 | 499 953,9 | 90,6 | уменьшение на 2,6 раза | 4,3 | |
| 4.1. | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области", в т.ч. нераспределенный остаток | 500 235 | 485 593 | 97,1 | | 1 048 649,2 | 1 045 817,3 | 99,7 | уменьшение на 2,1 раза | | 121 691,6 | 120 551,2 | 99,1 | уменьшение на 8,6 раза | | |
| | | | | | | 2 831,9 | 0,0 | | | | 1 140,4 | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------|-------|------|-------------|-----------|-------|------------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----|
| 4.2. | "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 225 000 | 225 000 | 100,0 | | 224 999,9 | 224 999,9 | 100,0 | | 364 282,7 | 313 594,5 | 86,1 | увеличение на 1,6 раза | | |
| 4.3. | "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" | 79 566 | 79 228 | 99,6 | | 146 488,2 | 146 477,9 | 100,0 | увеличение на 1,8 раза | 65 808,2 | 65 808,2 | 100,0 | уменьшение на 2,2 раза | | |
| 5. | "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" (подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования") | 1 120 429 | 752 175 | 67,1 | 12,7 | 1 262 868,0 | 727 064,6 | 57,6 | увеличение на 12,7% | 1 638 815,3 | 537 121,0 | 32,8 | увеличение на 29,8% | 12,8 | |
| 6. | "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"), в т.ч. по направлениям развития: | 1 245 256 | 847 326 | 68,0 | 14,1 | 1 090 237,9 | 586 983,0 | 53,8 | уменьшение на 12,4% | 1 535 699,8 | 266 461,1 | 17,4 | увеличение на 40,9% | 12,0 | |
| | объекты спортивного назначения | 193 833 | 144 052 | 74,3 | | 63 514,4 | 46 852,9 | 73,8 | уменьшение на 3,1 раза | 133 870,1 | 15 613,2 | 11,7 | увеличение на 2,1 раза | | |
| | объекты здравоохранения | 172 467 | 140 522 | 81,5 | | 105 299,9 | 51 789,1 | 49,2 | уменьшение на 38,9% | 379 734,2 | 78 088,5 | 20,6 | увеличение на 3,6 раза | | |
| | объекты культуры | 163 899 | 77 738 | 47,4 | | 312 071,1 | 229 134,1 | 73,4 | увеличение на 1,9 раза | 370 775,5 | 107 864,2 | 29,1 | увеличение на 18,8% | | |
| | комплексное обустройство площадок под компактную жилую застройку (инженерные сети) | 13 782 | 0 | 0,0 | | 57 313,0 | 57 313,0 | 100,0 | увеличение на 4,2 раза | 99 284,4 | 0,0 | 0,0 | увеличение на 73,2% | | |
| | объекты газификации | 184 012 | 183 660 | 99,8 | | 78 197,9 | 69 334,6 | 88,7 | уменьшение на 2,4 раза | 100 542,0 | 18 214,8 | 18,1 | увеличение на 28,6% | | |
| | автомобильные дороги | 177 120 | 1 850 | 1,0 | | 321 634,7 | 62 235,4 | 19,3 | увеличение на 1,8 раза | 304 613,6 | 38 495,4 | 12,6 | уменьшение на 5,3% | | |
| | объекты водоснабжения и водоотведения | 80 000 | 63 335 | 79,2 | | 116 665,0 | 34 784,9 | 29,8 | увеличение на 45,8% | 146 880,1 | 8 185,0 | 5,6 | увеличение на 25,9% | | |
| | объекты образования | 233 414 | 209 441 | 89,7 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | объекты ветеринарии | 26 730 | 26 729 | 100,0 | | 35 542,0 | 35 538,9 | 100,0 | увеличение на 33% | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 7. | "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области" (подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области") | 841 452 | 549 536 | 65,3 | 9,6 | 809 691,5 | 560 180,7 | 69,2 | уменьшение на 3,8% | 1 130 640,2 | 223 826,2 | 19,8 | увеличение на 39,6% | 8,9 | |
| 8. | "Развитие культуры в Ленинградской области" | 149 940 | 149 050 | 99,4 | 1,7 | 176 778,0 | 166 667,1 | 94,3 | увеличение на 17,9% | 1,7 | 204 119,0 | 69 889,4 | 34,2 | увеличение на 15,5% | 1,6 |
| 8.1. | "Обеспечение условий реализации государственной программы" | 149 940 | 149 050 | 99,4 | | 176 778,0 | 166 667,1 | 94,3 | увеличение на 17,9% | 187 119,0 | 68 889,4 | 36,8 | увеличение на 5,8% | | |
| 8.2. | "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Ленинградской области" | 0 | 0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 9. | "Безопасность Ленинградской области" (подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности") | 56 932 | 52 311 | 91,9 | 0,6 | 165 116,8 | 145 889,8 | 88,4 | увеличение на 2,9 раза | 1,6 | 301 309,3 | 175 283,0 | 58,2 | увеличение на 1,8 раза | 2,4 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------|
| 10. | "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" (подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области") | 0 | 0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение в 2 раза | 0,2 |
| 11. | "Охрана окружающей среды Ленинградской области" (подпрограмма "Обращение с отходами") | 0 | 0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | | 0,05 | 68 203,2 | 48 636,9 | 71,3 | увеличение в 13,6 раз | 0,5 |
| 12. | "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" (подпрограмма "Молодежь Ленинградской области") | 10 147 | 8 226 | 81,1 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| | Всего по программной части АИП | 8 810 671 | 6 765 375 | 76,8 | 10 150 980,8 | 6 911 102,4 | 68,1 | увеличение на 15,2% | 100,00 | 12 762 902,0 | 4 565 768,5 | 35,8 | увеличение на 25,7% | 100,0 |
| | Непрограммная часть | 211 966 | 190 944 | 90,1 | 93 175,0 | 78 768,5 | 84,5 | уменьшение на 56,0% | | 140 000,0 | 22 604,8 | 16,1 | увеличение на 50,3% | |
| | ИТОГО по АИП | 9 022 637 | 6 956 319 | 77,1 | 10 244 155,8 | 6 989 870,9 | 68,2 | увеличение на 13,5% | | 12 902 902,0 | 4 588 373,3 | 35,6 | увеличение на 26,0 % | |



Информация об исполнении мероприятий АИП на 2017 год в разрезе государственных программ и главных распорядителей средств областного бюджета, по состоянию на 01.10.2017, и с учётом изменений, внесённых областным законом от 31.10.2017 №67-оз

тыс. руб.

| № п/п | Наименование государственных программ | План на 2017 год | | Доля в структуре АИП, % | | Динамика, тыс. руб. | Динамика, % | Фактическое финансирование по состоянию на 01.10.2017 | ГРБС | Исполнение по состоянию на 01.10.2017, % | |
|-------|--|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---|---|--|--------------------------|
| | | в редакции областного закона от 17.07.2017 №50-оз | в редакции областного закона от 31.10.2017 №67-оз | в редакции от 17.07.2017 | в редакции от 31.10.2017 | | | | | в редакции от 17.07.2017 | в редакции от 31.10.2017 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Безопасность Ленинградской области» | 181 113,0 | 164 641,5 | | | | | 93 799,5 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | | 106 303,0 | 105 462,0 | | | | | 79 251,6 | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области | | |
| | | 13 893,3 | 13 893,3 | | | | | 2 231,9 | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 301 309,3 | 283 996,8 | 2,3 | 2,4 | - 17 312,5 | - 5,7 | 175 283,0 | | 58,2 | 61,7 |
| 2 | «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» | 1 954 373,1 | 1 951 498,3 | | | | | 1 019 578,2 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | | 166 000,0 | 118 000,0 | | | | | 45 374,8 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 2 120 373,1 | 2 069 498,3 | 16,4 | 17,5 | - 50 874,8 | - 2,4 | 1 064 953,0 | | 50,2 | 51,5 |
| 3 | «Развитие сельского | 983 664,1 | 830 862,5 | | | | | 201 565,9 | Комитет по строительству | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|--|-------------|-------------|
| | хозяйства Ленинградской области» | | | | | | | | Ленинградской области | | |
| | | 100 542,0 | 84 372,6 | | | | | 18 214,8 | Комитет по ТЭК Ленинградской области | | |
| | | 146 880,1 | 157 880,1 | | | | | 8 185,0 | Комитет по ЖКХ Ленинградской области | | |
| | | 304 613,6 | 304 613,6 | | | | | 38 495,4 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 1 535 699,8 | 1 377 728,8 | 11,9 | 11,7 | -157 971,0 | - 10,3 | 266 461,1 | | 17,4 | 19,3 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» | 1 069 640,2 | 871 875,5 | | | | | 223 826,2 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | | 61 000,0 | 61 000,0 | | | | | 0,0 | Комитет по физкультуре и спорту Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 1 130 640,2 | 932 875,5 | 8,8 | 8,0 | - 197 764,7 | - 17,5 | 223 826,2 | | 19,8 | 24,0 |
| 5 | «Современное образование Ленинградской области» | 3 087 485,4 | 3 069 867,9 | | | | | 1 298 277,7 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | | 7 395,0 | 17 833,4 | | | | | 7 395,0 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 3 094 880,4 | 3 087 701,3 | 24,0 | 26,2 | - 7 197,1 | - 0,2 | 1 305 672,7 | | 42,2 | 42,3 |
| 6 | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | 80 822,7 | 71 903,5 | | | | | 44 492,4 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | | 960 727,0 | 672 306,8 | | | | | 199 195,8 | Комитет по ТЭК Ленинградской области | | |
| | | 1 055 529,5 | 978 500,5 | | | | | 130 283,0 | Комитет по ЖКХ Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 2 097 079,2 | 1 722 710,8 | 16,3 | 14,6 | - 374 368,4 | - 17,8 | 373 971,2 | | 17,8 | 21,7 |
| 7 | «Развитие культуры в Ленинградской области» | 204 119,0 | 187 119,0 | | | | | 69 889,4 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 204 119,0 | 187 119,0 | 1,6 | 1,6 | - 17 000,0 | - 8,3 | 69 889,4 | | 34,2 | 37,4 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|--|-------------|-------------|
| 8 | «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 551 782,5 | 550 642,1 | | | | | 499 953,9 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 551 782,5 | 550 642,1 | 4,3 | 4,7 | - 1 140,4 | - 0,2 | 499 953,9 | | 90,6 | 90,8 |
| 9 | «Охрана окружающей среды Ленинградской области» | 68 203,2 | 68 203,2 | | | | | 48 636,9 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 68 203,2 | 68 203,2 | 0,5 | 0,6 | - | - | 48 636,9 | | 71,3 | 71,3 |
| 10 | «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» | 20 000,0 | 6 223,8 | | | | | 0,0 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 20 000,0 | 6 223,8 | 0,2 | 0,1 | - 13 776,2 | - 68,9 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 11 | «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 1 638 815,3 | 1 406 724,8 | | | | | 537 121,0 | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | |
| | Итого по программе | 1 638 815,3 | 1 406 724,7 | 12,7 | 11,9 | - 232 090,6 | - 14,2 | 537 121,0 | | 32,8 | 38,2 |
| | Итого по программной части | 12 762 902,0 | 11 693 424,4 | | | - 1 069 477,6 | - 8,4 | 4 565 768,4 | | 35,8 | 39,0 |
| | Непрограммная часть | 140 000,0 | 100 000,0 | | | | | 22 604,8 | Комитет по строительству Ленинградской области | | |
| | Итого по непрограммной части | 140 000,0 | 100 000,0 | 1,1 | 0,8 | - 40 000,0 | - 28,6 | 22 604,8 | | 16,1 | 22,6 |
| | ИТОГО: | 12 902 902,0 | 11 793 424,4 | | | - 1 109 477,6 | - 8,6 | 4 588 373,2 | | 35,6 | 38,9 |
