


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Обобщение результатов анализа и оценки информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам»

Содержание	Стр.
1. Анализ основных изменений в сфере правового регулирования осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области.....	5
2. Анализ основных показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за 2024 год и 1 полугодие 2025 года.....	11
2.1. Анализ основных показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за 2024 год.....	11
2.2. Анализ основных показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года.....	31
3. Анализ информации о результатах контроля в сфере закупок и аудита в сфере закупок в Ленинградской области за 2024 год.....	48
4. Анализ и оценка отдельных актуальных вопросов закупочной деятельности заказчиков Ленинградской области за 2024 год и истекший период 2025 года (на выборочной основе).....	63
Выводы.....	143
Рекомендации и предложения	164
Приложения №№ 1-6	171

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области

 М.А. Ляхова

«25» декабря 2025 года

Заключение

**о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Обобщение результатов анализа и оценки информации об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской
области по планируемым к заключению, заключенным и исполненным
контрактам»**

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Пункт 20 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 20.12.2024 № 01-09-55;

распоряжение Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 25.06.2025 № 01-13-30.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

Осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения государственных нужд Ленинградской области в 2024 году и 1 полугодии 2025 года; результаты контроля в сфере закупок и аудита в сфере закупок в Ленинградской области за 2024 год.

Цели проведения экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ и оценка информации об осуществлении заказчиками Ленинградской области¹ в 2024 году и 1 полугодии 2025 года закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, отдельных актуальных вопросов закупочной деятельности заказчиков Ленинградской области (на выборочной основе);

¹ Здесь и далее – в значении «заказчики регионального уровня» (органы государственной власти Ленинградской области, государственные учреждения и предприятия Ленинградской области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ленинградской области) (далее также – заказчики, заказчик).

подготовка предложений (рекомендаций) по устранению выявленных нарушений и недостатков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, совершенствованию закупочной деятельности заказчиков Ленинградской области, контрактной системы в сфере закупок (в случае необходимости).

Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

Заказчики Ленинградской области (на выборочной основе), в том числе заказчики Ленинградской области - объекты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в рамках которых Контрольно-счетной палатой Ленинградской области (далее также – КСП ЛО) проводилась проверка соблюдения объектами контроля (мероприятий) законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство о контрактной системе в сфере закупок, законодательство о контрактной системе), анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.

Объектами анализа и оценки при проведении экспертно-аналитического мероприятия «Обобщение результатов анализа и оценки информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам» (далее также - ЭАМ) являются также информация, предоставленная Комитетом государственного заказа Ленинградской области, органами, уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок (далее также – контрольный орган в сфере закупок) (по запросам КСП ЛО), информация и документы, размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (далее также – ЕИС), а также предоставленные заказчиками Ленинградской области (по запросам КСП ЛО).

Исследуемый период:

2024 год, 1 полугодие 2025 года².

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия:

С 01 июля 2025 года по 25 декабря 2025 года.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия:

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:

² Отдельные показатели осуществления закупок (с учетом имеющихся данных) проанализированы за 9 месяцев 2025 года.

1. Анализ основных изменений в сфере правового регулирования осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области

В 2025 году вступили в силу изменения, внесенные в законодательство о контрактной системе в сфере закупок, касающиеся применения национального режима в сфере закупок, действия антикризисных мер, направленных на поддержку поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В части, касающейся антикризисных мер, Федеральным законом № 494-ФЗ³ до конца 2025 года продлены:

право заказчиков проводить строительную закупку «под ключ» (часть 56 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ⁴);

возможность до 01.01.2026 в случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, включить в предмет контракта наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства поставку данного оборудования (часть 63.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ);

возможность изменения существенных условий контрактов, заключенных до 01.01.2026, на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, если при исполнении такого контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (часть 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ);

возможность изменения количества и цены контракта на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов не более чем на 30 % (часть 65.2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ);

возможность до 31.12.2025 не учитывать установленные пунктом 1 части 10 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ ограничения размера годового объема закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок (часть 75 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1981⁵ до конца 2025 года продлен срок, в течение которого при возникновении в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального

³ Федеральный закон от 26.12.2024 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 494-ФЗ).

⁴ Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1981 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 1981).

строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения, допускается изменение существенных условий контракта.

Вместе с тем антикризисные меры, предусмотренные частями 64.1⁶, 65.3⁷ и 71⁸ статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, в 2025 году прекратили свое действие.

С **01.01.2025** вступили в силу положения Федерального закона № 318-ФЗ⁹, реформирующие национальный режим в сфере закупок.

Согласно части 1 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ иностранным товарам, работам и услугам предоставлены равные условия с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими гражданами, российскими юридическими лицами.

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875¹⁰ установлены следующие ограничительные меры:

- запрет на закупку товаров иностранного происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, из Перечня № 1¹¹;
- ограничение на закупку товаров иностранного происхождения из Перечня № 2¹²;
- преимущество для товаров российского происхождения, которые не включены в Перечни № 1 и № 2.

Указанные меры распространяются также на товары, которые поставляются при выполнении закупаемых работ (оказании закупаемых услуг), и на товары - предметы лизинга. В то же время такие меры не применяются к товару, который заказчик не принимает к бухгалтерскому учету в соответствии с Федеральным законом № 402¹³ (пункт 1, подпункт «з» пункта 4 Постановления № 1875, пункт 4 письма Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 20.03.2025 № 24-03-08/27794).

⁶ Право заказчика не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств за исключением случая, когда контрактом предусмотрена выплата аванса и расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.

⁷ Возможность изменения существенных условий контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктами 3, 40, 41, 46, 52, 56, 59 и 62 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

⁸ Возможность исключения из совокупного годового объема закупок контрактов на закупку лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий при определении объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

⁹ Федеральный закон от 08.08.2024 № 318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 318-ФЗ).

¹⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875, Постановление № 1875).

¹¹ Приложение 1 к Постановлению № 1875 (далее – Перечень № 1).

¹² Приложение 2 к Постановлению № 1875 (далее – Перечень № 2).

¹³ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402).

Частью 9 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлением № 1875 установлены случаи, при которых ограничительные меры не применяются, в том числе, если закупается товар, поставляемый при выполнении работ или оказании услуг по изготовлению такого товара по индивидуальному заказу заказчика (абзац 7 подпункта «и» пункта 4 Постановления № 1875).

Статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлением № 1875 установлены особенности закупок, при осуществлении которых применяются ограничительные меры.

С 01.01.2025 при закупке товаров, в отношении которых установлен запрет, ограничение или преимущество, для заказчика установлена обязанность указывать в описании объекта закупки характеристики товара российского происхождения (часть 1.1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ).

Правительство Российской Федерации наделено правом устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг, в отношении которых установлены запрет, ограничение или преимущество. С 01.01.2025 такие особенности установлены в отношении товаров, подпадающих под запрет или ограничение закупки иностранных товаров (подпункты «в», «г» пункта 7 Постановления № 1875).

В соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик должен отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, если вследствие реорганизации юридического лица, являющегося подрядчиком (исполнителем), его права и обязанности по контракту перейдут к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на территории иностранного государства, в отношении которого установлены запрет или ограничение закупок работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, либо преимущество в отношении работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, и подрядчик (исполнитель) являлся российским лицом.

01.01.2025 вступила в силу часть 14 статьи 93¹⁴ Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчики вправе заключать контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с использованием ЕИС во всех случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением закупок по пунктам 4, 5, 23, 42, 44 и 46 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, для которых такая возможность предусмотрена с **01.07.2026**¹⁵.

При этом с **31.03.2025** заказчики обязаны заключать с использованием ЕИС контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в

¹⁴ Часть 14 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 360-ФЗ) в редакции Федерального закона от 26.12.2024 № 484-ФЗ.

¹⁵ Часть 15 статьи 8 Федерального закона № 360-ФЗ в редакции Федерального закона от 26.12.2024 № 484-ФЗ.

случаях, предусмотренных пунктами 2¹⁶, 6, 6.1, 11, 12, 54 и 55 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ¹⁷.

С **01.01.2025** действие пункта 10 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (право изменять существенные условия контракта по соглашению сторон) распространяется в том числе на пункт 3 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

С **30.01.2025** действует новый порядок выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 Постановления № 1875¹⁸.

С **03.02.2025** вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России) от 22.11.2024 № 894/24 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 67¹⁹ уточнены типовые условия контрактов на выполнение работ, связанных с регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, которые подлежат применению с **07.02.2025**.

С **01.04.2025** вступили в силу нормы Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ, согласно которым соглашения об изменении и расторжении контракта, заключенного по итогам электронных процедур, в том числе закрытых электронных процедур, оформляются через ЕИС.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2025 № 708²⁰ установлены случаи осуществления закупок, при которых такие закупки с **31.05.2025** не включаются в расчет совокупного годового объема

¹⁶ За исключением случая, когда Указом или распоряжением Президента Российской Федерации, постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации установлено условие о заключении контракта без использования ЕИС.

¹⁷ Часть 14 статьи 8 Федерального закона № 360-ФЗ в редакции Федерального закона от 26.12.2024 № 484-ФЗ.

¹⁸ Приказ Минпромторга России от 09.01.2025 № 7 «Об утверждении порядка выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрешения на закупку происходящего из иностранного государства товара, являющегося промышленной продукцией, предусмотренного подпунктом «а» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

¹⁹ Постановление Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 67 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2022 г. № 1445» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 29.01.2025 № 67).

²⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2025 № 708 «Об установлении случаев осуществления закупок, при которых такие закупки не включаются в расчет совокупного годового объема закупок при определении объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2025 № 708).

закупок при определении объема закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.06.2025 № 879²¹ и от 29.08.2025 № 1326²² приняты поправки к правилам применения национального режима в сфере закупок, вступившие в силу соответственно с **19.06.2025** и **01.09.2025**. В частности, уточнены:

особенности подтверждения страны происхождения товаров и порядок применения ограничительных мер при закупках медицинских изделий, лекарств и другой продукции;

исключения из правил национального режима (запрет, ограничение и преимущество не применяются к изделиям, которые поставляются при выполнении работ (оказании услуг) по изготовлению товара на заказ);

особенности, учитываемые заказчиком при описании объекта закупки (если заказчиком получено разрешение на закупку иностранного товара, то в извещении необходимо декларировать его получение и указать реквизиты такого разрешения, а также характеристики товара, которые должны быть идентичными тем, которые приведены в обращении на выдачу разрешения).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2025 № 1546²³ установлены типовые условия контрактов на оказание услуг по проведению строительного контроля, применяемые с **16.10.2025** при осуществлении закупок услуг по проведению строительного контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов и объектов транспортной инфраструктуры.

В истекшем периоде 2025 года внесены изменения в отдельные нормативные правовые акты Ленинградской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В целях реализации предложений Контрольно-счетной палаты Ленинградской области по результатам проведения в 2024 году экспертно-аналитического мероприятия «Обобщение результатов анализа и оценки информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам» приказом Управления делами Правительства

²¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2025 № 879 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2025 № 879).

²² Постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2025 № 1326 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 29.08.2025 № 1326).

²³ Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2025 № 1546 «О типовых условиях контрактов на оказание услуг по проведению строительного контроля, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2025 № 1546).

Ленинградской области от 11.03.2025 № 2²⁴ внесены изменения в приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 31.10.2022 № 14²⁵ в части определения порядка расчета нормативных затрат на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ленинградской области, проходящих гражданскую службу в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей Ленинградской области, а также лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, нормативных затрат на обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области, а также иных нормативных затрат на приобретение товаров и услуг, в отношении которых порядок расчета таких затрат Правилами определения нормативных затрат²⁶ не установлен.

Приказом Управления делами Правительства Ленинградской области от 30.05.2025 № 5²⁷ в приказ от 31.10.2022 № 14 внесены также изменения в части актуализации нормативов количества и (или) цены приобретения отдельных видов товаров.

В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие федеральному законодательству Комитетом государственного заказа Ленинградской области в соответствии с предложениями КСП ЛО в IV квартале 2025 года разработан проект постановления Правительства Ленинградской области²⁸, которым вносятся изменения в постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 531²⁹ и от 30.12.2015 № 530³⁰ в части наделения государственных

²⁴ Приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 11.03.2025 № 2 «О внесении изменений в приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 31 октября 2022 г. № 14 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ленинградской области» (далее - приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 11.03.2025 № 2).

²⁵ Приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 31.10.2022 № 14 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ленинградской области» (далее также – приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 31.10.2022 № 14, приказ от 31.10.2022 № 14).

²⁶ Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ленинградской области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Ленинградской области, включая соответственно подведомственные казенные учреждения, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 11.09.2015 № 352 (далее - Правила определения нормативных затрат).

²⁷ Приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 30.05.2025 № 5 «О внесении изменений в приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 31 октября 2022 г. № 14 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ленинградской области» (далее - приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 30.05.2025 № 5).

²⁸ Проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области».

²⁹ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 531 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 531).

органов Ленинградской области, не относящихся к органам исполнительной власти Ленинградской области³¹, правом самостоятельно утверждать нормативные затраты на обеспечение своих функций и требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Кроме того, указанным проектом постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 530 приводится в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2025 № 889³², которым уточнены значения характеристик в отношении автомобилей легковых, средств автотранспортных для перевозки 10 или более человек, автомобилей грузовых, включаемых в обязательный и ведомственные перечни закупаемых товаров, работ, услуг.

2. Анализ основных показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за 2024 год и 1 полугодие 2025 года

2.1. Анализ основных показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за 2024 год

Анализ показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области (далее также – нужд Ленинградской области) выполнен на основании данных аналитического отчета Комитета государственного заказа Ленинградской области о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области за 2024 год, размещенного на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.gz.lenobl.ru>, а также предоставленных Комитетом государственного заказа Ленинградской области по запросу КСП ЛО (письмо исх. № 01-26-388/2025-0-1 от 27.11.2025).

В 2024 году по сравнению с 2023 годом общее количество *закупок товаров, работ, услуг* для обеспечения нужд Ленинградской области

³⁰ Постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 530 «Об определении требований к закупаемым государственными органами Ленинградской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Ленинградской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 530).

³¹ Законодательное собрание Ленинградской области, Избирательная комиссия Ленинградской области, Контрольно-счетная палата Ленинградской области, Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области, Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области.

³² Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2025 № 889 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2025 № 889).

увеличилось на 19,1% (всего - 50 168 ед.) при росте суммарной стоимости закупок в 1,6 раза (всего - 94 125,8 млн. руб.) (таблица № 1).

Таблица № 1

**Количество и суммарная стоимость закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных заказчиками Ленинградской области
в 2023 - 2024 годах**

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Изменение значения показателя в 2024 году к 2023 году
Количество закупок, ед.	42 120	50 168	+ 19,1 %
Суммарная стоимость, млн. руб.*	58 989,3	94 125,8	рост в 1,6 раза

* сумма начальных (максимальных) цен контрактов (далее – Н(М)ЦК) и цен контрактов, заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

При этом увеличилось количество и стоимость как закупок, осуществленных заказчиками с применением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также – конкурентные способы (процедуры, закупки), так и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее также – закупки у единственных поставщиков) (таблица № 2).

Таблица № 2

**Количество и суммарная стоимость конкурентных закупок и закупок у
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах***

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего закупок товаров, работ, услуг	42 120	58 989,3	50 168	94 125,8
из общего числа закупок:				
конкурентные закупки	13 738	50 858,2	18 366	81 298,9
закупки у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	28 382	8 131,1	31 802	12 826,9

* здесь и далее в таблицах в разделе 2 заключения приведены данные в отношении закупок товаров, работ, услуг, осуществленных заказчиками Ленинградской области

За счет более высоких темпов прироста конкурентных закупок их доля в общем количестве закупок по сравнению с 2023 годом повысилась с 32,6% до 36,6% (в суммарной стоимости закупок с 86,2% до 86,4%) при соответствующем снижении доли закупок у единственных поставщиков.

Информация о структуре объемов закупок в разрезе конкурентных закупок и закупок у единственных поставщиков в 2023 - 2024 годах представлена на Рисунках 1, 2.

Рисунок 1

Доли конкурентных закупок и закупок у единственных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в общем количестве закупок
в 2023 - 2024 годах, %


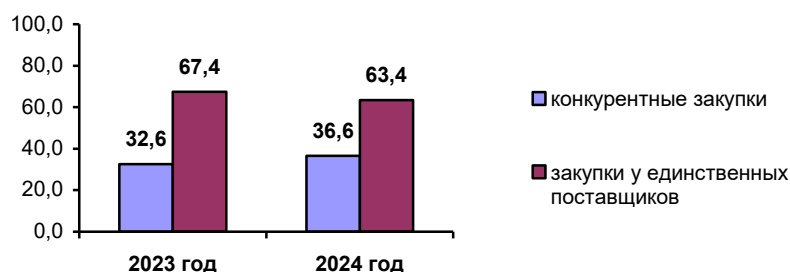


Рисунок 2

Доли конкурентных закупок и закупок у единственных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в суммарной стоимости закупок
в 2023 - 2024 годах, %

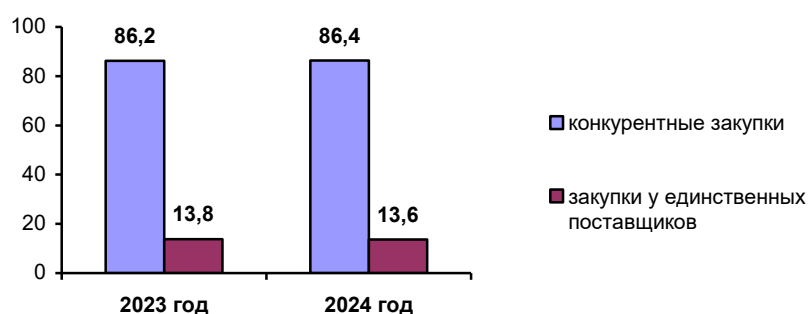

Информация о структуре закупок товаров, работ, услуг по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах представлена в таблице № 3, на Рисунках 3, 4.

Таблица № 3

Количество и суммарная стоимость закупок товаров, работ, услуг по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего закупок товаров, работ, услуг	42 120	58 989,3	50 168	94 125,8
из них осуществлено способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя):				
электронный аукцион	11 413	35 959,2	13 861	48 388,1
конкурс в электронной форме	368	12 863,7	586	29 929,1
запрос котировок в электронной форме	1 957	2 035,3	3 919	2 981,7

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	28 382	8 131,1	31 802	12 826,9

Рисунок 3

Доли закупок по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 году, %



Рисунок 4

Доли закупок по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2024 году, %



В 2024 году электронный аукцион по-прежнему являлся наиболее распространенным конкурентным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на который приходилось 27,6% от общего количества закупок (в 2023 – году 27,1%) и 51,4% от общей стоимости закупок (в 2023 году – 60,9%) (Рисунки 3, 4).

В 2024 году обращает внимание рост доли проведенных запросов котировок в электронной форме (в общем количестве закупок) – с 4,6% в 2023 году до 7,8% в 2024 году.

При этом в суммарной стоимости закупок наиболее значительно увеличилась доля закупок, осуществленных путем проведения электронного конкурса, - с 21,8% в 2023 году до 31,8% в 2024 году.

В 2024 году заказчики в соответствии с требованиями части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ обязаны были осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее также – СМП, СОНКО) в объеме не менее чем 25% совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, путем проведения открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), участниками которых являлись только СМП, СОНКО, а также установления требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО.

В 2024 году проведено 10 644 конкурентных процедур, участниками которых являлись только СМП и СОНКО, на сумму Н(М)ЦК 11 283,1 млн. руб., что больше, чем в 2023 году, по количеству – на 29,2%, по стоимости – на 35,3% (таблица № 4).

Таблица № 4

Количество и суммарная стоимость конкурентных процедур, проведенных среди СМП и СОНКО в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость*, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего завершенных конкурентных процедур**, из них:	13 432	46 811,0	17 808	77 595,9
процедур, в извещениях об осуществлении которых было установлено ограничение (преимущество) в отношении участников закупок: участниками закупок могут быть только СМП, СОНКО***	8 237	8 337,8	10 644	11 283,1
процедур, в извещениях об осуществлении которых было установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО	121	17 778,3	249	28 296,7

* сумма Н(М)ЦК;

** без учета отмененных процедур и процедур, по которым еще не заключены контракты;

*** в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ

Соответственно, доля указанных процедур в общем количестве завершенных конкурентных процедур составила 59,8% (в 2023 году – 61,3%), в

суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур – 14,5% (в 2023 году – 17,8%).

Кроме того, в 2024 году 249 процедур на сумму Н(М)ЦК 28 296,7 млн. руб. были объявлены с условием о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО (в 2023 году – 121 ед. на сумму Н(М)ЦК 17 778,3 млн. руб.).

Итоги конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Количество и суммарная стоимость состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур в 2023 - 2024 годах, в том числе по основаниям признания процедур несостоявшимися

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего завершенных конкурентных процедур,	13 432	46 811,0	17 808	77 595,9
в том числе:				
<i>состоявшихся конкурентных процедур</i> (подано и признано соответствующими требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок две или более заявок)	6 119	14 770,8	7 645	21 414,2
<i>несостоявшихся конкурентных процедур,</i>	7 313	32 040,3	10 163	56 181,7
из них признаны несостоявшимися по основаниям*:				
подана единственная заявка, признанная соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок,	5 759	26 625,9	8 083	49 004,3
одна заявка из двух или более поданных заявок признана соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок	356	1 020,2	327	1 210,9
не подано ни одной заявки	1 050	3 866,8	1 640	3 532,9
отклонены все заявки	146	523,8	109	1 890,5

* расчетно на основании данных аналитических отчетов Комитета государственного заказа Ленинградской области о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области за 2023 - 2024 годы

Количество и стоимость несостоявшихся конкурентных процедур в 2024 году по-прежнему превышали соответствующие объемы состоявшихся конкурентных процедур, в том числе по суммарной стоимости процедур - в 2,6 раза.

Доля несостоявшихся конкурентных процедур в 2024 году повысилась относительно показателей 2023 года и составила 57,1% от общего количества и 72,4% от суммарной стоимости завершённых конкурентных процедур (в 2023 году соответственно 54,4% и 68,4%).

В основном конкурентные процедуры были признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в торгах, которая была признана соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 79,5% от общего количества и 87,2% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур (в 2023 году соответственно 78,8% и 83,1%).

Другим значимым основанием для признания торгов несостоявшимися являлось отсутствие заявок на участие в торгах – 16,1% от общего количества и 6,3% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур (в 2023 году – соответственно 14,4% от общего количества и 12,1% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур).

Всего из завершённых конкурентных процедур 17 808 ед. на сумму Н(М)ЦК 77 595,9 млн. руб. состоялись и привели к заключению контрактов 7 645 ед. на сумму Н(М)ЦК 21 414,2 млн. руб. (42,9% от количества и 27,6% от стоимости завершённых конкурентных процедур).

Признаны несостоявшимися и завершились заключением контрактов (договоров) с единственными участниками 8 414 процедур на сумму Н(М)ЦК 50 758,3 млн. руб. (таблица № 6).

Таблица № 6

Итоги конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего завершённых конкурентных процедур, из них:	13 432	46 811,0	17 808	77 595,9
состоялись и привели к заключению контрактов (договоров)	6 119	14 770,8	7 645	21 414,2
признаны несостоявшимися и не привели к заключению контрактов (договоров) (отсутствие заявок, все заявки отклонены, иные причины)	1 196	4 390,7	1 749	5 423,4
признаны несостоявшимися и по их итогам контракты (договоры) заключены с единственными участниками процедур на основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	6 117	27 649,5	8 414	50 758,3

Доля таких процедур в общем количестве завершённых конкурентных процедур увеличилась по сравнению с 2023 годом – с 45,5% в 2023 году до 47,3% в 2024 году, в суммарной стоимости завершённых конкурентных процедур - с 59,1% в 2023 году до 65,4% в 2024 году (Рисунки 5, 6).

Рисунок 5


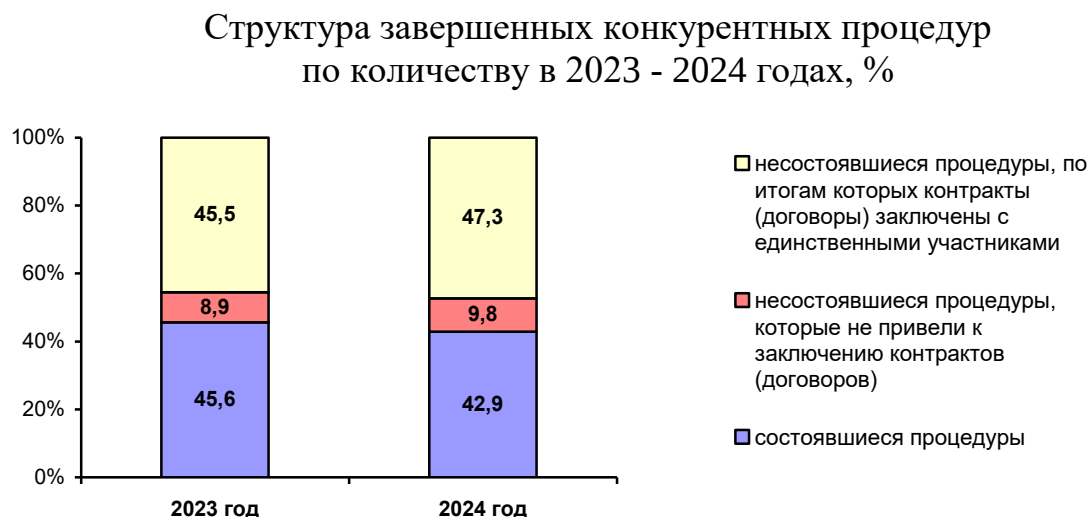


Рисунок 6

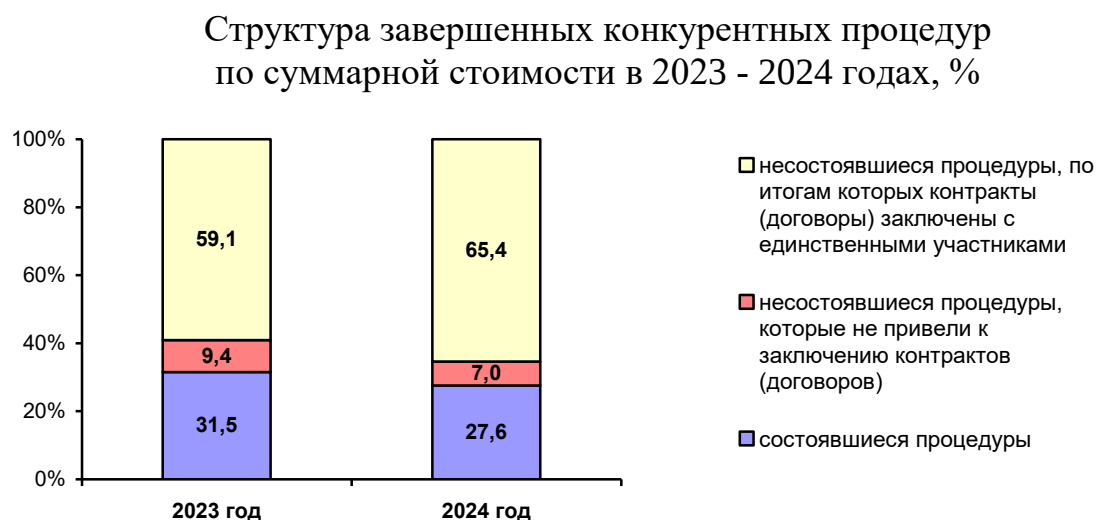

Распределение несостоявшихся конкурентных процедур в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2023 - 2024 годах представлено в таблице № 7.

Таблица № 7

Количество и суммарная стоимость несостоявшихся конкурентных процедур по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего несостоявшихся конкурентных процедур, в том числе по итогам способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):	7 313	32 040,3	10 163	56 181,7
электронный аукцион	6 126	21 667,9	7 765	34 668,1

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
конкурс в электронной форме	179	9 309,3	295	19 703,7
запрос котировок в электронной форме	1 008	1 063,1	2 103	1 809,9

В 2024 году, как и в 2023 году, наибольшее количество и сумма Н(М)ЦК несостоявшихся процедур приходились на электронные аукционы – 76,4% от общего количества и 61,7% от суммы Н(М)ЦК несостоявшихся конкурентных процедур (в 2023 году - 83,8% от общего количества и 67,6% от суммы Н(М)ЦК несостоявшихся конкурентных процедур).

Более высокие доли несостоявшихся процедур среди основных конкурентных способов сложились в 2024 году по итогам электронных аукционов: количество несостоявшихся процедур составило 57,7% от общего количества процедур путем проведения электронного аукциона, сумма Н(М)ЦК несостоявшихся процедур - 73,7% от суммы Н(М)ЦК электронных аукционов (таблица № 8).

Таблица № 8

Доля несостоявшихся конкурентных процедур по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2024 году

Наименование показателя	Завершенные конкурентные процедуры, всего		из них несостоявшиеся процедуры		Доля несостоявшихся процедур, %	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	в общем количестве	в суммарной стоимости
Всего, в том числе по итогам способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):	17 808	77 595,9	10 163	56 181,7	57,1	72,4
электронный аукцион	13 453	47 048,2	7 765	34 668,1	57,7	73,7
конкурс в электронной форме	535	27 651,7	295	19 703,7	55,1	71,3
запрос котировок в электронной форме	3 820	2 896,0	2 103	1 809,9	55,1	62,5

В 2024 году заказчиками Ленинградской области заключено **контрактов (договоров)** 48 801 ед. на общую сумму 81 780,5 млн. руб., что больше, чем в 2023 году, по количеству – на 16,9%, по суммарной стоимости (цене) - в 1,7 раза (таблица № 9).

Таблица № 9

**Количество и суммарная стоимость (цена) контрактов (договоров),
заключенных заказчиками Ленинградской области
в 2023 - 2024 годах**

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Изменение значения показателя в 2024 году к 2023 году
Количество контрактов (договоров), ед.	41 736	48 801	+ 16,9 %
Суммарная стоимость (цена), млн. руб.	48 832,5	81 780,5	+ 67,4 %

По результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 34,8% от общего количества контрактов и 84,3% от их суммарной стоимости (цены) (таблица № 10).

Таблица № 10


**Количество и суммарная стоимость (цена) контрактов (договоров),
заключенных по результатам конкурентных процедур и закупок у
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах**

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.
Всего заключено контрактов (договоров)	41 736	48 832,5	48 801	81 780,5
из них по результатам:				
конкурентных процедур	13 354	40 701,4	16 999	68 953,6
закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	28 382	8 131,1	31 802	12 826,9


Следует отметить, что в структуре заключенных контрактов (договоров) доля контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур, в общем количестве контрактов (договоров) повысилась с 32% в 2023 году до 34,8% в 2024 году, в суммарной стоимости (цене) контрактов (договоров) - с 32,0% в 2023 году до 34,8% в 2024 году (Рисунки 7, 8).

Рисунок 7

**Доли контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных
процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в общем количестве контрактов (договоров)
в 2023 - 2024 годах, %**

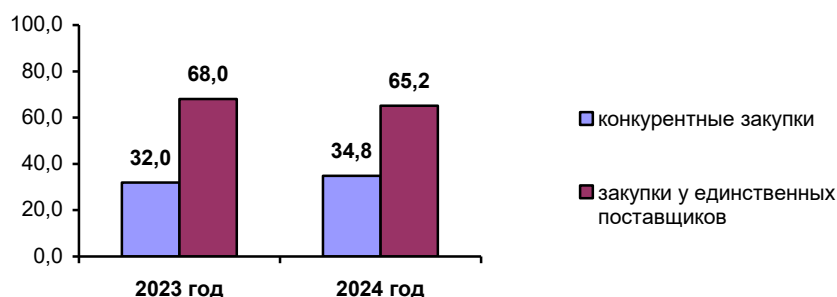

Доли контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в суммарной стоимости (цене) контрактов (договоров) в 2023 - 2024 годах, %

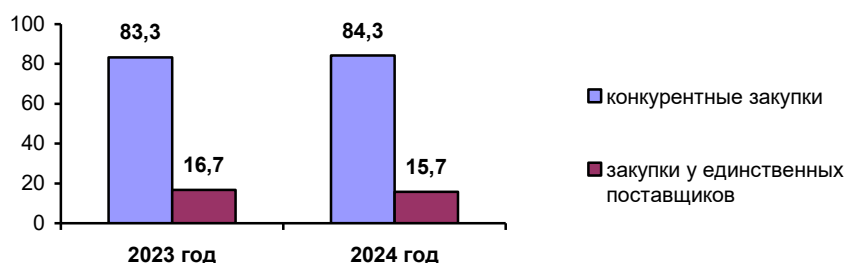

В 2024 году в структуре заключенных контрактов (договоров) по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отмечается увеличение в общем количестве контрактов доли контрактов, заключённых по результатам запросов котировок в электронной форме, в суммарной стоимости (цене) контрактов (договоров) – доли контрактов, заключенных по результатам электронных конкурсов (таблица № 11, Рисунки 9, 10).

Таблица № 11

Количество и суммарная стоимость (цена) заключенных контрактов (договоров) по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.
Всего заключено контрактов (договоров)	41 736	48 832,5	48 801	81 780,5
из них по результатам способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):				
электронный аукцион	11 193	26 842,4	13 129	44 014,3
конкурс в электронной форме	497	12 296,7	602	22 614,6
запрос котировок в электронной форме	1 664	1 562,2	3 268	2 324,7
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	28 382	8 131,1	31 802	12 826,9

Рисунок 9

Доли заключенных контрактов (договоров) по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 году, %


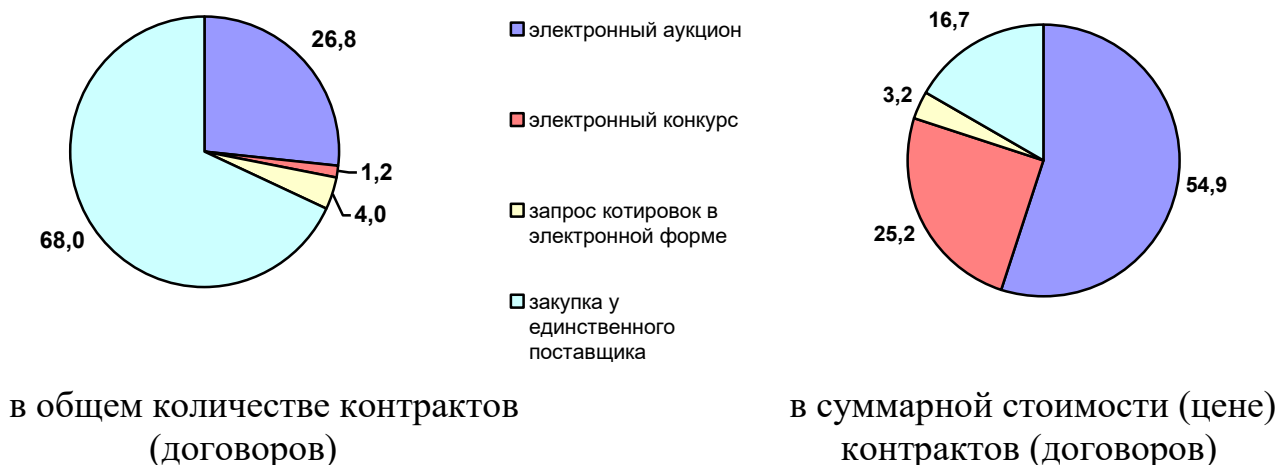


Рисунок 10

Доли заключенных контрактов (договоров) по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2024 году, %

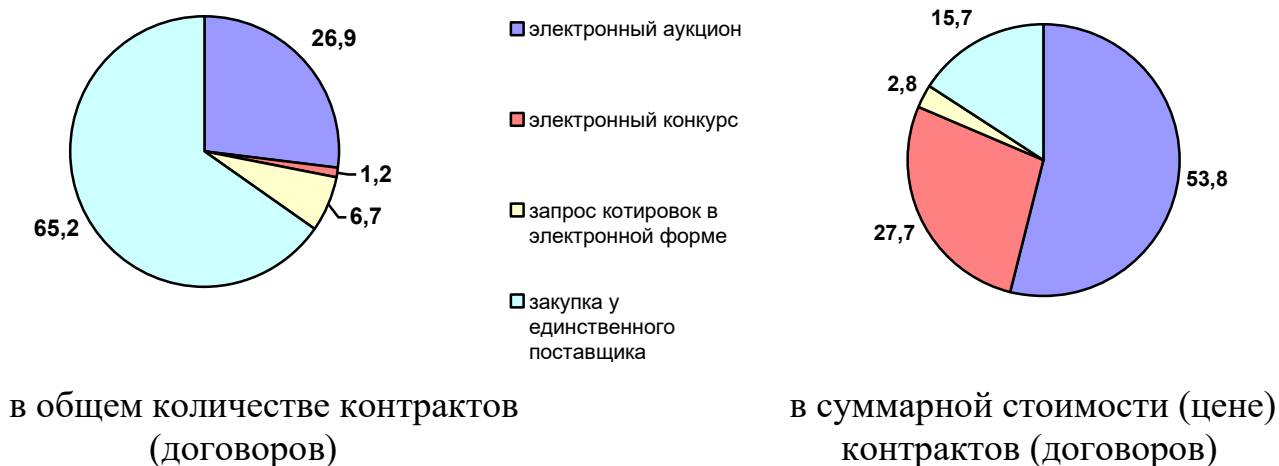

По итогам процедур закупок 65,2% контрактов заключены по результатам прямых закупок у единственных поставщиков, 18,2% - по итогам несостоявшихся конкурентных процедур с единственными участниками процедур на основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 16,6% - по результатам состоявшихся конкурентных процедур.

В структуре суммарной стоимости (цены) контрактов (договоров) наибольшая доля в 2024 году (60,6%) приходится на несостоявшиеся конкурентные процедуры, по результатам которых контракты заключены с единственными участниками процедур, 23,7% - на состоявшиеся конкурентные процедуры, 15,7% - прямые закупки у единственных поставщиков.

По сравнению с 2023 годом в структуре контрактов (по количеству) выросла доля контрактов, заключенных по результатам состоявшихся конкурентных процедур - с 15,4% до 16,6% от общего количества заключенных контрактов, в то же время их доля в суммарной стоимости (цене) контрактов снизилась с 26,7% до 23,7%.

В структуре контрактов отмечен рост доли несостоявшихся конкурентных процедур, по результатам которых контракты заключены с единственными участниками процедур, как в общем количестве (с 16,6% в 2023 году до 18,2% в 2024 году), так и в суммарной стоимости (цене) контрактов (с 56,6% в 2023 году до 60,6% в 2024 году) (таблица № 12, Рисунки 11, 12).


Таблица № 12

Количество и суммарная стоимость (цена) контрактов (договоров), заключенных по итогам состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах


Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.
Всего заключено контрактов (договоров), из них по итогам:	41 736	48 832,5	48 801	81 780,5
состоявшихся конкурентных процедур	6 420	13 057,2	8 107	19 369,5
несостоявшихся конкурентных процедур с единственными участниками	6 934	27 644,2	8 892	49 584,1
закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	28 382	8 131,1	31 802	12 826,9

Рисунок 11

Структура количества контрактов (договоров), заключенных по итогам состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах, %

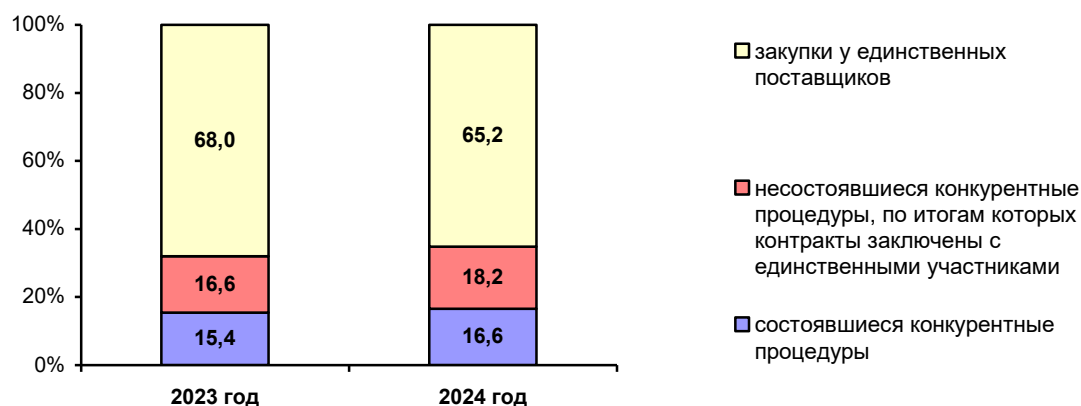

Структура суммарной стоимости (цены) контрактов (договоров), заключенных по итогам состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах, %

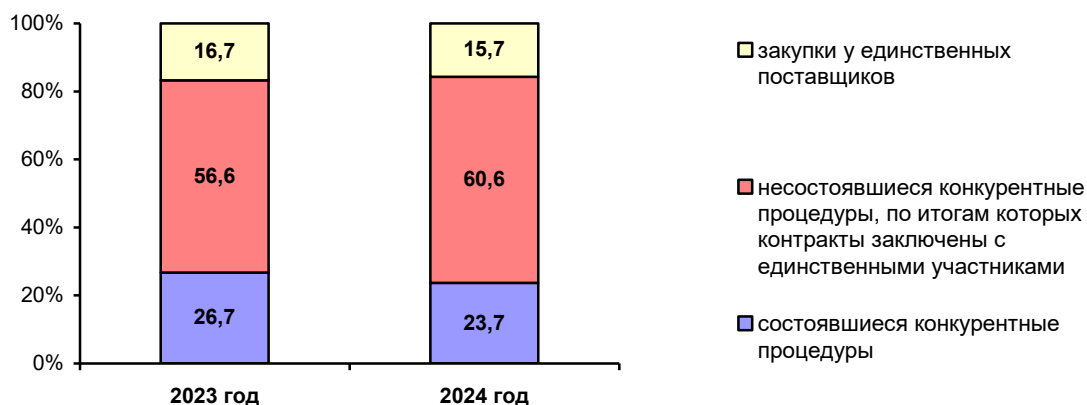

В целом доля контрактов (договоров), заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) (с учетом заключенных по иным основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ), составила в 2024 году 76,3% от суммарной стоимости (цены) всех заключенных контрактов (договоров) (в 2023 году - 73,3%) и повысилась относительно 2023 года за счет роста суммарной стоимости (цены) контрактов (договоров), заключенных с единственными участниками по итогам несостоявшихся конкурентных процедур (в 1,8 раза).

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 05.08.2024 № 457-р³³ органам исполнительной власти, органам местного самоуправления Ленинградской области и подведомственным им учреждениям рекомендовано предусматривать закупки у СМП в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в объеме не менее 40% от стоимости контрактов, заключенных в текущем финансовом году, без учета контрактов, указанных в части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

В 2024 году совокупный объем закупок, осуществленных заказчиками Ленинградской области у СМП в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, включая в том числе объемы привлечения СМП к исполнению контрактов³⁴, составил 27 787,8 млн. руб. или 40,3% от суммарной стоимости контрактов, заключенных заказчиками (без учета

³³ Распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.08.2024 № 457-р «О мерах по расширению участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области» (далее - распоряжение Правительства Ленинградской области от 05.08.2024 № 457-р).

³⁴ С учетом стоимости контрактов, заключенных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (при установлении в извещении об осуществлении закупки требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО), где победителем является СМП.

контрактов, указанных в части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ³⁵) (в 2023 году - 17 303,1 млн. руб. или 45% от суммарной стоимости контрактов).

С учетом стоимости контрактов, заключенных заказчиками с СМП по результатам проведения конкурентных процедур на общих основаниях (без установления преимущества СМП, СОНКО), указанная доля составила в 2024 году 59,3% (в 2023 году – 64,2%).

По результатам анализа *закупок у единственных поставщиков* за 2024 год установлено следующее.

Закупки малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (на сумму не более 600 тыс. руб. и, в случае осуществления закупки в электронной форме, не более 3 млн. руб.) составили в 2024 году 83,5% от общего количества и 25,6% от общей стоимости закупок у единственных поставщиков (таблица № 13).

Количество таких закупок увеличилось в 2024 году на 6,7% при росте их стоимости в 1,3 раза.

Таблица № 13

Количество и суммарная стоимость закупок у единственных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	2023 год		2024 год		Изменение значения показателя в 2024 году к 2023 году	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество	Суммарная стоимость
Всего закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них:	28 382	8 131,1	31 802	12 826,9	+ 12,1 %	рост в 1,6 раза
закупки малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	24 897	2 608,9	26 554	3 285,6	+ 6,7 %	рост в 1,3 раза
закупки в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в электронном виде*	25 073	2 689,1	25 981	3 111,7	+ 3,6%	+ 15,7%

* количество и суммарная стоимость размещенных закупок (с учетом повторных)

По данным Комитета государственного заказа Ленинградской области, в 2024 году заказчиками Ленинградской области в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Ленинградской области от 24.02.2014 № 32³⁶

³⁵ Информация представлена Комитетом государственного заказа Ленинградской области письмом исх. № 01-26-388/2025-0-1 от 27.11.2025.

³⁶ Постановление Правительства Ленинградской области от 24.02.2014 № 32 «О порядке функционирования и использования автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (далее - постановление Правительства Ленинградской области от 24.02.2014 № 32).

осуществлено в электронном виде с использованием информационного ресурса автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» - агрегатора торговли Ленинградской области 25 981 ед. закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (с учетом повторных) суммарной (начальной) стоимостью 3 111,7 млн. руб.

Показатель конкурентности по закупкам, осуществленным в электронном виде с использованием агрегатора торговли Ленинградской области, составил в 2024 году 1,7 предложений (оферт) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну закупку.

Наличие конкуренции при осуществлении закупок у единственного поставщика в электронном виде позволило достичь в 2024 году экономии бюджетных средств при заключении контрактов (договоров) по результатам таких закупок в сумме 113,3 млн. руб. или 3,6% от суммарной (начальной) стоимости закупок, осуществленных в электронном виде с использованием агрегатора торговли Ленинградской области (в 2023 году - 75,8 млн. руб. или 2,8% от суммарной (начальной) стоимости закупок).

Среди иных оснований для заключения контрактов (договоров) с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (за исключением пунктов 4, 5, 24, 25) в 2024 году преобладали следующие:

- закупки оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ: 21,0% от общего количества и 24,5% от суммарной стоимости закупок у единственных поставщиков³⁷;

- закупки товаров, работ или услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий – 10,1% от общего количества и 10,1% от суммарной стоимости закупок у единственных поставщиков;

- закупки по договору энергоснабжения или договору купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии в соответствии с пунктом 29 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ: 5,8% от общего количества и 13,1% от суммарной стоимости закупок у единственных поставщиков.

Данные о динамике количества и суммарной стоимости (цены) **расторгнутых контрактов (договоров)** из числа контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представлены в таблице № 14³⁸.

³⁷ За исключением закупок в соответствии с пунктами 4, 5, 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

³⁸ По данным аналитических отчетов Комитета государственного заказа Ленинградской области о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области за соответствующие годы.

**Количество и суммарная стоимость (цена) расторгнутых контрактов
(договоров) в 2020 - 2024 годах***

Годы	Количество расторгнутых контрактов (договоров), ед.	Суммарная стоимость (цена) расторгнутых контрактов (договоров), млн. руб.	Доля расторгнутых контрактов (договоров) в общем количестве и суммарной стоимости (цене) контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур, %	
			количество	стоимость
2020	1 221	2 815,5	9,6	8,0
2021	1 010	1 023,8	7,1	3,0
2022	438	1 525,1	3,0	3,8
2023	1 126	2 490,9	8,4	6,1
2024	1 522	2 661,4	9,0	3,9

* из числа контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

В 2024 году 96,6% от общего количества расторгнутых контрактов расторгнуто по соглашению сторон (1 470 ед. на общую сумму 2 615,8 млн. руб.).

Вследствие одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов расторгнуто 48 контрактов (договоров) на общую сумму 39,4 млн. руб. (3,2% от общего количества и 1,5% от суммарной стоимости (цены) расторгнутых контрактов (договоров). 1 контракт на сумму 6 млн. руб. расторгнут вследствие одностороннего отказа исполнителя от исполнения контракта.

В соответствии с частью 4 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ информация о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в одностороннем порядке или по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для рассмотрения вопроса о включении такой информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - реестр недобросовестных поставщиков).

Согласно сведениям, представленным Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области (далее – УФАС по Ленинградской области), осуществляющим ведение **реестра недобросовестных поставщиков** (письмо исх. № АВ/8801/25 от 16.10.2025), всего в 2024 году в УФАС по Ленинградской области поступило 387 обращений заказчиков регионального и муниципального уровня о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, что на 36,3% больше, чем в 2023 году (таблица № 15).

Таблица № 15

Результаты рассмотрения УФАС по Ленинградской области обращений заказчиков о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков в 2023 - 2024 годах*

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Изменение значения показателя в 2024 году к 2023 году
Всего рассмотрено обращений заказчиков о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе:	284	387	+ 36,3%
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов	117	148	+ 26,5%
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов	164	238	+ 45,1%
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда	3	1	снижение в 3 раза
Принято решение о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе:	97	154	рост в 1,6 раза
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов	4	13	рост в 3,3 раза
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов	91	140	рост в 1,5 раза
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда	2	1	снижение в 2 раза

* сведения приведены в отношении обращений заказчиков регионального и муниципального уровня

По результатам рассмотрения обращений в 39,8% случаев были приняты решения о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков (в 2023 году – в 34,2% случаев).

Из общего количества обращений 61,5% (в 2023 году – 57,7%) составили обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (238 обращений).

Количество таких обращений по сравнению с 2023 года увеличилось в 1,5 раза. В 58,8% случаев по указанным обращениям были приняты решения о включении информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков.

Из общего количества обращений, по которым в 2024 году были приняты решения о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, 91% составили случаи включения в реестр информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов.

Более половины (56,6%) от общего количества обращений в 2024 году о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков поступило от заказчиков регионального уровня (219 обращений). По обращениям о включении в реестр информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов, доля обращений, поступивших от заказчиков регионального уровня, составила 53,4% (127 обращений).

Следует отметить, что в 2024 году по сравнению с предыдущим годом количество обращений о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков увеличилось как от заказчиков регионального, так и заказчиков муниципального уровня - на 55,3% и на 17,5% соответственно.

По итогам 2024 года **уровень конкурентности закупок** для обеспечения государственных нужд Ленинградской области, оцениваемый по показателю «среднее количество поданных заявок на 1 закупку (лот)», в том числе по основным способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), незначительно снизился (таблица № 16).

Таблица № 16

Среднее количество заявок на 1 закупку (лот), поданных участниками конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	Общее количество поданных заявок, ед.		Среднее количество заявок на 1 закупку (лот), ед.*		Общее количество заявок участников, допущенных к процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ед.		Среднее количество допущенных заявок на 1 закупку (лот), ед.*	
	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
Всего, в том числе по способам	30 614	38 849	2,3	2,18	28 826	37 026	2,1	2,08

Наименование показателя	Общее количество поданных заявок, ед.		Среднее количество заявок на 1 закупку (лот), ед.*		Общее количество заявок участников, допущенных к процедурам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ед.		Среднее количество допущенных заявок на 1 закупку (лот), ед.*	
	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год	2023 год	2024 год
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):								
конкурсы в электронной форме	732	1 111	2,2	2,08	506	1 052	1,5	1,97
электронные аукционы	25 523	29 253	2,3	2,18	24 224	27 884	2,2	2,07
запросы котировок в электронной форме	4 359	8 485	2,3	2,22	4 096	8 090	2,2	2,12

* показатели рассчитаны исходя из количества завершенных конкурентных процедур

Среднее количество заявок на 1 закупку (лот), поданных участниками конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), составило 2,2 заявки в 2024 году против 2,3 заявок в 2023 году.

Среднее количество допущенных заявок на 1 закупку (лот) не изменилось, составив в среднем 2,1 заявки.

Конкурентность закупок также отражают данные о распределении закупок в зависимости от количества поданных заявок (участников закупок).

По результатам анализа итогов конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2024 году установлено, что в 45,9% от общего количества завершенных конкурентных процедур (65,1% от суммарной стоимости этих процедур) была подана всего одна заявка (в 2023 году - в 43,6% от общего количества указанных процедур (57,3% от суммарной стоимости процедур) (таблица № 17).

Таблица № 17

**Распределение конкурентных процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по количеству поданных заявок
в 2023 - 2024 годах**

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего завершенных конкурентных процедур, из них процедуры, на участие в которых подано:*	13 432	46 811,0	17 808	77 595,9
2 или более заявок	6 525	16 097,6	7 998	22 984,8
1 заявка	5 855	26 843,1	8 166	50 535,1

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
0 заявок	1 050	3 866,8	1 640	3 532,9

* расчетно (на основании данных аналитических отчетов Комитета государственного заказа Ленинградской области о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области за 2023 и 2024 годы)

Доля конкурентных процедур, на участие в которых было подано 2 или более заявок, составила в 2024 году 44,9% от общего количества и 29,6% от суммарной стоимости завершённых конкурентных процедур (в 2023 году – 48,6% от общего количества и 34,4% от суммарной стоимости указанных процедур).

Показатель относительной экономии бюджетных средств³⁹ по результатам заключения контрактов (договоров) заказчиками Ленинградской области (заказчики регионального уровня), по данным ЕИС, ниже среднего значения аналогичного показателя по Российской Федерации: за 2024 год по Ленинградской области – 4,2% (заказчики регионального уровня), в среднем по Российской Федерации (все категории заказчиков) – 5,3%. Отмечается также тенденция снижения данного показателя в период с 2020 года, что в целом объясняется низкими показателями конкурентности закупок (таблица № 18).

Таблица № 18

Относительная экономия бюджетных средств при заключении
контрактов (договоров) в 2020 - 2024 годах, %*

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Ленинградская область (заказчики регионального уровня)	7,5	6,9	6,5	5,4	4,2
Российская Федерация (все категории заказчиков)	8,2	7,2	6,4	6,6	5,3

* по данным ЕИС (на текущую дату)

2.2. Анализ основных показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года

Анализ показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года выполнен на основании данных аналитического отчета Комитета государственного заказа Ленинградской области о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

³⁹ Отношение абсолютной экономии (разница между суммарной Н(М)ЦК и суммарной стоимостью заключенных контрактов (договоров) к суммарной Н(М)ЦК (без учета Н(М)ЦК несостоявшихся процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые не привели к заключению контрактов (договоров), в %.

Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года⁴⁰, размещенного на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.gz.lenobl.ru>. Отдельные показатели, по которым имеются данные, проанализированы за 9 месяцев 2025 года⁴¹.

В 1 полугодии 2025 года заказчиками Ленинградской области осуществлено **закупок товаров, работ, услуг** на 3,4% меньше, чем в 1 полугодии 2024 года (всего - 24 192 ед.), суммарная стоимости закупок меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, на 21,7% (всего - 37 185,7 млн. руб.) (таблица № 19).

Таблица № 19

Количество и суммарная стоимость закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных заказчиками Ленинградской области
в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года	1 полугодие 2025 года	Изменение значения показателя в 1 полугодии 2025 года к 1 полугодию 2024 года
Количество закупок, ед.	25 040	24 192	- 3,4 %
Суммарная стоимость, млн. руб.	47 510,9	37 185,7	- 21,7 %

При практически неизменном количестве конкурентных процедур в 1 полугодии 2025 года относительно 1 полугодия 2024 года отмечено снижение количества закупок у единственных поставщиков на 5,1% при увеличении их суммарной стоимости на 21,7% (таблица № 20).

Таблица № 20

Количество и суммарная стоимость конкурентных закупок и закупок у
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего закупок товаров, работ, услуг	25 040	47 510,9	24 192	37 185,7
из общего числа закупок:				
конкурентные закупки	8 684	42 704,5	8 673	31 336,9
закупки у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	16 356	4 806,4	15 519	5 848,8

Доля конкурентных процедур увеличилась в общем количестве закупок (с 34,7% в 1 полугодии 2024 года до 35,9% в 1 полугодии 2025 года) при снижении соответствующей доли в суммарной стоимости закупок (соответственно с 89,9% до 84,3%) (Рисунки 13, 14).

⁴⁰ В соответствии с приказом Комитета государственного заказа Ленинградской области от 02.03.2020 № 5-п мониторинг закупок осуществляется Комитетом по итогам первого полугодия и года.

⁴¹ Информация предоставлена Комитетом государственного заказа Ленинградской области по запросу КСП ЛО письмом исх. № 01-26-388/2025-0-1 от 27.11.2025.

Рисунок 13

Доли конкурентных закупок и закупок у единственных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в общем количестве закупок
в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, %


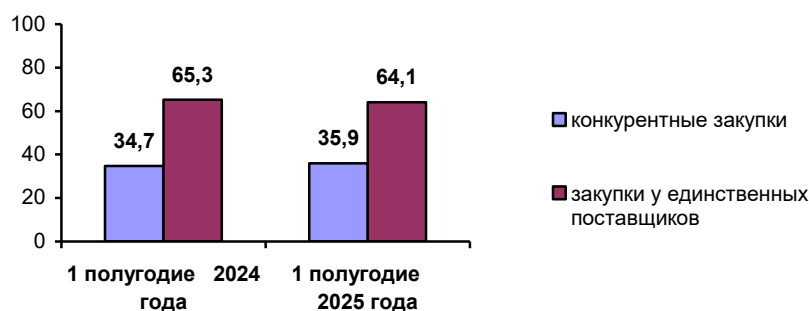


Рисунок 14

Доли конкурентных закупок и закупок у единственных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в суммарной стоимости закупок
в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, %

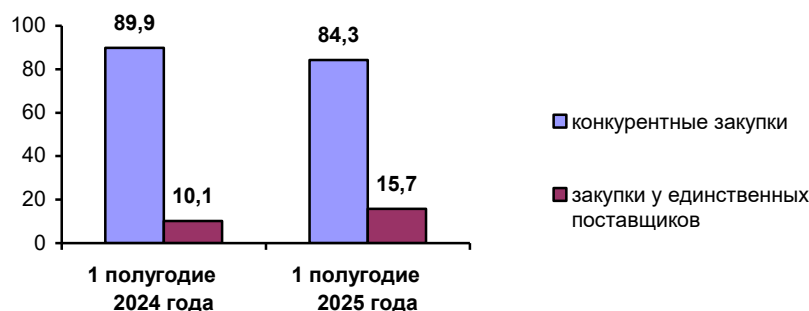

В структуре закупок в 1 полугодии 2025 года отмечается увеличение количества и стоимости проведенных запросов котировок в электронной форме и, соответственно, их доли в общем количестве и стоимости закупок (таблица № 21, Рисунки 15, 16).

Таблица № 21


Количество и суммарная стоимость закупок товаров, работ, услуг по способам
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего закупок товаров, работ, услуг	25 040	47 510,9	24 192	37 185,7
из них осуществлено способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя):				
электронный аукцион	6 934	25 566,7	5 800	16 789,7
конкурс в электронной форме	290	16 028,0	297	12 800,4
запрос котировок в	1 460	1 109,8	2 576	1 746,8

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
электронной форме				
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	16 356	4 806,4	15 519	5 848,8

Рисунок 15

Доли закупок по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2024 года, %

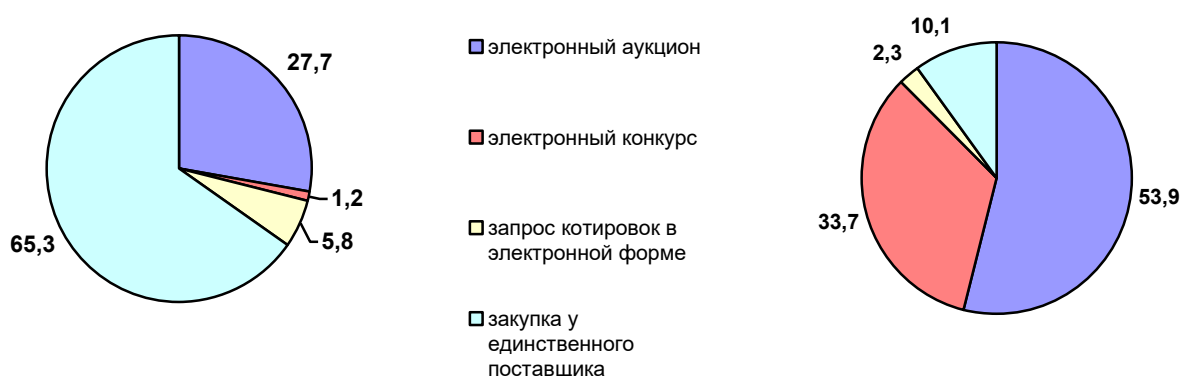


в общем количестве закупок

в суммарной стоимости закупок

Рисунок 16

Доли закупок по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2025 года, %

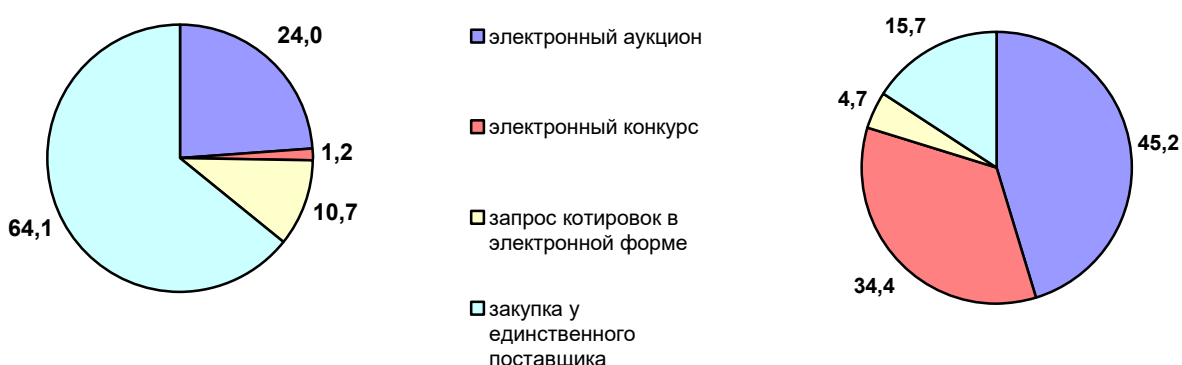

в общем количестве закупок

в суммарной стоимости закупок

В 1 полугодии 2025 года заказчиками Ленинградской области размещено среди СМП и СОНКО с установлением в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ соответствующего преимущества участникам закупок 70% от общего количества и 24% от суммарной стоимости всех завершающих конкурентных процедур (в 1 полугодии 2024 года – 62,7% от

общего количества и 13% от суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур).

По сравнению с 1 полугодием 2024 года количество конкурентных процедур, проведенных среди СМП и СОНКО, увеличилось на 7,5%, суммарная стоимость таких процедур - на 34,1% (таблица № 22).

Таблица № 22

**Количество и суммарная стоимость конкурентных процедур, проведенных
среди СМП и СОНКО в 1 полугодии 2024 - 2025 годов**

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего завершенных конкурентных процедур, из них:	8 473	40 865,7	8 153	29 693,0
процедур, в извещениях об осуществлении которых было установлено ограничение (преимущество) в отношении участников закупок: участниками закупок могут быть только СМП, СОНКО*	5 312	5 314,9	5 710	7 125,0
процедур, в извещениях об осуществлении которых было установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО	131	17 406,8	128	14 978,9

* в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ

В 1 полугодии 2025 года 128 процедур на сумму Н(М)ЦК 14 978,9 млн. руб. объявлено с условием о привлечении к исполнению контрактов (договоров) субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНКО (в 1 полугодии 2024 года - 131 ед. на сумму Н(М)ЦК 17 406,8 млн. руб.).

Итоги конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2024 - 2025 годов представлены в таблице № 23.

Таблица № 23

**Количество и суммарная стоимость состоявшихся и несостоявшихся
конкурентных процедур в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, в том числе по
основаниям признания процедур несостоявшимися**

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего завершенных конкурентных процедур,	8 473	40 865,7	8 153	29 693,0
в том числе:				
<i>состоявшихся конкурентных процедур</i> (подано и признано соответствующими требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной	3 761	12 319,6	3 504	8 748,6

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
системе в сфере закупок две или более заявок)				
<i>несостоявшихся конкурентных процедур,</i>	4 712	28 546,1	4 649	20 944,4
из них признаны несостоявшимися по основаниям:				
подана единственная заявка, признанная соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок	3 735	24 882,7	3 503	15 512,1
одна заявка из двух или более поданных заявок признана соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок	169	1 147,4	243	1 401,6
не подано ни одной заявки	755	1 147,4	810	2 886,8
отклонены все заявки	52	1 368,6	93	1 143,9

* рассчитано на основании данных аналитических отчетов Комитета государственного заказа Ленинградской области о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области за 1 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года.

Доля несостоявшихся конкурентных процедур в 1 полугодии 2025 года составила 57% от общего количества и 70,5% от суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур и незначительно повысилась по сравнению с 1 полугодием 2024 года (55,6% от общего количества и 69,9% от суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур).

В основном конкурентные процедуры были признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в торгах, которая была признана соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 75,4% от общего количества и 74,1% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур (в 1 полугодии 2024 года соответственно 79,3% и 87,2%).

Несколько повысилась доля иных оснований для признания торгов несостоявшимися: торгов, в которых не было подано ни одной заявки, либо одна заявка из двух или более поданных заявок была признана соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, либо отклонены все заявки (в 1 полугодии 2024 года – соответственно 20,7% от общего количества и 12,8% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур, в 1 полугодии 2025 года - 24,6% от общего количества и 25,9% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур).

Вторым по значимости основанием для признания торгов несостоявшимися, как и в 1 полугодии 2024 года, являлось отсутствие заявок на

участие в торгах: в 17,4% несостоявшихся конкурентных процедур, стоимость которых составила 13,8% от суммарной стоимости указанных процедур (в 1 полугодии 2024 года – в 16% от общего количества и 4% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур).

В 1 полугодии 2025 года состоялись и привели к заключению контрактов 43% от общего количества и 29,5% от общей стоимости завершённых конкурентных процедур.

По итогам 45,9% завершённых конкурентных процедур, стоимость которых составила 56,9% от суммарной стоимости указанных процедур, контракты (договоры) были заключены с единственными участниками этих процедур на основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (таблица № 24, Рисунки 17, 18).

В 1 полугодии 2025 года отмечен некоторый рост относительно 1 полугодия 2024 года объемов несостоявшихся конкурентных процедур, которые не привели к заключению контрактов (договоров); доля указанных процедур повысилась соответственно с 9,5% до 11,1% в общем количестве и с 6,2% до 13,6% в суммарной стоимости завершённых конкурентных процедур.

Таблица № 24

Итоги конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего завершённых конкурентных процедур, из них:	8 473	40 865,7	8 153	29 693,0
состоялись и привели к заключению контрактов (договоров)	3 761	12 319,6	3 504	8 748,6
признаны несостоявшимися и не привели к заключению контрактов (договоров) (отсутствие заявок, все заявки отклонены, иные причины)	807	2 516,0	903	4 030,7
признаны несостоявшимися и по их итогам контракты (договоры) заключены с единственными участниками процедур на основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	3 905	26 030,1	3 746	16 913,7

Рисунок 17

**Структура завершенных конкурентных процедур
по количеству в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, %**


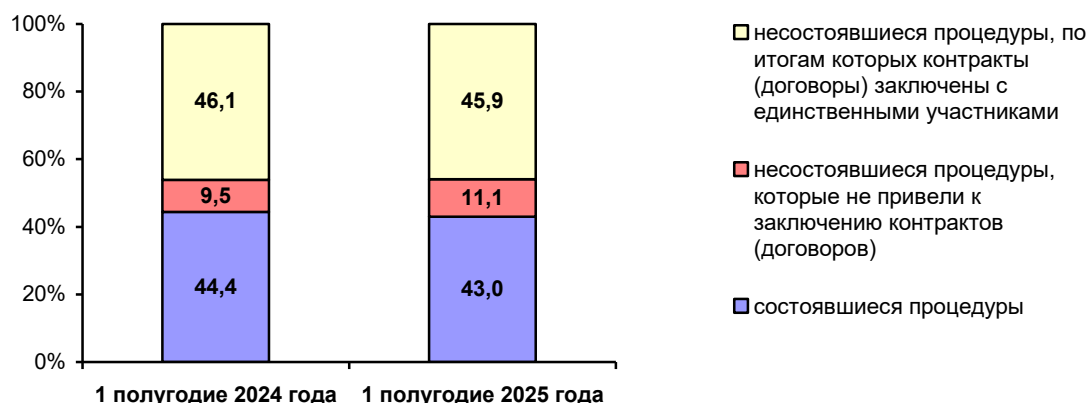


Рисунок 18

**Структура завершенных конкурентных процедур
по суммарной стоимости в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, %**

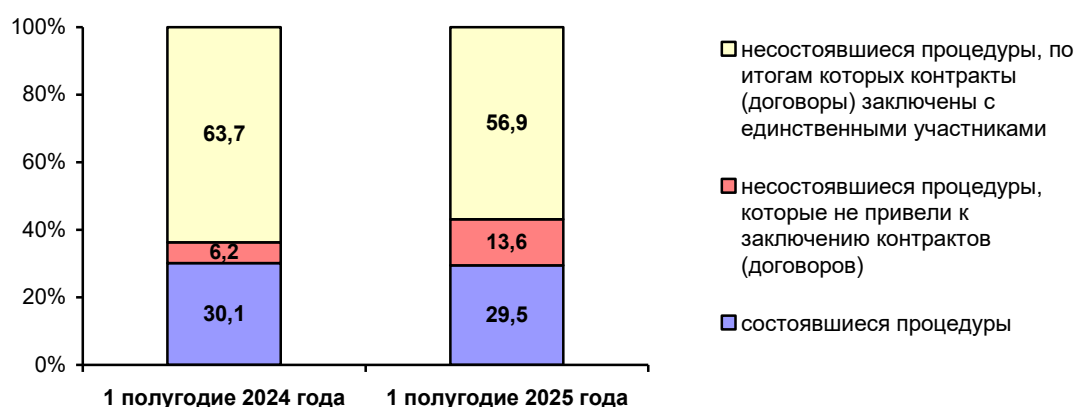

В 1 полугодии 2025 года количество и сумма Н(М)ЦК несостоявшихся процедур увеличились по таким конкурентным способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), как запрос котировок в электронной форме и электронный конкурс (таблица № 25).

Таблица № 25

Количество и суммарная стоимость несостоявшихся конкурентных процедур по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего несостоявшихся конкурентных процедур, в том числе по итогам способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):	4 712	28 546,1	4 649	20 944,4
электронный аукцион	3 813	18 668,7	3 213	10 364,6
конкурс в электронной форме	134	9 233,3	152	9 569,4

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
запрос котировок в электронной форме	765	644,1	1 284	1 010,4

Наибольшая доля несостоявшихся процедур по количеству отмечалась по результатам электронных аукционов (57,7% от общего количества процедур путем проведения электронного аукциона были признаны несостоявшимися по различным основаниям), по стоимости – по результатам электронных конкурсов (стоимость несостоявшихся процедур составила 78,6% от стоимости процедур путем проведения электронного конкурса) (таблица № 26).

Таблица № 26

Доля несостоявшихся конкурентных процедур по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2025 года

Наименование показателя	Завершенные конкурентные процедуры, всего		из них несостоявшиеся процедуры		Доля несостоявшихся процедур, %	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	в общем количестве	в суммарной стоимости
Всего, в том числе по итогам способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя):	8 153	29 693,0	4 649	20 944,4	57,0	70,5
электронный аукцион	5 567	15 809,5	3 213	10 364,6	57,7	65,6
конкурс в электронной форме	277	12 176,2	152	9 569,4	54,9	78,6
запрос котировок в электронной форме	2 309	1 707,3	1 284	1 010,4	55,6	59,2

В 1 полугодии 2025 года заказчиками Ленинградской области заключено 23 668 **контрактов (договоров)** на общую сумму 35 716,5 млн. руб., что по количеству меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, на 4,6%, по суммарной стоимости (цене) больше на 9,7% (таблица № 27).

Таблица № 27

Количество и суммарная стоимость (цена) контрактов (договоров), заключенных заказчиками Ленинградской области в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года	1 полугодие 2025 года	Изменение значения показателя в 1 полугодии 2025 года к 1 полугодию 2024 года
Количество контрактов (договоров), ед.	24 807	23 668	- 4,6 %
Суммарная стоимость (цена), млн. руб.	32 556,3	35 716,5	+ 9,7 %

34,4% от общего количества контрактов (83,6% от их суммарной стоимости (цены) заключено по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (таблица № 28).

Доля контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур, незначительно увеличилась по сравнению с 1 полугодием 2024 года (с 34,1% до 34,4% от общего количества заключенных контрактов (договоров) при некотором снижении указанной доли в суммарной стоимости (цене) заключенных контрактов (договоров) (с 85,2% до 83,6%) (таблица № 28, Рисунки 19, 20).

Таблица № 28

Количество и суммарная стоимость (цена) контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.
Всего заключено контрактов (договоров)	24 807	32 556,3	23 668	35 716,5
из них по результатам:				
конкурентных процедур	8 451	27 749,9	8 149	29 867,7
закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	16 356	4 806,4	15 519	5 848,8

Рисунок 19

Доли контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем количестве контрактов (договоров) в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, %


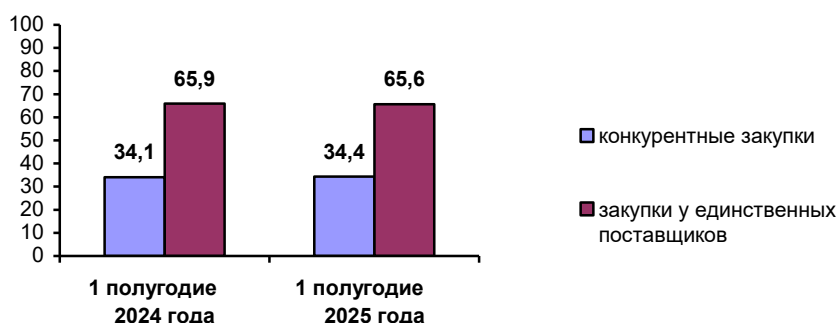


Рисунок 20

Доли контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в суммарной стоимости (цене) контрактов (договоров) в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, %

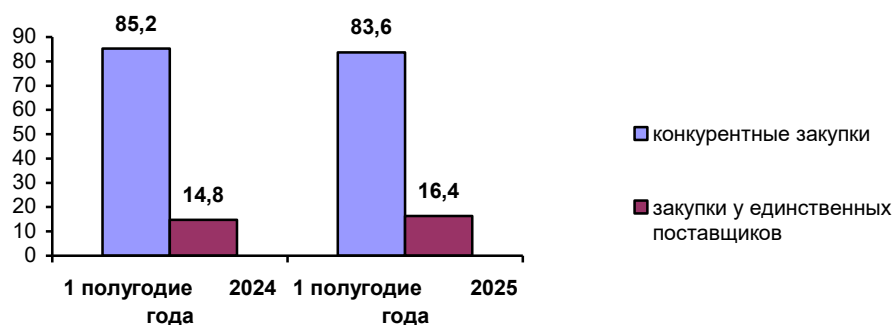

По итогам процедур закупок в 1 полугодии 2025 года 65,6% контрактов заключены по результатам прямых закупок у единственных поставщиков, 18,9% - по итогам несостоявшихся конкурентных процедур с единственными участниками процедур на основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, 15,5% - по результатам состоявшихся конкурентных процедур.

В структуре суммарной стоимости (цены) заключенных контрактов (договоров) 59,7% приходилось на несостоявшиеся конкурентные процедуры, по результатам которых контракты заключены с единственными участниками процедур, 23,9% - на состоявшиеся конкурентные процедуры, 16,4% - прямые закупки у единственных поставщиков.

В 1 полугодии 2025 года по сравнению с 1 полугодием 2024 года отмечено увеличение количества и стоимости контрактов, заключенных с единственными участниками по результатам несостоявшихся конкурентных процедур, а также их доли в общем количестве и суммарной стоимости (цене) заключенных контрактов.

Доля контрактов, заключенных с единственными участниками по результатам несостоявшихся конкурентных процедур, увеличилась в общем количестве заключенных контрактов (договоров) соответственно с 18% до 18,9%, в суммарной стоимости (цене) контрактов (договоров) - с 55,9% до 59,7% (таблица № 29, Рисунки 21, 22).

Учитывая, что при заключении контрактов (договоров) с единственными участниками по результатам несостоявшихся конкурентных процедур экономия бюджетных средств, как правило, минимальна либо отсутствует, вследствие существенной доли контрактов, заключенных с единственными участниками, в стоимостном объеме контрактов возникают риски неэффективного расходования бюджетных средств.

С учетом прямых контрактов (договоров), заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по иным основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, доля контрактов (договоров), заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и единственными участниками, составила в 1 полугодии 2025 года 84,5% от общего количества и 76,1% от суммарной стоимости (цены) всех контрактов (договоров) (в 1 полугодии 2024 года – 83,9% от общего количества и 70,7% от суммарной стоимости (цены) всех контрактов (договоров) (таблица № 29).

Таблица № 29

Количество и суммарная стоимость (цена) контрактов (договоров), заключенных по итогам состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков в 1 полугодии 2024 - 2025 гг.

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость (цена), млн. руб.
Всего заключено контрактов, из них по итогам:	24 807	32 556,3	23 668	35 716,5
состоявшихся конкурентных процедур	3 991	9 536,9	3 667	8 535,2
несостоявшихся конкурентных процедур с единственными участниками	4 460	18 213,0	4 482	21 332,5
закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	16 356	4 806,4	15 519	5 848,8

Рисунок 21

Структура количества контрактов (договоров), заключенных по итогам состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, %


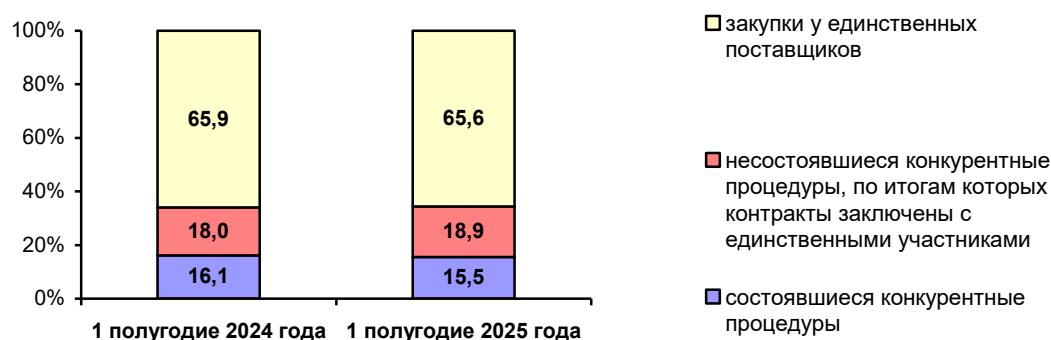


Рисунок 22

Структура суммарной стоимости (цены) контрактов (договоров), заключенных по итогам состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедур и закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2024 - 2025 годов, %

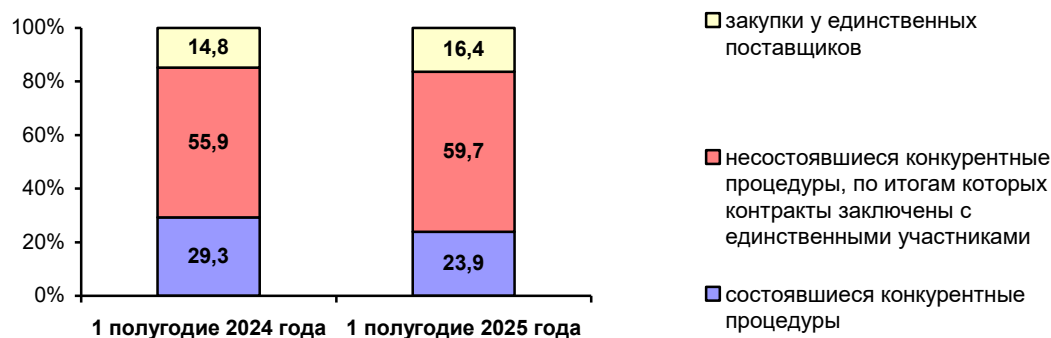

В январе-сентябре 2025 года совокупный объем закупок, осуществленных заказчиками Ленинградской области у СМП в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, включая, в том числе объемы привлечения СМП к исполнению контрактов, составил 21 695,5 млн. руб. или 48,9% от суммарной стоимости контрактов, заключенных заказчиками⁴² (без учета контрактов, указанных в части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ) (в январе-сентябре 2024 года – 18 864,5 млн. руб. или 34,6%).

С учетом стоимости контрактов, заключенных заказчиками с СМП по результатам проведения конкурентных процедур на общих основаниях (без установления преимущества СМП, СОНКО), указанная доля составила в январе-сентябре 2025 года 66,1% (в январе-сентябре 2024 года - 47,9%).

В 1 полугодии 2025 года заказчиками осуществлено меньше закупок у **единственных поставщиков** за счет сокращения количества закупок малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (на 5,3%), при этом стоимость таких закупок увеличилась на 14,7% (таблица № 30).

Таблица № 30

Количество и суммарная стоимость закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года		Изменение значения показателя в 1 полугодии 2025 года к 1 полугодию 2024 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество	Суммарная стоимость
Всего закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), из них	16 356	4 806,4	15 519	5 848,8	- 5,1 %	+ 21,7 %
закупки малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	13 526	1 535,0	12 815	1 761,3	- 5,3 %	+ 14,7 %

По данным Комитета государственного заказа Ленинградской области, в январе-сентябре 2025 года заказчиками Ленинградской области осуществлено в электронном виде с использованием агрегатора торговли Ленинградской области (с учетом повторных закупок) 17 535 ед. закупок в соответствии с

⁴² Информация представлена Комитетом государственного заказа Ленинградской области письмом исх. № 01-26-388/2025-0-1 от 27.11.2025.

пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ суммарной (начальной) стоимостью 2 221,8 млн. руб.

Показатель конкурентности по закупкам, осуществленным в электронном виде с использованием агрегатора торговли Ленинградской области, составил 1,8 предложений (оферт) поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну закупку. Экономия бюджетных средств при заключении контрактов (договоров) по результатам закупок у единственных поставщиков в электронном виде составила в январе-сентябре 2025 года 63,9 млн. руб. или 2,9% от суммарной (начальной) стоимости закупок, осуществленных в электронном виде с использованием агрегатора торговли Ленинградской области (в январе-сентябре 2024 года - 83,5 млн. руб. или 3,9% от суммарной (начальной) стоимости закупок).

Общий **уровень конкурентности закупок** для обеспечения нужд Ленинградской области незначительно снизился по сравнению с 1 полугодием 2024 года: 2,2 заявки, поданных участниками конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 1 закупку (лот) в 1 полугодии 2025 года (2,3 заявки на 1 закупку (лот) в 1 полугодии 2024 года) (таблица № 31).

Таблица № 31

Среднее количество заявок на 1 закупку (лот), поданных участниками конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	Общее количество поданных заявок, ед.		Среднее количество заявок на 1 закупку (лот), ед.*		Общее количество допущенных заявок, ед.		Среднее количество допущенных заявок на 1 закупку (лот), ед.*	
	1 полуг. 2024 года	1 полуг. 2025 года	1 полуг. 2024 года	1 полуг. 2025 года	1 полуг. 2024 года	1 полуг. 2025 года	1 полуг. 2024 года	1 полуг. 2025 года
Всего, в том числе по способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей):	19 096	17 888	2,3	2,19	18 144	16 917	2,1	2,08
конкурсы в электронной форме	576	549	2,2	1,98	546	520	2,0	1,88
электронные аукционы	15 258	11 987	2,3	2,15	14 506	11 338	2,1	2,04
запросы котировок в электронной форме	3 262	5 352	2,3	2,32	3 092	5 059	2,2	2,19

* показатели рассчитаны исходя из количества завершенных конкурентных процедур

Как следует из приведенных в таблице № 32 данных о распределении в 1 полугодии 2024 - 2025 годов конкурентных процедур по количеству поданных заявок, в 1 полугодии 2025 года доля конкурентных процедур, на участие в

которых было подано 2 или более заявок, составила в общем количестве завершенных конкурентных процедур 46,1%, в суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур – 35,1%.

В 43,9% от общего количества завершенных конкурентных процедур (55,2% от суммарной стоимости указанных процедур) была подана 1 заявка.

Таблица № 32

**Распределение конкурентных процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по количеству поданных заявок
в 1 полугодии 2024 - 2025 годов**

Наименование показателя	1 полугодие 2024 года		1 полугодие 2025 года	
	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.	Количество, ед.	Суммарная стоимость, млн. руб.
Всего завершенных конкурентных процедур, из них процедуры, на участие в которых подано:				
2 или более заявок	8 473	40 865,7	8 153	29 693,0
1 заявка	3 944	13 674,4	3 761	10 408,2
0 заявок	3 773	26 034,0	3 582	16 398,0
	755	1 147,3	810	2 886,8

* расчетно на основании данных аналитических отчетов Комитета государственного заказа Ленинградской области о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области за 1 полугодие 2024 - 2025 годов

В 1 полугодии 2025 года расторгнут 131 контракт (договор) на общую сумму 152,9 млн. руб. из числа заключенных по результатам конкурентных процедур, из них заказчиками в одностороннем порядке – 7 контрактов (договоров) на общую сумму 10,2 млн. руб.

Сведения о результатах рассмотрения УФАС по Ленинградской области в январе-сентябре 2024 - 2025 годов обращений заказчиков регионального и муниципального уровня о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в **реестр недобросовестных поставщиков** представлены в таблицах №№ 33, 34.

Всего в январе-сентябре 2025 года в УФАС по Ленинградской области поступило 304 обращения заказчиков регионального и муниципального уровня о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, что на 7,4% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Таблица № 33

**Результаты рассмотрения УФАС по Ленинградской области обращений заказчиков о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков
в январе-сентябре 2024 – 2025 годов***

Наименование показателя	январь-сентябрь 2024 года	январь-сентябрь 2025 года	Изменение значения показателя в январе-сентябре 2025 года к январю-сентябрю 2024 года
Всего рассмотрено обращений заказчиков Ленинградской области о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе:	283	304	+ 7,4%
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов	116	120	+ 3,4%
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов	166	182	+ 9,6%
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов	1	2	рост в 2 раза
Принято решение о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе:	108	102	- 5,6%
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов	10	5	снижение в 2 раза
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов	97	95	- 2,1%
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда	1	2	рост в 2 раза

* сведения приведены в отношении обращений заказчиков регионального и муниципального уровня

По результатам рассмотрения обращений решения о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков были приняты в 33,6% случаев (в аналогичном периоде 2024 года – в 38,2% случаев).

Из общего количества обращений 59,9% (в аналогичном периоде 2024 года – 58,7%) составили обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (182 обращения).

Количество таких обращений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 9,6%. В 52,2% случаев по указанным обращениям были приняты решения о включении информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков.

Из общего количества обращений, по которым в январе-сентябре 2025 года были приняты решения о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, 93,1% составили случаи включения в реестр информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов.

Таблица № 34

Результаты рассмотрения УФАС по Ленинградской области обращений заказчиков регионального уровня о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков в январе-сентябре 2024 - 2025 годов

Наименование показателя	январь-сентябрь 2024 года	январь-сентябрь 2025 года	Изменение значения показателя в январе-сентябре 2025 года к январю-сентябрю 2024 года
Всего рассмотрено обращений заказчиков о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе:	168	175	+ 4,2%
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов	74	65	- 12,2%
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов	94	110	+ 17,0%
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов	0	0	-
Принято решение о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков, в том числе:	64	59	- 7,8%
об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов	9	4	снижение в 2,3 раза
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением	55	55	-

Наименование показателя	январь- сентябрь 2024 года	январь- сентябрь 2025 года	Изменение значения показателя в январе- сентябре 2025 года к январю- сентябрю 2024 года
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов			
о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда	0	0	-

Более половины (57,6%) от общего количества обращений в январе-сентябре 2025 года о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков поступило от заказчиков регионального уровня (175 обращений). По обращениям о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов, доля обращений, поступивших от заказчиков регионального уровня, составила 60,4% (110 обращений).

Следует отметить, что в январе-сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество обращений о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков увеличилось как от заказчиков регионального, так и заказчиков муниципального уровня - на 4,2% и на 12,2% соответственно.

От заказчиков регионального уровня поступило также на 17% больше обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов.

3. Анализ информации о результатах контроля в сфере закупок и аудита в сфере закупок в Ленинградской области за 2024 год

В 2024 году Контрольным комитетом Губернатора Ленинградской области как органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в соответствии с Положением о Комитете⁴³ осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ в отношении:

⁴³ Положение о Контрольном комитете Губернатора Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 08.12.2020 № 810 (далее - Положение о Комитете).

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок;
- определения и обоснования Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок на территории Ленинградской области осуществлялся также УФАС по Ленинградской области как территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок.

Сведения об основных результатах осуществления уполномоченными органами контроля в сфере закупок в Ленинградской области в 2024 году на основании информации, представленной УФАС по Ленинградской области⁴⁴ и Контрольным комитетом Губернатора Ленинградской области⁴⁵, приведены в таблице № 35.

Таблица № 35

Информация об основных результатах осуществления контроля за
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок в
Ленинградской области в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области ¹ 2024 год / 2023 год	Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области (контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ) 2024 год / 2023 год	Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области (контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок) 2024 год / 2023 год
Общее количество проверок (плановых и внеплановых), ед.	- / -	5 / 20	74 / 51
Количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения	-	5 / 20	32 / 31
Объем проверенных бюджетных средств, млн. руб.	н/д ²	281,7 / 4 474,6	н/д
Всего поступило жалоб, ед.	2 019 / 2 290	-	-
Общее количество рассмотренных жалоб, ед.	930 / 2 189	-	-
Количество обоснованных жалоб, ед.	348 / 1 253	-	-

⁴⁴ Представлена письмом исх. № АВ/8801/25 от 16.10.2025.

⁴⁵ Представлена письмом исх. № 01-10-1634/2025 от 17.10.2025.

Наименование показателя	Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области ¹ 2024 год / 2023 год	Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области (контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ) 2024 год / 2023 год	Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области (контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок) 2024 год / 2023 год
Доля обоснованных жалоб, в % от количества рассмотренных жалоб	37,4 / 57,2	-	-
Общее количество выданных предписаний (представлений), ед.	231 / 618	5 / 15	5 / 4
из них исполнено	-	5 / 15	5 / 4
Восстановлено средств в бюджет по предписаниям (представлениям), тыс. руб.	-	- / -	-
Количество и сумма выявленных нарушений, в том числе законодательства о контрактной системе в сфере закупок, ед. / тыс. руб.	2024 г. 264 / - 2023 г. – 960 / -	2024 г. – 37 / 715,2 2023 г. – 97 / 1 371,5	2024 г. – 147 / - 2023 г. – 308 / -
Устранено объектами контроля нарушений в ходе проверок, кол-во, ед. / тыс. руб.	н/д	2024 г. - / - 2023 г. - / -	н/д
Количество возбужденных дел об административных правонарушениях, ед.	727 / 880	158 / 109 ³	
Вынесено постановлений о назначении административного наказания, ед.	-	41 / 21	81 / 64
Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб.	2 195,0 / 955,0	70,0 / 70,4	170,0 / 133,0
Обращения в судебные органы с исками о признании закупок недействительными и о возмещении ущерба, причиненного Ленинградской области; обращения в правоохранительные и иные уполномоченные органы	-	- / 3 ⁴	- / -

¹ значения показателей: всего поступило жалоб, общее количество рассмотренных жалоб, доля обоснованных жалоб, количество выданных предписаний, количество выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок указаны в отношении закупок заказчиков регионального и муниципального уровня;

² здесь и далее - данные отсутствуют;

³ включая дела, возбужденные по результатам проведенных контрольных мероприятий и рассмотрения поступивших в Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области материалов проверок ведомственного и муниципального контроля по фактам выявленных нарушений, содержащим признаки административного правонарушения;

⁴ указано количество направленных материалов

Основные результаты осуществления в Ленинградской области в 2024 году контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок свидетельствуют о следующих тенденциях.

В 2024 году увеличилось общее количество проверок, проведенных **органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление контроля** за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок: в 2024 году – 79 проверок (в том числе 57 проверок правомерности заключения контрактов с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по итогам несостоявшихся конкурентных процедур в связи с поступлением обращений заказчиков о согласовании заключения контрактов с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), в 2023 году – 71 проверка (в том числе 27 проверок правомерности заключения контрактов с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по итогам несостоявшихся конкурентных процедур).

Уменьшилось число проверок, по результатам которых установлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок: в 2024 году – 37 проверок (46,8% от общего числа проверок), в 2023 году – 51 проверка (71,8% от общего числа проверок).

По результатам проверок нарушения установлены у 37 заказчиков регионального уровня (в 2023 году – у 30 заказчиков).

В 2024 году объем проверенных бюджетных средств в рамках контроля, осуществляемого в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, составил 281,7 млн. руб. (в 2023 году - 4 474,6 млн. руб.).

По результатам проверок в 2024 году объектам контроля выдано 5 представлений (в том числе 2 - об устранении выявленных нарушений, 3 - об устранении причин и условий, способствующих их совершению) и 5 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок (в 2023 году – 15 представлений (в том числе 2 – об устранении выявленных нарушений, 13 - об устранении причин и условий, способствующих их совершению) и 4 предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок); все представления и предписания исполнены.

В 2024 году возбуждено 158 дел об административных правонарушениях⁴⁶, из них 96 - в отношении должностных лиц заказчиков регионального уровня и 62 - в отношении должностных лиц муниципальных заказчиков (в 2023 году – 109 дел⁴⁷, из них 62 - в отношении должностных лиц заказчиков регионального уровня и 47 - в отношении должностных лиц муниципальных заказчиков); вынесено 122 постановления о назначении административного наказания (в 2023 году – 85). Сумма наложенных

⁴⁶ По результатам проведенных в 2024 году проверок, а также рассмотрения 53 материалов проверок ведомственного контроля и 56 материалов проверок муниципального контроля в сфере закупок.

⁴⁷ По результатам проведенных в 2023 году проверок, а также рассмотрения 60 материалов проверок ведомственного контроля и 56 материалов проверок муниципального контроля в сфере закупок.

административных штрафов составила 240 тыс. руб. (в 2023 году – 203,4 тыс. руб.).

В консолидированный бюджет Ленинградской области (по постановлениям с наступившим сроком для оплаты) поступило 120 тыс. руб. (в 2023 году – 114,2 тыс. руб.), в том числе в областной бюджет Ленинградской области – 105 тыс. руб., в местные бюджеты – 15 тыс. руб.

Материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы и иные органы контроля не направлялись (в 2023 году – направлено 3 материала).

Обращения в судебные органы с исками о признании закупок недействительными и о возмещении ущерба, причиненного Ленинградской области, в 2024 году, как и в 2023 году, отсутствовали.

По результатам контроля в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ Контрольным комитетом Губернатора Ленинградской области в 2024 году установлены следующие нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок (всего 147 нарушений):

- нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, ЕИС (далее - реестр контрактов ЕИС) (78 нарушений или 53,1% от общего количества выявленных нарушений);

- нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (39 нарушений или 26,5% от общего количества выявленных нарушений);

- непредставление, несвоевременное предоставление информации и документов в контрольный орган в сфере закупок (9 нарушений или 6,1% от общего количества выявленных нарушений);

- нарушение порядка и сроков направления в контрольный орган информации и документов для согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 8 нарушений или 5,4% от общего количества выявленных нарушений);

- принятие решения о выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок (6 нарушений или 4,1% от общего количества выявленных нарушений);

- размещение извещения об осуществлении закупки с нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ (5 нарушений или 3,4% от общего количества выявленных нарушений);

- установление требований к участникам закупки с нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок (2 нарушения или 1,4% от общего количества выявленных нарушений).

По результатам контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ выявлено 37 нарушений на общую сумму 715,2 тыс. руб. (в 2023 году – 97 нарушений на общую сумму 1 371,5 тыс. руб.), в том числе:

- нарушения порядка и срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (27 нарушений или 73% от общего количества выявленных нарушений);

- неприменение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за нарушение условий контрактов, в том числе просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактами (7 нарушений или 18,9% от общего количества выявленных нарушений);

- нарушения порядка приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (2 нарушения на общую сумму 672,7 тыс. руб. или 5,4% от общего количества выявленных нарушений);

- нарушения в части приемки фактически не выполненных работ, а также работ с завышенной стоимостью (1 нарушение на сумму 42,5 тыс. руб. или 2,7% от общего количества выявленных нарушений).

Основные результаты ведомственного контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения нужд Ленинградской области в 2024 году, осуществляемого органами исполнительной власти Ленинградской области в отношении подведомственных заказчиков в соответствии со статьей 100 Федерального закона № 44-ФЗ, представлены в таблице № 36.

Таблица № 36

Основные результаты ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Ленинградской области в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	кол-во, ед.	сумма, тыс. руб.	кол-во, ед.	сумма, тыс. руб.
Проведено проверок	113	-	79	
Проведено внеплановых проверок	4	-	6	
Объем проверенных средств областного бюджета Ленинградской области	-	19 591 292,4		14 198 628,8
Всего выявлено нарушений	833	3 448,8	454	1 540,2
Сведения о результатах реализации проведенных проверок				
Количество планов устранения выявленных нарушений, направленных подведомственным заказчикам	79	-	44	-
Количество выполненных планов устранения выявленных нарушений	79	-	44	-
Количество материалов о выявленных фактах нарушений, содержащих признаки административного правонарушения, направленных в уполномоченные органы	84	-	47	-

В 2024 году 31 орган исполнительной власти Ленинградской области осуществлял ведомственный контроль в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков (в 2023 году - 30 органов исполнительной власти Ленинградской области).

Органами исполнительной власти Ленинградской области в 2024 году проведено 79 проверок ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков, объем проверенных средств областного

бюджета Ленинградской области составил 14 198,6 млн. руб. (в 2023 году – 117 проверок, объем проверенных средств – 19 591,3 млн. руб.).

По результатам проверок выявлено 454 нарушения на общую сумму 1 540,2 тыс. руб. (в 2023 году – 833 нарушения на общую сумму 3 448,8 тыс. руб.).

По сравнению с 2023 годом уменьшилось количество планов устранения выявленных нарушений, направленных органами исполнительной власти Ленинградской области подведомственным заказчикам по результатам ведомственного контроля в сфере закупок: в 2024 году - 44 плана (в 2023 году - 79 планов).

В 2024 году меньшее количество материалов проверок ведомственного контроля, содержащих признаки административного правонарушения, было направлено в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях – 47 (в 2023 году – 84), в том числе в УФАС по Ленинградской области – 5 (в 2023 году - 5), в Контрольный комитет Губернатора Ленинградской области – 42 (в 2023 году – 79).

Основные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявленные в 2024 году по результатам осуществления ведомственного контроля в сфере закупок:

- нарушение установленных требований к исполнению, изменению контракта, нарушение условий контракта;
- нарушения в части определения и обоснования Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
- нарушение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при принятии решения об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- нарушение ограничений и запретов, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
- нарушение правил нормирования в сфере закупок.

УФАС по Ленинградской области контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок осуществлялся в форме рассмотрения жалоб участников закупок на нарушения заказчиками, уполномоченными органами, членами закупочных комиссий, должностными лицами контрактных служб, контрактными управляющими законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Согласно представленной УФАС по Ленинградской области информации⁴⁸, общее количество поступивших в 2024 году жалоб на закупки заказчиков регионального и муниципального уровня по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 11,8% (таблица № 37).

⁴⁸ Представлена письмом исх. № АВ/8801/25 от 16.10.2025.

Сведения об обжаловании закупок заказчиков регионального и муниципального уровня в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области в 2023 - 2024 годах

Наименование показателя	2023 год		2024 год	
	ед.	в % от общего кол-ва	ед.	в % от общего кол-ва
<i>Общее количество жалоб, всего, ед. в том числе в отношении закупок:</i>	2 290	100,0	2 019	100,0
заказчиков регионального уровня	668	29,2	801	39,7
муниципальных заказчиков	1 622	70,8	1 218	60,3
<i>Количество рассмотренных жалоб, всего, ед., в т.ч. в отношении закупок:</i>	2 189	100,0	930	100,0
заказчиков регионального уровня	619	28,3	409	44,0
муниципальных заказчиков	1 570	71,7	521	56,0
<i>Количество обоснованных жалоб, всего, ед., в том числе в отношении закупок:</i>	1 253	100,0	348	100,0
заказчиков регионального уровня	280	22,3	120	34,5
муниципальных заказчиков	973	77,7	228	65,5
<i>Доля обоснованных жалоб в общем количестве рассмотренных жалоб, всего, %, в том числе в отношении закупок:</i>	57,2	-	37,4	-
заказчиков регионального уровня	45,2	-	29,3	-
муниципальных заказчиков	62,0	-	43,8	-
<i>Выявлено нарушений в результате рассмотрения жалоб и проведения внеплановых проверок при рассмотрении жалоб, всего, ед. в том числе в отношении закупок:</i>	960	100,0	264	100,0
заказчиков регионального уровня	230	24,0	113	42,8
муниципальных заказчиков	730	76,0	151	57,2
<i>Количество выданных предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, всего, ед., в том числе:</i>	618	100,0	231	100,0
заказчикам регионального уровня	166	26,9	101	43,7
муниципальным заказчикам	452	73,1	130	56,3
<i>Количество выданных предписаний, в % от общего количества рассмотренных жалоб, всего, в том числе:</i>	28,2	-	24,8	
заказчикам регионального уровня	26,8	-	24,7	
муниципальным заказчикам	28,8	-	25,0	

Количество обоснованных жалоб значительно сократилось (в 3,6 раза) по сравнению с 2023 годом (в 2024 году – 348 ед., в 2023 году – 1 253 ед.).

Доля обоснованных жалоб в общем количестве рассмотренных жалоб составила в 2024 году 37,4%, существенно снизившись относительно 2023 года (в 2023 году – 57,2%). Указанная доля снизилась как в отношении закупок заказчиков регионального уровня, так и закупок муниципальных заказчиков.

В результате значительного уменьшения в 2024 году количества обоснованных жалоб по итогам рассмотрения жалоб и проведения при их рассмотрении внеплановых проверок выявлено нарушений в 3,6 раза меньше, чем в 2023 году (в 2024 году – 264 нарушения, в 2023 году – 960 нарушений).

Количество выданных предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок сократилось в 2,7 раза (в 2024 году – 231 предписание, в 2023 году – 618 предписаний).

В 2024 году предписания выдавались в 24,8% случаев рассмотрения жалоб (в 2023 году – в 28,2% случаев).

Среди поступивших жалоб на закупки заказчиков, как и в 2023 году, преобладали жалобы на закупки муниципальных заказчиков, доля которых составила 60,3% от общего количества поступивших жалоб и 65,5% от количества обоснованных жалоб.

Доля обоснованных жалоб в отношении закупок муниципальных заказчиков выше (43,8%), чем в отношении закупок заказчиков регионального уровня (29,3%).

Среди нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявленных в 2024 году по результатам рассмотрения жалоб, как и в 2023 году, преобладали нарушения в части размещения информации и документов в ЕИС (54,2% от общего количества нарушений), нарушения в части установления требований в документации о закупках, влекущих ограничение количества участников закупок (28% от общего количества нарушений), нарушения порядка отбора участников закупок (14,8% от общего количества нарушений).

Количество возбужденных антимонопольным органом дел об административных правонарушениях по фактам выявленных нарушений сократилось по сравнению с 2023 годом в 1,2 раза: в 2024 году вынесено 727 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 2 195 тыс. руб. (в 2023 году – 880 постановлений на общую сумму 955 тыс. руб.), из них:

обжаловано – 60 постановлений на сумму 765 тыс. руб. (в 2023 году – 12 постановлений на сумму 270 тыс. руб.);

отменено судами – 1 постановление на сумму 7,5 тыс. руб. (в 2023 – 0 постановлений).

Органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, на постоянной основе проводится анализ информации органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинградской области о

количестве жалоб, поступивших в УФАС по Ленинградской области на закупки, осуществленные органами исполнительной власти Ленинградской области, подведомственными им заказчиками, органами местного самоуправления Ленинградской области.

По информации Контрольного комитета Губернатора Ленинградской области⁴⁹, по результатам выданных УФАС по Ленинградской области предписаний в 2024 году отменены 254 закупки, в том числе 2 закупки органов исполнительной власти Ленинградской области, 97 закупок подведомственных учреждений, 155 закупок муниципальных заказчиков (в 2023 году - 563 закупки, в том числе 4 закупки органов исполнительной власти Ленинградской области, 139 закупок подведомственных учреждений, 420 закупок муниципальных заказчиков).

Основными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок, послужившими основанием для признания жалоб обоснованными и выдачи предписаний об устранении нарушений, являлись:

при размещении извещения об осуществлении закупки:

- неправомерное установление либо неустановление дополнительных требований к участникам закупки;

- отсутствие предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ требований о наличии лицензий, членства в саморегулируемой организации, сертификатов;

- установление противоречивых сведений в извещении и проекте контракта;

- установление требований на основании утративших силу норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

при установлении порядка оценки заявок участников закупки:

- установление шкалы оценки заявок, не позволяющей выявить наиболее соответствующего предмету закупки участника;

- установление порядка оценки заявок с нарушением принципов неценовой конкуренции;

- установление порядка оценки заявок для показателя «качественные характеристики объекта закупки» с нарушением положений законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

при описании объекта закупки:

- установление дополнительных характеристик товара, не предусмотренных позицией каталога товаров, работ, услуг, без обоснования необходимости заявленных характеристик товара, используемого при выполнении работ;

- неразмещение обоснования необходимости использования дополнительной характеристики товара;

- неустановление требований к поставляемому товару в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок;

⁴⁹ Представлена письмом исх. № 01-10-1634/2025 от 17.10.2025.

при формировании проекта контракта:

- неприменение типовых условий контракта;
- отсутствие в проекте контракта обязательных условий, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

В 2024 году наибольшее количество обоснованных жалоб приходилось на закупки комитета Ленинградской области по транспорту и комитета по здравоохранению Ленинградской области, а также учреждений, подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области, комитету по строительству Ленинградской области, комитету по социальной защите населения Ленинградской области, комитету цифрового развития Ленинградской области, комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области в 2024 году в рамках реализации полномочия по осуществлению аудита в сфере закупок, предусмотренного статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ, проверялось соблюдение объектами контроля (мероприятий) требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, иных правовых актов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ходе проведения 3 контрольных и 1 экспертно-аналитического мероприятия, в рамках которых проверены закупки товаров, работ, услуг 22 заказчиков Ленинградской области, в том числе 20 заказчиков регионального уровня и 2 муниципальных заказчиков.

Проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, иных правовых актов, регулирующих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Ленинградской области, проведены в 2024 году в отношении 76 закупок (контрактов и договоров) на общую сумму 298,3 млн. руб. (в 2023 году – 245 закупок на общую сумму 3 291,1 млн. руб.).

По результатам проведенных мероприятий выявлено 129 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, из них финансовых нарушений – 23 на общую сумму 28 605,3 тыс. руб. (в 2023 году – 333 нарушения, из них финансовых – 14 на общую сумму 70 258,4 тыс. руб.).

Из общего количества выявленных нарушений 87 нарушений были допущены заказчиками регионального уровня, из них финансовых – 4 нарушения на общую сумму 84,1 тыс. руб., 42 нарушения - муниципальными заказчиками Ленинградской области, из них финансовых – 19 нарушений на общую сумму 28 521,2 тыс. руб.

Наиболее распространенными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок среди проверенных в 2024 году заказчиков Ленинградской области являлись следующие:

- несоблюдение требований к содержанию извещения об осуществлении закупки (29,5% от общего количества выявленных нарушений);
- нарушение условий, запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условий применения национального режима при осуществлении закупок (21,7% от общего количества выявленных нарушений);

- нарушения условий исполнения контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения, включая своевременность расчетов по контракту (договору) (16,3% от общего количества выявленных нарушений);

- приемка и (или) оплата поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг в случае несоответствия этих товаров, работ, услуг либо результатов выполненных работ условиям контрактов (договоров) (14% от общего количества выявленных нарушений).

Выявлены также нарушения в части непредставления (ненаправления), несвоевременного представления (направления) информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов ЕИС (в том числе муниципального контракта, соглашений об изменении контракта, информации и документов об уплате заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) аванса, информации и документов о начислении неустоек (штрафов, пеней), документов, подтверждающих уплату неустоек); неприменения мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям), нарушившим условия исполнения контрактов (договоров), применение таких мер с нарушением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок; отсутствия надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора); включения в извещение об осуществлении закупки не установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок требований к участникам закупки, в том числе влекущих ограничение конкуренции; обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора); отсутствия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором); невключения в контракт (договор) обязательных условий; отсутствия обеспечения заявок на участие в закупке и другие.

Основная сумма выявленных финансовых нарушений (23 нарушения на общую сумму 28 605,3 тыс. руб.) приходилась на нарушения в части приемки и (или) оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг в случае несоответствия этих товаров, работ, услуг либо результатов выполненных работ условиям контрактов (договоров) (9 726,7 тыс. руб.), а также в части обоснования Н(М)ЦК (18 386,6 тыс. руб.).

Нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок выявлены в 2024 году в 37 закупках (контрактах и договорах) на общую сумму 184,5 млн. руб., осуществленных 22-мя проверенными заказчиками Ленинградской области.

По результатам контрольного мероприятия⁵⁰ выявлены допущенные государственным заказчиком Ленинградской области нарушения в части установления при проведении электронных аукционов на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) требований к участникам закупок о наличии

⁵⁰ Контрольное мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета Ленинградской области, предоставленных в 2022 и 2023 годах Ленинградскому областному государственному казенному учреждению «Управление лесами Ленинградской области» (ЛОГКУ «Леноблес») (на выборочной основе)».

определенного количества АЗС в районах Ленинградской области, отличных от районов местонахождения лесничеств, для нужд которых осуществлялась закупка ГСМ, которые могут рассматриваться в качестве избыточных и свидетельствовать об ограничении конкуренции, что не в полной мере отвечает положениям, предусмотренным частью 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам проведенного анализа локальных сметных расчетов (смет), представленных муниципальным заказчиком в составе обоснования Н(М)ЦК⁵¹, установлены факты, указывающие на завышение Н(М)ЦК на общую сумму 18 386,6 тыс. руб. (19,3% от сметной стоимости работ) в результате завышения объемов материалов, применяемых при выполнении отдельных видов работ.

В результате выборочного контрольного осмотра выполненных в рамках муниципального контракта работ установлено завышение итоговых сумм по актам КС-2, предъявленных к оплате и оплаченных муниципальным заказчиком, на общую сумму 9 645,9 тыс. руб., в том числе за счет: необоснованного включения в акты КС-2 фактически не выполненных работ, не используемых материалов; двойного учета материалов, учтенных расценками, завышения объема материальных ресурсов; применения индексов пересчета сметной стоимости работ от базисного в текущий уровень цен, не предусмотренных контрактом, а также в связи с нарушением методики определения сметной стоимости строительства (неправильное применение сметно-нормативной базы, нормативов накладных расходов и сметной прибыли, неправомерное начисление дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время), необоснованным включением в акты пусконаладочных работ, не предусмотренных сметой, и неправомерным отнесением пусконаладочных работ к строительно-монтажным работам.

По результатам контрольного мероприятия⁵² установлены факты заключения муниципального контракта в отсутствие обеспечения исполнения контракта; неустановления в муниципальном контракте обязательного условия об ответственности подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных контрактом обязательств, которые не имеют стоимостного выражения; приемки и оплаты муниципальным заказчиком фактически невыполненных работ, работ, не соответствующих условиям муниципального контракта, договора; неоформления окончательной приемки работ актом приемки законченного строительством объекта; непроведения экспертизы выполненных работ в рамках муниципального контракта; неприменения мер

⁵¹ Контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета Ленинградской области, предоставленных в виде субсидий на иные цели муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в 2023 году».

⁵² Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета Ленинградской области, предоставленных бюджету муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в 2023 году (на выборочной основе)».

ответственности к подрядчику при наличии фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных контрактом; несоблюдения порядка оплаты выполненных работ (оплата работ без уменьшения суммы оплаты на размер неустойки) и другие нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Контрольно-счетной палатой Ленинградской области по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитического мероприятий в проверяемые органы (организации) внесено 3 представления, направлены информационные письма в адрес соответствующих заказчиков с целью принятия ими мер по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В соответствии с представлениями, внесенными КСП ЛО по результатам проведения контрольных мероприятий, объектами контроля приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе разработаны и представлены в КСП ЛО планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе соответствующих контрольных мероприятий, подрядчиком обеспечен возврат средств за фактически не выполненные по муниципальному контракту работы в сумме 9 645,9 тыс. руб., из которых перечислено в областной бюджет Ленинградской области 8 681,3 тыс. руб.

В рамках реализации мер по устранению нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявленных по результатам проведения в 2024 году экспертно-аналитического мероприятия «Обобщение результатов анализа и оценки информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам», соответствующими заказчиками в соответствии с информационными письмами КСП ЛО направлены в адрес поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (в том числе в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия) требования об уплате неустоек (пеней) в связи с просрочкой исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств, предусмотренных контрактами, а также проводилась работа по списанию задолженности в соответствии с действующим законодательством. По выявленным фактам нарушений 4 должностных лица заказчиков привлечены к дисциплинарной ответственности.

Органами исполнительной власти Ленинградской области представлена в КСП ЛО информация о принимаемых мерах с целью недопущения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в том числе подведомственными заказчиками.

Комитетом государственного заказа Ленинградской области (далее также – Комитет) во исполнение пункта 1 рекомендаций и предложений КСП ЛО, изложенных в заключении о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Обобщение результатов анализа и оценки информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам» (от 23.12.2024 № 01-23-17/2024-1) письмом

исх. № 01-17-228/2025-0-1 от 29.07.2025 представлена информация о проводимой работе в целях оказания методического содействия заказчикам Ленинградской области по вопросам применения национального режима при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

- на официальном сайте Комитета размещены разъяснения регулятора контрактной системы в сфере закупок и иных федеральных органов исполнительной власти по вопросам применения национального режима, а также ссылки на записи вебинаров по вопросам применения национального режима, организованных подведомственным Комитету Государственным бюджетным учреждением Ленинградской области «Фонд имущества Ленинградской области» (далее – ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области»);

- государственным и муниципальным заказчикам Ленинградской области направлены письма о дополнительных мерах в связи с вступившими в силу с 19.06.2025 изменениями, внесенными в постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 (исх. №№ 01-16-329/2025, 01-17-62/2025 от 02.07.2025); письма направлены посредством системы электронного документооборота Ленинградской области и автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО) с целью максимального охвата пользователей системы;

- совместно с ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» регулярно проводятся семинары, вебинары по разъяснению сложных вопросов применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, реализации мер по предоставлению национального режима.

В 1 полугодии 2025 года Комитетом организованы и проведены семинары на темы:

- «Обзор основных изменений законодательства в части применения национального режима при осуществлении государственных и муниципальных закупок в 2025 году. Внедрение обновленного агрегатора торговли «Электронный магазин Ленинградской области» (20.02.2025);

- «Контрактная система в 2025 году. Обзор ключевых изменений законодательства о закупках» (13.03.2025);

- «Актуальные вопросы проведения закупок в рамках контрактной системы в 2025 году» (17.04.2025);

- «Практика и проблематика применения национального режима. Рассматриваем позицию контрольного органа по спорным вопросам» (28.05.2025).

ГБУ ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» организованы и проведены семинары на темы «Новаации в контрактной системе с 2025 года», «Национальный режим при осуществлении закупок в соответствии с законом № 223-ФЗ».

В целях минимизации нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комитетом посредством АИСГЗ ЛО доведена до сведения заказчиков информация о необходимости указания при формировании

извещения об осуществлении закупки характеристик товаров в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ в «структурированном» виде с использованием ЕИС, а также соответствия описания объекта закупки в части требований к характеристикам закупаемых товаров в структурированной форме извещения и в описании объекта закупки, прилагаемом к извещению.

На постоянной основе осуществляется информирование заказчиков Ленинградской области о необходимости применения типовых контрактов и типовых условий контрактов до утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ типовых условий контрактов в соответствующей сфере. В этой связи применение типовых контрактов и типовых условий контрактов реализовано в модуле АИСГЗ ЛО «Конструктор контрактов».

В рамках реализации функции органа по регулированию контрактной системы Ленинградской области Комитетом направлены государственным и муниципальным заказчикам Ленинградской области письма о необходимости при описании отдельных видов товаров, при закупках которых предъявляются экологические требования, руководствоваться особенностями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224⁵³ (исх. №№ 01-16-94/2025, 01-17-23/2025 от 21.02.2025).

Муниципальными контрольно-счетными органами Ленинградской области в 2024 году в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 420 нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на общую сумму 167,2 млн. руб. (в 2023 году - 737 нарушений на общую сумму 315,7 млн. руб.).

4. Анализ и оценка отдельных актуальных вопросов закупочной деятельности заказчиков Ленинградской области за 2024 год и истекший период 2025 года (на выборочной основе)

В ходе ЭАМ с учетом данных, полученных с использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС, проведены проверка, анализ и оценка соблюдения заказчиками Ленинградской области (на выборочной основе) требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части установления требования обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обязательств в извещениях об осуществлении закупок, проектах контрактов и в заключенных контрактах, а также предоставления обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обязательств соответственно при заключении и (или) в ходе исполнения контрактов (на выборочной основе).

⁵³ Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.2022 № 1224).

В закупках, являвшихся предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ, проведена проверка соблюдения также иных требований законодательства о контрактной системе (на выборочной основе).

4.1. Обязанность заказчика установить в извещении об осуществлении закупки (документации о закупке, приглашении), проекте контракта требование обеспечения исполнения контракта предусмотрена частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчиком должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ установление требования обеспечения исполнения контракта является *правом* заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме⁵⁴, а также закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в определенных частью 2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ случаях закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в извещении об осуществлении закупки (документации о закупке, приглашении), проекте контракта, по общему правилу, от 0,5% до 30% Н(М)ЦК (или цены контракта при заключении контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)⁵⁵ (далее – Н(М)ЦК (цены контракта) в соответствии с положениями частей 6 - 6.2-1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик в соответствии с частью 6.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта; в случае установления такого требования обеспечение устанавливается в размере до 10% от Н(М)ЦК (цены контракта).

В 2022-2024 годах⁵⁶ в рамках действия антикризисных мер в сфере закупок заказчики в силу части 64.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ были вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки (документации о закупке, приглашении), проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.

⁵⁴ За исключением проведения запроса котировок в электронной форме в случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 2 части 10 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ (закупка товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторгнутого по причине одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта).

⁵⁵ Проведение открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только СМП, СОНКО.

⁵⁶ С даты вступления в силу Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ.

Согласно информации, полученной с использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС, требование обеспечения исполнения контракта установлено заказчиками в 88,7% от общего количества извещений об осуществлении закупок, размещенных в ЕИС в 2024 году (96,9% от суммарной Н(М)ЦК извещений) (таблица № 38).

Таблица № 38

Информация об установлении требования обеспечения исполнения контракта в извещениях об осуществлении закупок, размещенных в 2024 году*

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Установлено ОИК*		Не установлено ОИК		Установлено ОИК, в %	
	Кол-во извещений, ед.	Н(М)ЦК, млн. руб.	Кол-во извещений, ед.	Н(М)ЦК, млн. руб.	от кол-ва извещений	от суммарной Н(М)ЦК
Электронный аукцион	13 083	54 032,3	461	440,2	96,6	99,2
Открытый конкурс в электронной форме	545	27 142,7	4	1 655,1	99,3	94,3
Запрос котировок в электронной форме	2 715	2 518,2	1 195	396,7	69,4	86,4
Закупка, осуществляемая в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	339	199,1	473	157,4	41,7	55,8
Всего	16 682	83 892,3	2 133	2 649,4	88,7	96,9


* по данным подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС;

** здесь и далее в таблицах – обеспечение исполнения контракта

При проведении конкурсов и электронных аукционов обеспечительные меры преимущественно предусматривались заказчиками: требование обеспечения исполнения контракта установлено в 99,3% и 96,6% от общего количества извещений об осуществлении закупок путем проведения соответственно конкурса и электронного аукциона (Рисунки 23, 24).

При проведении запросов котировок в электронной форме такое требование установлено в 69,4% извещений.

В основном обеспечение исполнения контракта предусматривалось в размере от 6 до 10% Н(М)ЦК (цены контракта).

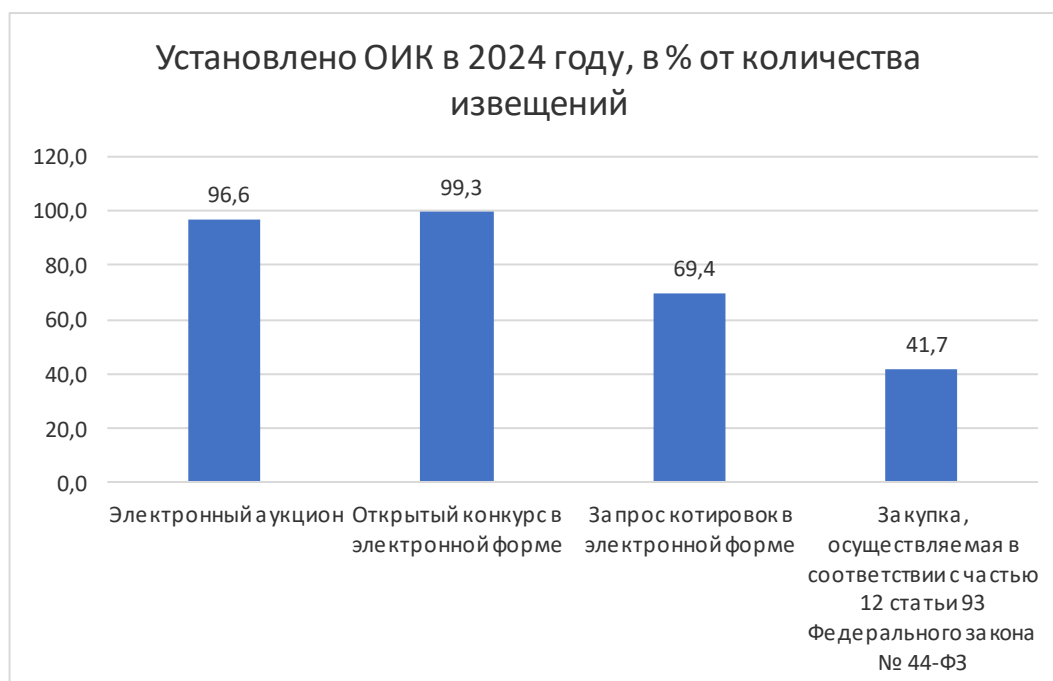

Распределение контрактов, заключенных в 2024 году, по способам обеспечения исполнения контракта приведено в таблице № 39, Рисунках 25, 26.

Таблица № 39

**Распределение контрактов, заключенных в 2024 году, по способам
обеспечения исполнения контракта**

Способ обеспечения исполнения контракта	Заключено контрактов		В %	
	Количество контрактов, ед.*	Суммарная цена контрактов, млн. руб.*	от общего количества контрактов	от суммарной цены контрактов
Независимая гарантия	3 967	53 148,9	18,5	65,1
Внесение денежных средств	7 630	11 083,7	35,6	13,6
На статусе «не определен»	9 811	17 442,6	45,9	21,3
Всего	21 408	81 675,2	100,0	100,0

* по данным подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС

В 18,5% от общего количества заключенных контрактов обеспечение при заключении контракта предоставлено в виде независимой гарантии, при этом независимой гарантией было обеспечено 65,1% от суммарной стоимости заключенных контрактов.

В 35,6% от общего количества контрактов (13,6% от суммарной стоимости контрактов) исполнение контрактов обеспечивалось внесением денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (далее также – внесение денежных средств).

Как следует из приведенных данных, способ обеспечения исполнения контракта «внесение денежных средств» применялся в основном в контрактах со сравнительно невысокой общей стоимостью обязательств (ценой), «независимая гарантия» - в контрактах с более высокой стоимостью.

45,9% от общего количества заключенных контрактов (21,3% от суммарной стоимости контрактов) находились на статусе «обеспечение не определено» (требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта и, соответственно, заключенном контракте не установлено либо участником закупки по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимого исключительно для СМП и СОНКО, в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ представлена информация, подтверждающая исполнение контрактов таким участником закупки).

Рисунок 25



Рисунок 26



Анализ данных о распределении контрактов, заключенных в 2024 году, по способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и способам обеспечения исполнения контракта показал, что исполнение 45,7% контрактов, заключенных по результатам проведения электронных аукционов (преимущественно), обеспечивалось путем внесения денежных средств, при этом 76,2% от суммарной стоимости контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, было обеспечено независимой гарантией (Рисунки 27, 28).

При заключении контрактов по результатам конкурсов применялся преимущественно способ обеспечения «независимая гарантия» (обеспечено

47,5% от общего количества и 78,7% от общей стоимости контрактов, заключенных по результатам конкурсов).

Рисунок 27



Рисунок 28



4.2. По результатам анализа полученной с использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, размещённых заказчиками в ЕИС в 2024 году и истекшем периоде 2025 года, установлено, что в целом заказчиками при проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях авансирования в основном предусматривалось обеспечение исполнения контрактов, в том числе в запросах котировок в электронной форме, при проведении которых установление обеспечения является правом, а не обязанностью заказчика.

В 12 закупках на общую сумму Н(М)ЦК 24 440,7 тыс. руб. выявлены нарушения в части установления в извещениях об осуществлении закупок, проектах контрактов обеспечения исполнения контракта в размере, не соответствующем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ:

извещения №№ 0345200006024000007, 0345200006025000003, 0345200006025000004, 0345200006025000005, 0345200006025000007, 0345200006025000008, 0345200006025000009, 0345200006025000010, 0345200006025000011, 0345200006025000012, 0345200006025000013 (заказчик - государственное бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Ивангородский центр по содействию семейному воспитанию для детей с ограниченными возможностями здоровья» (далее - ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ»);

извещение № 0345200015725000015 (заказчик - государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный центр «Молодежный» (далее - ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»)).

Закупки осуществлены путем проведения соответственно электронных аукционов и запросов котировок в электронной форме.

Согласно извещениям источником финансового обеспечения закупок являются субсидии из областного бюджета Ленинградской области (полностью либо частично), в том числе по 1 закупке (согласно извещению № 0345200015725000015, заказчик – ГБУ ЛО «Центр «Молодежный») средства субсидии на иные цели, предоставленные в рамках реализации национального проекта.

Извещениями об осуществлении закупок, проектами контрактов, прилагаемыми к извещениям в виде электронного документа, предусмотрен аванс в размере 30%.

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ в извещениях установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только СМП, СОНКО.

Согласно извещениям казначейское сопровождение расчетов по контрактам, том числе в части выплаты аванса, не требуется.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в извещении об

осуществлении закупки (документации о закупке, приглашении), проекте контракта от 0,5% до 30% Н(М)ЦК (цены контракта). При этом, если контрактом предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере не менее чем размер аванса⁵⁷ (пункт 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

В нарушение пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в извещениях об осуществлении закупок №№ 0345200006024000007, 0345200006025000003, 0345200006025000004, 0345200006025000005, 0345200006025000007, 0345200006025000008, 0345200006025000009, 0345200006025000010, 0345200006025000011, 0345200006025000012, 0345200006025000013, 0345200015725000015), проектах контрактов обеспечение исполнения контракта установлено в размере менее аванса (размер обеспечения варьировал от 5% до 10% от цены контракта).

Соответственно, контрактами, заключенными по результатам проведения вышеуказанных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспечение исполнения контракта предусмотрено в меньшей сумме, чем надлежит установить в соответствии с требованиями пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, т.е. менее суммы аванса.

Таким образом, в извещениях об осуществлении закупок, проектах контрактов, а также в заключенных контрактах обеспечение исполнения контракта установлено в размере, не соответствующем требованиям пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Информация о размере (сумме) обеспечения исполнения контракта в извещениях об осуществлении закупок и заключенных контрактах приведена в таблице № 40.

Таблица № 40

Информация о размере (сумме) обеспечения исполнения контракта, установленном в извещениях об осуществлении закупок, заключенных контрактах

Дата и № извещения / способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Аванс в извещении, %	ОИК в извещении, % от цены контракта	Реестровый номер контракта	Цена контракта, тыс. руб.	Сумма аванса в контракте, тыс. руб. (%)	Сумма ОИК в контракте, тыс. руб.
ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»							
20.05.2025 № 0345200015725000015 / электронный аукцион	2 500,0	30,00	10,00	24703066820 25 000028	1 624,0	487,2	162,4
ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ»							
31.10.2024 №	1 032,2	30,00	5,00	не	-	-	-

⁵⁷ За исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

Дата и № извещения / способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Аванс в извещении, %	ОИК в извещении, % от цены контракта	Реестровый номер контракта	Цена контракта, тыс. руб.	Сумма аванса в контракте, тыс. руб. (%)	Сумма ОИК в контракте, тыс. руб.
0345200006024000007 / запрос котировок				заклучен*			
11.02.2025 № 0345200006025000003 / электронный аукцион	2 901,3	30,00	10,00	2472100336525000007	2 088,9	30% (626,7 расчетно)**	313,3
12.02.2025 № 0345200006025000004 / электронный аукцион	1 818,3	30,00	5,00	2472100336525000006	580,0	30% (174,0 расчетно)**	43,5
17.02.2025 № 0345200006025000005 / запрос котировок	2 660,7	30,00	10,00	2472100336525000004	1 990,0	597,0	298,5
24.04.2025 № 0345200006025000007 / электронный аукцион	1 536,1	30,00	10,00	2472100336525000012	1 152,0	30% (345,6 расчетно)**	172,8
24.04.2025 № 0345200006025000008 / электронный аукцион	1 709,5	30,00	10,00	2472100336525000013	1 700,9	510,3	170,1
24.04.2025 № 0345200006025000009 / электронный аукцион	2 996,6	30,00	10,00	2472100336525000014	2 981,6	894,5	298,1
24.04.2025 № 0345200006025000010 / электронный аукцион	2 012,6	30,00	10,00	не заключен***	-	-	-
25.04.2025 № 0345200006025000011 / запрос котировок	1 778,2	30,00	10,00	2472100336525000011	1 442,0	432,6	144,2
28.04.2025 №	1 482,5	30,00	10,00	24721003365	938,0	281,4	140,7

Дата и № извещения / способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Аванс в извещении, %	ОИК в извещении, % от цены контракта	Реестровый номер контракта	Цена контракта, тыс. руб.	Сумма аванса в контракте, тыс. руб. (%)	Сумма ОИК в контракте, тыс. руб.
0345200006025000012 / запрос котировок				25000010			
21.05.2025 № 0345200006025000013 / электронный аукцион	2 012,6	30,00	10,00	2472100336525000015	1 517,0	455,1	151,7

* по причине отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по решению контрольного органа в сфере закупок (по иному основанию);

** согласно электронному контракту, сформированному с использованием ЕИС (далее – электронный контракт), выплата аванса не предусмотрена; в прилагаемом к нему контракте, сформированном без использования ЕИС (далее также - контракт), аванс указан в соответствии с извещением в % от цены контракта;

*** по причине признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

При исполнении контрактов с реестровыми номерами №№ 2472100336525000011, 2472100336525000015 (заказчик - ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ») подрядчикам выплачен аванс. Таким образом, сумма выплаченного аванса превышает сумму обеспечения исполнения контракта, предусмотренную контрактами и предоставленную участниками закупок в виде независимых гарантий (независимые гарантии № 1710409-ЛК от 13.05.2025 и № 2094022-ВБЦ от 18.06.2025).

При этом на дату проверки реализовались риски, связанные с ненадлежащим обеспечением исполнения контрактов (риск невозврата аванса в случае неисполнения контракта): согласно данным ЕИС, контракты в установленный срок (не позднее 31.08.2025) не исполнены в полном объеме, заказчиком 06.10.2025 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 2472100336525000011.

Следует отметить, что решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 2472100336525000011 принято 06.10.2025 при том, что срок выполнения работ истек 31.08.2025, согласно уведомлению о расторжении контракта в одностороннем порядке от 06.10.2025 подрядчик к выполнению работ не приступал. На дату направления заказчиком уведомления о расторжении контракта в одностороннем порядке срок действия независимой гарантии № 1710409-ЛК, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, уже истек (по 01.10.2025).

Следует отметить, что в случае осуществления закупки (извещение) № 0345200006025000004 (заказчик – ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ») обеспечение исполнения контракта в меньшем размере, чем надлежало установить в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, установлено контрактом и, соответственно, предоставлено участником закупки (платежное поручение № 10 от 07.03.2025 на сумму 43,5 тыс. руб.) в условиях демпинга цен, т.е. снижения Н(М)ЦК по результатам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на 25% и более, при котором в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрены повышенные обеспечительные меры: предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее чем 10% от Н(М)ЦК (цены контракта) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или предоставление дополнительно к обеспечению, установленному в извещении, информации, подтверждающей добросовестность участника закупки).

При проведении запросов котировок в электронной форме (извещения) №№ 0345200006025000005, 0345200006025000012 (заказчик – ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ») установлены нарушения в части применения заказчиком антидемпинговых мер, предусмотренных статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

В контрактах с реестровыми номерами №№ 2472100336525000004, 2472100336525000010, заключенных по результатам проведения указанных запросов котировок в электронной форме, обеспечение исполнения контракта установлено в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещениях об осуществлении закупок, т.е. с учетом применения антидемпинговых мер в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Снижение Н(М)ЦК по результатам процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) составило 25,2% и 36,7% соответственно.

Так, в контракте № 2472100336525000004 обеспечение установлено в сумме 298,5 тыс. руб. (в соответствии с извещением – 199 тыс. руб. или 10% от цены контракта), в контракте № 2472100336525000010 – 140,7 тыс. руб. (в соответствии с извещением – 93,8 тыс. руб. или 10% от цены контракта).

Следует отметить, что антидемпинговые меры, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, применяются исключительно при осуществлении закупок, проводимых в форме конкурса или электронного аукциона.

Соответственно, заказчиком выплаты аванса поставщику (подрядчику) в условиях демпинга цен не производились.

Вместе с тем, предусмотренная частью 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ антидемпинговая мера, устанавливающая запрет на выплату аванса участнику закупки в условиях демпинга цен, применяется также исключительно при проведении конкурсов и электронных аукционов.

Таким образом, при проведении запросов котировок в электронной форме (извещения) №№ 0345200006025000005, 0345200006025000012 ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ» антидемпинговые меры применены **в нарушение** частей 2, 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контрактов № 2472100336525000004 (пункта 5.2 электронного контракта, пункта 2.7 контракта, сформированного без использования ЕИС), № 2472100336525000010 (пункта 5.3 электронного контракта, пункта 2.5 контракта, сформированного без использования ЕИС) обязательства по авансированию заказчиком не исполнены.

Следует отметить, обеспечение исполнения контракта № 2472100336525000010 установлено в контракте и предоставлено участником закупки при заключении контракта (независимая гарантия № 346055/ЭГ-2025 от 14.05.2025 на сумму 140,7 тыс. руб.) в размере меньшем, чем надлежало установить в соответствии с требованиями пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (менее суммы аванса).

Предусмотренным в контрактах с реестровыми номерами №№ 2472100336525000004, 2472100336525000010 порядком оплаты поставленных товаров, выполненных работ (соответственно пункты 2.7, 2.5 контрактов, сформированных без использования ЕИС) **в нарушение** пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не установлены сроки осуществления авансовых платежей по контрактам.

В 3 контрактах, заключенных по результатам проведения электронных аукционов (извещения) № 0345200015725000015 (заказчик – ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»), №№ 0345200006025000003, 0345200006025000004 (заказчик – ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ»), отсутствовало обязательное условие о порядке оплаты товаров, работ, услуг с учетом положений части 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, которое подлежит включению в контракт в соответствии с требованиями **пункта 1 части 13 статьи 34** Федерального закона № 44-ФЗ.

Положениями части 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, предложившим при проведении конкурса или электронного аукциона цену контракта, которая ниже Н(М)ЦК на 25% и более, не допускается.

В контракте № 2470306682025000028 (заказчик – ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»), заключенном по цене, которая более чем на 25% ниже Н(М)ЦК, отсутствовало также предусмотренное **частью 6.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ** условие о предоставлении участником закупки обеспечения исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, т.е. применения антидемпинговых мер.

При заключении контракта № 2470306682025000028 в качестве обеспечения исполнения контракта исполнителем предоставлена независимая гарантия № 3429184 от 09.06.2025 на сумму 162,4 тыс. руб., в которую внесено

11.06.2025 (дата заключения контракта) изменение в части увеличения суммы независимой гарантии до 730,8 тыс. руб. (сумма аванса, увеличенная в 1,5 раза, с учетом применения антидемпинговых мер).

4.3. В 2024 году в силу части 64.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики были вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки (документации о закупке, приглашении), проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса и при этом расчеты в части аванса не подлежат казначейскому сопровождению.

В связи с тем, что действие данной антикризисной меры не продлено на 2025 год, в 2025 году заказчики в случаях проведения конкурсов и электронных аукционов обязаны устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки (документации о закупке, приглашении), проекте контракта.

В соответствии с частью 6.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ исключением являются случаи, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению, в которых заказчики вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта.

В нарушение части 1 статьи 96, части 64.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ некоторыми заказчиками при осуществлении в 2025 году закупок путем проведения конкурса или электронного аукциона, в случаях, когда расчеты по контрактам не подлежали казначейскому сопровождению, в извещениях об осуществлении закупок, проектах контрактов требование обеспечения исполнения контракта не установлено:

извещения о проведении электронных аукционов от 25.04.2025 № 0845500000825000008, от 26.05.2025 № 0845500000825000010, от 02.06.2025 № 0845500000825000012, от 16.06.2025 № 0845500000825000013, от 27.08.2025 № 0845500000825000016, от 27.08.2025 № 0845500000825000017, от 27.08.2025 № 0845500000825000018 (заказчик - государственное казенное учреждение «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» (далее – ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области»);

извещения о проведении электронных аукционов от 07.03.2025 № 0845200001425000016, от 05.05.2025 № 0845200001425000043, от 29.05.2025 № 0845200001425000047, от 08.08.2025 № 0845200001425000058, от 11.08.2025 № 0845200001425000059, от 12.08.2025 № 0845200001425000060, от 14.08.2025 № 0845200001425000063 (заказчик - Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения» (далее - ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»);

извещения о проведении электронных аукционов от 28.03.2025 № 0345200003625000014, от 28.03.2025 № 0345200003625000015, от 03.06.2025 № 0345200003625000026, от 16.06.2025 № 0345200003625000028 (заказчик - Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района» (далее - ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района»).

Согласно контрактам, заключенным по результатам проведения электронных аукционов (за исключением извещения № 0845200001425000043⁵⁸), обеспечение исполнения контракта не установлено.

Таким образом, исполнение вышеуказанных контрактов осуществлялось в отсутствие соответствующего предоставленного поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обеспечения исполнения контрактов.

Согласно информации, представленной ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области»⁵⁹, по выявленным фактам нарушений к контрактному управляющему ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» применено дисциплинарное взыскание в виде **замечания**.

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов извещение об осуществлении закупки должно содержать в том числе информацию о размере обеспечения исполнения контракта, порядке предоставления такого обеспечения, требованиях к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению регламентированы статьями 45, 96 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливающими в том числе требования к способу обеспечения исполнения контракта, порядку его предоставления, условиям и сроку действия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта.

В отдельных случаях в извещениях об осуществлении закупок порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению устанавливались заказчиком **ненадлежащим образом**.

Так, ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в извещениях о проведении электронных аукционов от 12.08.2025 № 0845200001425000061, от 22.08.2025 № 0845200001425000064 порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению фактически не установлены; соответствующие положения извещений лишь отражают предусмотренное частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ условие об освобождении участника закупки от предоставления обеспечения исполнения контракта.

В ходе ЭАМ проведена проверка **обеспечения исполнения контрактов**, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контрактов, заключенных государственным казенным учреждением Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» (далее также - ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», заказчик),

⁵⁸ Контракт не заключен по причине признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁵⁹ Письмо ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» исх. № 01-07-2419/2025 от 09.09.2025.

государственным казенным учреждением Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства» (далее также - ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», заказчик), государственным казенным учреждением Ленинградской области «Оператор «электронного правительства» (далее также - ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства», заказчик), а также **обеспечения гарантийных обязательств**, предоставленного в ходе исполнения контрактов (на выборочной основе).

С применением подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС получены сведения о контрактах (на выборочной основе), в ходе исполнения которых в 2024 году, истекшем периоде 2025 года предусматривалось изменение одного или нескольких условий контракта: увеличение цены контракта, установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса, изменение срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

По запросам КСП ЛО (исх. №№ 01-21-53/2025, 01-21-52/2025, 01-21-54/2025 от 20.08.2025) ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» (письмо исх. № 676 от 27.08.2025), ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» (письмо исх. № 1495-14/2025 от 01.09.2025), ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» (письмо исх. № 01-03/1621-2025 от 01.09.2025) представлены информация и копии документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контрактов при заключении контрактов и в ходе их исполнения, обеспечения гарантийных обязательств: копии независимых гарантий и вносимых в них изменений (в случае внесения изменений в условия ранее выданной поставщику (подрядчику, исполнителю) независимой гарантии), выписки из реестра независимых гарантий ЕИС, скриншоты страниц «личного кабинета» заказчиков в ЕИС, содержащих сведения о предоставлении обеспечения при заключении контрактов, копии платежных поручений о внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения контрактов.

По результатам проверки, анализа и оценки установлено следующее.

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия».

Предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ являлись 7 контрактов на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия суммарной стоимостью 667,8 млн. руб., заключенных ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» в 2024 году.

Сведения об изменении условий контрактов, заключенных ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», и обеспечении исполнения контрактов, предоставленном при заключении контрактов и в ходе их исполнения, приведены в приложении № 1; сведения о предоставленном обеспечении гарантийных обязательств по контрактам приведены в приложении № 2.

В соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями, предусмотренными извещениями об осуществлении закупок,

заключенными контрактами, участниками закупок при заключении контрактов предоставлено соответствующее обеспечение исполнения контрактов.

В ходе исполнения контрактов в соответствии с заключенными к контрактам дополнительными соглашениями предусматривалось изменение существенных условий контрактов: объемов и видов выполняемых работ по контракту и (или) условия о выплате аванса и (или) срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом:

дополнительным соглашением № 1 от 21.11.2024 на основании подпункта «б» пункта 1, пункта 2 Постановления № 680⁶⁰ внесены изменения в государственный контракт № 003/2024-PPP от 12.04.2024 (реестровый № 2470315158624000003) (далее – контракт № 2470315158624000003) в части изменения объемов и видов работ, предусмотренных контрактом; на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ продлен срок выполнения работ по контракту;

дополнительным соглашением № 1 от 22.11.2024 на основании пункта 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения в государственный контракт № 004/2024-PPP от 15.04.2024 (реестровый № 2470315158624000002) (далее – контракт № 2470315158624000002) в части изменения объемов и видов работ, предусмотренных контрактом;

дополнительным соглашением № 1 от 21.11.2024 на основании подпункта «д» пункта 1 Постановления № 680 внесены изменения в государственный контракт № 015/2024-PPP от 02.09.2024 (реестровый № 2470315158624000019) (далее – контракт № 2470315158624000019) в части установления в контракте условия о выплате аванса; дополнительным соглашением № 3 от 18.06.2025 на основании пункта 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменены объемы и виды работ, предусмотренные контрактом⁶¹;

дополнительным соглашением № 1 от 04.12.2024 на основании подпункта «д» пункта 1 Постановления № 680 внесены изменения в государственный контракт № 006/2024-PPP от 28.06.2024 (реестровый № 2470315158624000012) (далее – контракт № 2470315158624000012) в части установления в контракте условия о выплате аванса⁶¹;

дополнительным соглашением № 1 от 20.12.2024 на основании подпункта «д» пункта 1 Постановления № 680 внесены изменения в государственный контракт № 011/2024-PPP от 23.08.2024 (реестровый № 2470315158624000017) (далее – контракт № 2470315158624000017) в части установления в контракте условия о выплате аванса⁶¹;

дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2024 на основании подпункта «д» пункта 1 Постановления № 680 внесены изменения в государственный контракт № 016/2024-PPP от 09.09.2024 (реестровый № 2470315158624000022)

⁶⁰ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» (далее – Постановление № 680).

⁶¹ Здесь и далее изменения указаны на дату проверки (контракт на дату проверки в стадии исполнения).

(далее – контракт № 2470315158624000022) в части установления в контракте условия о выплате аванса⁶¹;

дополнительным соглашением № 1 от 10.10.2024 на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены изменения в государственный контракт № 002/2024-PPP от 12.04.2024 (реестровый № 2470315158624000004) (далее – контракт № 2470315158624000004) в части продления срока выполнения работ по контракту; дополнительным соглашением № 2 от 22.11.2024 на основании пункта 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменены объемы и виды работ, предусмотренные контрактом.

Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения объемов и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; при этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 10% цены контракта.

Изменения на основании пункта 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены в контракты №№ 2470315158624000002, 2470315158624000019 (на дату проверки), 2470315158624000004 с соблюдением ограничения в части изменения цены контракта, установленного положениями пункта 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

На основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается однократное изменение срока исполнения контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении), если контракт не исполнен в установленный в контракте срок по вине подрядчика либо по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

На дату проверки изменения на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены в контракты №№ 2470315158624000003, 2470315158624000004 с соблюдением положений пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в части продления сроков выполнения работ на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Постановлением № 680 предусмотрена возможность изменения в 2022 - 2025 годах существенных условий государственных и муниципальных

контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, если в ходе исполнения контракта возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе:

изменение (продление) срока исполнения контракта, в том числе в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию, включая контракт, срок исполнения которого в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ ранее изменялся (подпункт «а» пункта 1 Постановления № 680);

изменение объема и (или) видов выполняемых работ по контракту (подпункт «б» пункта 1 Постановления № 680);

установление условия о выплате аванса или об изменении установленного размера аванса (подпункт «д» пункта 1 Постановления № 680).

Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде независимой гарантии, соответственно при заключении контракта **№ 2470315158624000017** и в ходе исполнения контрактов **№№ 2470315158624000019, 2470315158624000022** на сумму не менее, чем сумма установленного в соответствии с дополнительными соглашениями к контрактам аванса, обеспечивает предусмотренные контрактами обязательства в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

В целях обеспечения исполнения обязательств по указанным контрактам соответственно участником закупки (подрядчиками) предоставлены независимые гарантии: по контракту № 2470315158624000017 - на сумму 9 351,1 тыс. руб. (аванс в соответствии с внесенными в контракт изменениями установлен в сумме 9 267,9 тыс. руб.), по контракту № 2470315158624000019 - на сумму 6 398,3 тыс. руб. (в размере установленного аванса), по контракту № 2470315158624000022 - на сумму 75 866,7 тыс. руб. (в размере установленного аванса (приложение № 1).

В ходе исполнения контракта **№ 2470315158624000012** на основании подпункта «д» пункта 1 Постановления № 680 дополнительными соглашениями № 1 от 04.12.2024, № 2 от 10.12.2024 в контракт внесены изменения в части установления в контракте условия о выплате аванса в сумме 37 216,6 тыс. руб.

С учетом установленного пунктом 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ требования о необходимости обеспечения исполнения контракта в размере не менее, чем размер аванса, размер обеспечения исполнения контракта приведен в соответствии предусмотренному дополнительными соглашениями авансу и установлен в размере 37 216,6 тыс. руб. (пункт 4 дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2024).

Следует отметить, что согласно информации об изменении контракта № 24703151586240000120012, размещенной в реестре контрактов ЕИС 12.12.2024, указан размер обеспечения исполнения контракта 19 204,5 тыс. руб.

В соответствии с подпунктом «м» пункта 10 Правил ведения реестра контрактов⁶² в случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта информация о размере обеспечения исполнения контракта подлежит включению в реестр контрактов ЕИС.

Согласно пункту 12 Правил ведения реестра контрактов в реестр контрактов ЕИС подлежат включению также информация и документы об изменении контракта, в том числе об изменении информации, включенной в реестр в соответствии с указанными Правилами (подпункт «б» пункта 12 Правил).

В нарушение подпункта «б» пункта 12 Правил ведения реестра контрактов заказчиком при размещении в реестре контрактов ЕИС информации об изменении контракта № 24703151586240000120012 от 12.12.2024 информация об изменении размера обеспечения исполнения контракта в реестре не размещена.

Согласно пункту 5 дополнительного соглашения № 1 от 04.12.2024 обеспечение исполнения контракта в сумме, установленной пунктом 4 дополнительного соглашения, предоставляется подрядчиком в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения.

Заказчиком в соответствии с пунктом 4.5 электронного контракта (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2024) 18.12.2024 выплачен подрядчику аванс в сумме 37 216,6 тыс. руб., что подтверждается размещенным в ЕИС платежным поручением № 67043 от 18.12.2024.

При этом подрядчиком в нарушение пункта 5 дополнительного соглашения № 1 от 04.12.2024 обеспечение исполнения контракта на сумму, соответствующую размеру аванса, в установленный дополнительным соглашением срок не предоставлено.

Действующее обеспечение в виде независимой гарантии № 961546-БГ/24 от 25.06.2024, предоставленное при заключении контракта, обеспечивает обязательства подрядчика (принципала), предусмотренные контрактом, на сумму 19 204,5 тыс. руб. Таким образом, на дату заключения дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2024 обеспечение исполнения контракта не соответствует требованиям пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.5 электронного контракта (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2024), пунктов 6.6, 6.6.2 контракта, сформированного без использования ЕИС (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 04.12.2024), так как сумма такого обеспечения менее размера, установленного контрактом.

⁶² Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее - Правила ведения реестра контрактов).

В силу части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении, в том числе по основанию, предусмотренному Постановлением № 680, осуществляется при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии либо путем предоставления новой независимой гарантии (далее также – новое обеспечение исполнения контракта), обеспечивающей все обязательства, предусмотренные контрактом (с учетом внесенных в контракт изменений), в том числе обязательства по возврату аванса (в случае авансирования).

Согласно пункту 6.6.2 контракта, сформированного без использования ЕИС, обеспечение исполнения обязательств должно покрывать все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по контракту, в том числе обязательства по возврату средств, авансированных заказчиком подрядчику на выполнение работ по контракту, если авансирование предусмотрено контрактом.

Заказчиком 31.07.2025 осуществлена приемка по акту о приемке выполненных работ № 2 от 11.07.2025 на сумму 37 236,3 тыс. руб.; оплата произведена в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ и суммой выплаченного аванса (платежное поручение № 718634 от 28.08.2025).

При установлении дополнительным соглашением № 2 от 10.12.2024 условия об авансировании в период с 10.12.2024 по 31.07.2025 обязательства подрядчика по возврату аванса в случае неисполнения контракта не были обеспечены независимой гарантией № 961546-БГ/24.

Таким образом, дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2024 к контракту № 2470315158624000012 заключено с **нарушением** требований части 1.3 статьи 95, пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (при заключении дополнительного соглашения обеспечение исполнения контракта не предоставлено в полном размере).

Данный вывод подтверждается позицией Минфина России⁶³ по вопросу изменения обеспечения исполнения контракта в случае изменения

⁶³ Согласно Положению о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329, Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

существенных условий контракта (письма Минфина России № 24-06-06/4674 от 23.01.2023, № 24-06-07/95353 от 06.10.2023, № 24-06-06/116286 от 21.11.2024), решениями контрольных органов в сфере закупок (например, постановление ФАС России от 04.06.2025 по делу № 28/04/7.32-3111/2025, постановление Марийского УФАС России от 14.02.2024 по делу № 012/04/7.32-49/2024, решение Алтайского республиканского УФАС России № 004/10/99-479/2023 от 25.10.2023).

Следует отметить, что заключение дополнительного соглашения к контракту об авансировании в отсутствие предоставленного подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ надлежащего обеспечения исполнения контракта влечет за собой риски неполного обеспечения исполнения обязательств по контракту, невозврата аванса в случае неисполнения контракта, невозможность заказчику предъявить требование гаранту в размере аванса.

Согласно данным ЕИС, 29.04.2025 заказчиком направлено подрядчику требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта № 2470315158624000012 в размере аванса и начислении штрафных санкций (требование № 376 от 29.04.2025) при том, что срок предоставления нового обеспечения, установленный пунктом 5 дополнительного соглашения № 1 от 04.12.2024, истек 04.01.2025.

Приведенные факты могут свидетельствовать о том, что заказчиком претензионная работа в целях обеспечения исполнения подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта (в размере аванса) **не осуществлялась своевременно.**

Согласно требованию № 376 от 29.04.2025 в случае непредоставления подрядчиком нового обеспечения исполнения контракта ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» будет направлено обращение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью понуждения подрядчика к предоставлению обеспечения исполнения контракта.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» исх. № 813 от 10.10.2025, в связи с неисполнением подрядчиком требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта в размере аванса в добровольном порядке ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» письмом исх. № 638 от 12.08.2025 запрошены лимиты бюджетных обязательств для оплаты государственной пошлины при обращении в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в целях дальнейшего взыскания обеспечения исполнения контракта с подрядной организации в судебном порядке.

В результате изменения объемов и видов работ, предусмотренных контрактами №№ 2470315158624000003, 2470315158624000002, 2470315158624000004, в соответствии с заключенными к контрактам дополнительными соглашениями цены контрактов увеличены соответственно на 9 165,2 тыс. руб. (контракт № 2470315158624000003), 2 451,1 тыс. руб.

(контракт № 2470315158624000002) и 1,3 тыс. руб. (контракт № 2470315158624000004) относительно цен контрактов при их заключении.

При этом изменение в части увеличения цены контракта № 2470315158624000003 повлекло возникновение новых обязательств подрядчика на сумму 4 514,9 тыс. руб., не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта.

В ходе исполнения контракта № 2470315158624000003 подрядчиком в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предоставлено новое обеспечение в виде независимой гарантии на сумму 3 428,3 тыс. руб., т.е. увеличенную пропорционально стоимости новых обязательств.

В соответствии с частью 1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ требования обеспечения исполнения контракта такое обеспечение устанавливается в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ в контракте, заключаемом по результатам проведения электронной процедуры, указывается размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ). Таким образом, размер обеспечения исполнения контракта является существенным условием контракта.

Согласно части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при внесении дополнительным соглашением № 1 от 21.11.2024 изменений в контракт № 2470315158624000003 в части изменения его существенных условий (видов и объемов работ, предусмотренных контрактом, срока выполнения работ) изменение (увеличение) в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта сторонами не согласовано, изменения в контракт в части размера обеспечения исполнения контракта дополнительным соглашением не внесены.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» исх. № 1003 от 10.12.2025 механизм взыскания неустоек (штрафов, пеней) из обеспечения исполнения контрактов, предоставленного заказчику, в рассматриваемом периоде не применялся.

Согласно контрактам, являющимся предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ, заказчиком в соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ установлены требования к гарантийным обязательствам подрядчиков, согласно которым подрядчики гарантируют

качество выполненных работ в соответствии с условиями контрактов, своевременное устранение недостатков и нарушений, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

Во всех заключенных контрактах, являющихся предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ, заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ установлено требование об **обеспечении гарантийных обязательств**, предусмотренных контрактами, размер предоставляемого подрядчиками обеспечения гарантийных обязательств, порядок его предоставления, требования к такому обеспечению.

На дату проверки обеспечение гарантийных обязательств предоставлено подрядчиками по контрактам №№ 2470315158624000003, 2470315158624000002, 2470315158624000004, исполнение которых завершено.

В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств контрактом устанавливаются порядок и сроки предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения. Оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Согласно пункту 4.1 контракта № 2470315158624000002 при выполнении работ в полном объеме подрядчиком не позднее 3 календарных дней с даты окончания срока выполнения работ по контракту, установленного в пункте 1.4 контракта, формируется с использованием ЕИС документ о приемке.

Одновременно с формированием документа о приемке подрядчик при окончательной приемке работ предоставляет заказчику комплект отчетной документации в составе и объеме, предусмотренном пунктом 15 Описания объекта закупки (приложение № 1 к контракту) и документ об обеспечении гарантийных обязательств (пункт 4.3 контракта).

Документ об окончательной приемке работ по контракту № 2470315158624000002 сформирован подрядчиком с использованием ЕИС, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - усиленная электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и направлен заказчику в ЕИС 13.12.2024.

Независимая гарантия № OWRI4X, предоставленная подрядчиком в целях обеспечения гарантийных обязательств по контракту № 2470315158624000002, выдана 25.12.2024.

26.12.2024 заказчиком осуществлена окончательная приемка выполненных работ по контракту (документ о приемке подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика).

Таким образом, обеспечение гарантийных обязательств по контракту № 2470315158624000002 предоставлено **подрядчиком с нарушением** срока, установленного пунктом 4.3 контракта, а именно, позднее формирования в ЕИС документа о приемке.

Аналогичное **нарушение** выявлено по контракту № 2470315158624000004. Документ о приемке сформирован подрядчиком в ЕИС и направлен заказчику 28.11.2024, независимая гарантия № 0WRH5X, предоставленная в целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту № 2470315158624000004, выдана 25.12.2024, что подтверждается выпиской из реестра независимых гарантий ЕИС.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 6 Правил определения размера штрафа⁶⁴, пунктами 7.3 контрактов №№ 2470315158624000002, 2470315158624000004 установлена ответственность подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов в реестр контрактов ЕИС подлежат включению в том числе информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, в том числе:

требование заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), направленное поставщику (подрядчику, исполнителю);

размер начисленной неустойки (штрафа, пени);

размер уплаченной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени);

документ, подтверждающий уплату неустойки, реквизиты такого документа.

На дату проверки информация и документы о применении ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» мер ответственности к подрядчику по контрактам №№ 2470315158624000002, 2470315158624000004 в виде штрафов в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных пунктами 4.3 контрактов, в реестре контрактов ЕИС не размещены.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» исх. от 10.10.2025 № 813 ***претензионная работа*** в отношении подрядчика в связи с нарушением им условий контрактов №№ 2470315158624000004, 2470315158624000002 соответственно в период с 28.11.2024 и 13.12.2024 ***не проводилась***.

⁶⁴ Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

Контракты №№ 2470315158624000002, 2470315158624000004 расторгнуты сторонами по соглашению сторон по факту выполнения работ на объектах. Согласно пунктам 4 соглашений о расторжении контрактов от 06.02.2025 претензий друг к другу в связи с расторжением контрактов (в части начисления штрафных санкций за нарушение сторонами обязательств) стороны не имеют.

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 7.3 контрактов №№ 2470315158624000002, 2470315158624000004 меры ответственности к подрядчику в виде штрафов в связи с нарушением установленного контрактами срока предоставления обеспечения гарантийных обязательств при расторжении контрактов не применены. Контроль за исполнением подрядчиком условий контрактов в части соблюдения установленного срока предоставления обеспечения гарантийных обязательств осуществлен заказчиком ненадлежащим образом.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» исх. от 10.10.2025 № 813 для недопущения в дальнейшем указанных нарушений ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» будет внесено изменение в положение о контрактной службе ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» с учетом информации КСП ЛО о выявленных нарушениях, а также усилен контроль за предоставлением обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с условиями контрактов.

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства».

Предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ являлись 18 контрактов на разработку проектной документации и (или) выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции объектов капитального строительства суммарной стоимостью 2 375,3 млн. руб., заключенных ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в 2024 году и истекшем периоде 2025 года.

Сведения об изменении условий контрактов и обеспечении исполнения контрактов, предоставленном при заключении контрактов и в ходе их исполнения, приведены в приложении № 3; сведения о предоставленном обеспечении гарантийных обязательств приведены в приложении № 4.

В соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями, предусмотренными извещениями об осуществлении закупок, заключенными контрактами, участниками закупок при заключении контрактов предоставлено соответствующее обеспечение исполнения контрактов.

В ходе исполнения контрактов в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями предусматривалось изменение существенных условий контрактов: увеличение цены контракта и (или) установление условия о выплате аванса и (или) продление срока исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных контрактом.

Дополнительными соглашениями **изменения в части увеличения цены контракта** внесены в 11 контрактов, являющихся предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ:

дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2024 к государственному контракту № 0014 от 06.03.2024 (реестровый № 2470606441224000016) (далее – контракт № 2470606441224000016) (согласно дополнительному соглашению изменения внесены на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

дополнительными соглашениями № 2 от 12.02.2025, № 4 от 03.07.2025, №5 от 20.08.2025 к государственному контракту № 0016 от 13.03.2024 (реестровый № 2470606441224000019) (далее – контракт № 2470606441224000019);

дополнительными соглашениями № 2 от 15.05.2024, № 3 от 14.06.2024, № 4 от 11.07.2024, № 5 от 08.08.2024, № 6 от 03.09.2024, № 7 от 23.09.2024 к государственному контракту № 0021 от 27.03.2024 (реестровый № 2470606441224000025) (далее – контракт № 2470606441224000025);

дополнительным соглашением № 3 от 25.12.2024 к государственному контракту № 0024 от 29.03.2024 (реестровый № 2470606441224000029) (далее – контракт № 2470606441224000029);

дополнительными соглашениями № 2 от 08.11.2024, № 3 от 17.12.2024 к государственному контракту № 0026 от 12.04.2024 (реестровый № 2470606441224000028) (далее – контракт № 2470606441224000028);

дополнительными соглашениями № 1 от 03.02.2025, № 2 от 27.02.2025, № 3 от 18.08.2025 к государственному контракту б/н от 31.05.2024 (реестровый № 2470606441224000033) (далее – контракт № 2470606441224000033)⁶⁵;

дополнительным соглашением № 3 от 22.07.2025 к государственному контракту № 130957 от 03.07.2024 (реестровый № 2470606441224000040) (далее – контракт № 2470606441224000040)⁶⁵;

дополнительным соглашением № 3 от 18.07.2025 к государственному контракту № 130960 от 03.07.2024 (реестровый № 2470606441224000042) (далее – контракт № 2470606441224000042)⁶⁵;

дополнительными соглашениями № 2 от 28.03.2025, № 4 от 11.08.2025 к государственному контракту № 3909 от 03.07.2024 (реестровый № 2470606441224000041) (далее – контракт № 2470606441224000041)⁶⁵;

дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2024 к государственному контракту № 4614 от 26.07.2024 (реестровый № 2470606441224000050) (далее – контракт № 2470606441224000050);

дополнительным соглашением № 2 от 29.07.2025 к государственному контракту № 5022 от 09.08.2024 (реестровый № 2470606441224000054) (далее – контракт № 2470606441224000054)⁶⁵ (согласно дополнительному соглашению изменения внесены на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

⁶⁵ Здесь и далее изменения указаны на дату проверки (контракт на дату проверки в стадии исполнения).

С учетом изменения цены контракта соответственно смета контракта, график выполнения работ, график выполнения и оплаты строительно-монтажных работ на объекте, прилагаемые к контрактам, изложены в новой редакции.

Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», увеличение стоимости работ в ходе исполнения контрактов обусловлено уточнением технических решений и корректировкой объемов работ на этапе разработки рабочей документации, предусмотренной условиями контрактов и техническими заданиями на выполнение работ, в том числе превышением сметной стоимости работ в соответствии с полученным положительным заключением государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (далее - ГАУ «Леноблгосэкспертиза») относительно цены контракта, выявлением неучтенных работ и необходимостью внесения изменений в проектную документацию.

Следует отметить, что в дополнительных соглашениях к контрактам №№ 2470606441224000019, 2470606441224000025, 2470606441224000029, 2470606441224000028, 2470606441224000033, 2470606441224000040, 2470606441224000042, 2470606441224000041, 2470606441224000050 основание для внесения в контракт изменений не указано. Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», представленным письмом исх. № 1495-14/2025 от 01.09.2025, изменения в указанные контракты внесены на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Следует отметить, что пункт 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ не мог являться основанием для внесения изменений в указанные контракты, так как положения пункта 1.2 не распространяются на контракты, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.

Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», изменения в контракт № 2470606441224000016 внесены на основании пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с превышением сметной стоимости выполнения работ (согласно положительному заключению ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 47-1-1-2-073661-2024 от 06.12.2024) относительно цены контракта.

Вместе с тем, пункт 8 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающий изменение существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, не мог являться основанием для внесения изменений, так как положения указанного пункта части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ распространяются на контракты, заключенные на срок не менее одного года, цена которых составляет или превышает предельный размер цены, установленный

Правительством Российской Федерации (100 млн. руб. в соответствии с Постановлением № 1186)⁶⁶.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ возможность внесения изменений в части объема и (или) видов выполняемых работ в контракты, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, предусмотрена пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при изменении цены контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на 10% цены контракта.

Согласно пояснениям, представленным ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» дополнительно письмом исх. № 895-11/2025-1 от 28.10.2025, изменения в контракты внесены на основании пункта 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Следует отметить, что на дату проверки изменения в части увеличения цены контракта внесены в контракты в пределах 10% цены контракта.

Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде независимой гарантии соответственно при заключении и исполнении контрактов №№ 2470606441224000019, 2470606441224000029, 2470606441224000028, 2470606441224000033, 2470606441224000040, 2470606441224000042, обеспечивает предусмотренные контрактами обязательства в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (приложение № 3).

В ходе исполнения контрактов №№ 2470606441224000041, 2470606441224000025, 2470606441224000050 сторонами заключены в том числе дополнительное соглашение № 2 от 28.03.2025 к контракту № 2470606441224000041, дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2024 к контракту № 2470606441224000025, дополнительное соглашение № 2 от 19.12.2024 к контракту № 2470606441224000050.

Цена контракта № 2470606441224000041 в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 28.03.2025 увеличена до 102 107,5 тыс. руб. или на 8 161,3 тыс. руб. относительно первоначальной цены.

Цена контракта № 2470606441224000025 увеличена до 286 736,8 тыс. руб. или на 4 562,1 тыс. руб. в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 15.05.2024, цена контракта № 2470606441224000050 - до 28 877,7 тыс. руб. или на 2 625,2 тыс. руб. в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2024.

С учетом увеличения цены контракта № 2470606441224000041 стоимость неисполненных обязательств, подлежащих исполнению на дату заключения дополнительного соглашения № 2 от 28.03.2025, составила 98 018,3 тыс. руб.

⁶⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно» (далее – Постановление № 1186).

Согласно данным ЕИС, по состоянию на 28.03.2025 исполнены обязательства на сумму 4 089,2 тыс. руб.

Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде независимой гарантии № LM2106249921 от 28.06.2024 на сумму 9 394,6 тыс. руб., обеспечивает обязательства, предусмотренные контрактом № 2470606441224000041, на общую сумму 93 946,2 тыс. руб. (разъяснения Минфина России по вопросу обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных контрактом)⁶⁷.

Таким образом, увеличение цены контракта повлекло возникновение новых обязательств на сумму 4 072,1 тыс. руб. (98 018,3 - 93 946,2), не обеспеченных ранее предоставленным при заключении контракта обеспечением исполнения контракта.

Аналогично в случае заключения дополнительного соглашения № 2 от 15.05.2024 к контракту № 2470606441224000025, дополнительного соглашения № 2 от 19.12.2024 к контракту № 2470606441224000050. Сведения о стоимости обязательств, исполненных и неисполненных на дату заключения соответствующего дополнительного соглашения, приведены в таблице № 41.

Таблица № 41

Сведения об исполнении обязательств по контрактам
№№ 2470606441224000041, 2470606441224000025, 2470606441224000050
на даты заключения дополнительных соглашений

Реквизиты дополнительного соглашения к контракту	Цена контракта с учетом изменений, внесенных дополнитель- ным соглашением, тыс. руб.	Стоимость исполненных обязательств на дату заключения дополнитель- ного соглашения, тыс. руб.*	Стоимость неисполненных обязательств, подлежащих исполнению на дату заключения дополнитель- ного соглашения, тыс. руб. (гр. 2 – гр. 3)	Цена контракта при заключении, тыс. руб.
1	2	3	4	5
Дополнительное соглашение № 2 от 28.03.2025 к контракту № 2470606441224000041	102 107,5	4 089,2	98 018,3	93 946,2
Дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2024 к контракту № 2470606441224000025	286 736,8	0,0	286 736,8	282 174,7
Дополнительное соглашение № 2 от 19.12.2024 к контракту № 2470606441224000050	28 877,7	0,0	28 877,7	26 252,5

* согласно документам о приемке и оплате обязательств по контрактам, размещенным в ЕИС

⁶⁷ Письма Минфина России № 24-06-09/2607 от 16.01.2025, № 24-06-06/116286 от 21.11.2024, № 24-06-07/87436 от 13.09.2024.

В соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменения существенных условий контракта при его исполнении, предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии либо путем предоставления новой независимой гарантии (пункты 2, 3 части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

При этом, если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4 части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

Согласно информации и документам, представленным ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», обеспечение исполнения контракта, предусмотренное требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения № 2 от 28.03.2025 к контракту № 2470606441224000041, дополнительного соглашения № 2 от 15.05.2024 к контракту № 2470606441224000025, дополнительного соглашения № 2 от 19.12.2024 к контракту № 2470606441224000050 не предоставлено.

Таким образом, дополнительное соглашение № 2 от 28.03.2025 к контракту № 2470606441224000041, дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2024 к контракту № 2470606441224000025, дополнительное соглашение № 2 от 19.12.2024 к контракту № 2470606441224000050 заключены с **нарушением** требований части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда изменение цены контракта влечет возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта, предусмотренное требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

Данный вывод подтверждается позицией Минфина России по вопросу применения положений Федерального закона № 44-ФЗ в части изменения обеспечения исполнения контракта при изменении цены контракта⁶⁸.

Следует также отметить, что изменения в контракты в части увеличения размера обеспечения исполнения контракта при увеличении его цены дополнительными соглашениями также не внесены.

Новое обеспечение исполнения контракта № 2470606441224000041 (изменение от 08.08.2025 в условия независимой гарантии № LM2106249921 от 28.06.2024) фактически предоставлено только при последующем внесении в контракт изменений дополнительным соглашением № 4 от 11.08.2025.

Следует отметить, что в случае, если соответствующие изменения в контракты №№ 2470606441224000041, 2470606441224000025, 2470606441224000050 в части увеличения цены контракта вносились бы соответственно после 09.04.2025 (контракт № 2470606441224000041), 27.05.2024 (контракт № 2470606441224000025) и 26.12.2024 (контракт № 2470606441224000050), такие изменения не потребовали бы предоставления нового обеспечения исполнения контракта, так как в таком случае необеспеченные обязательства не возникали бы.

Так, согласно данным ЕИС, по контракту № 2470606441224000041 на 09.04.2025 были исполнены обязательства на сумму 8 902,5 тыс. руб., стоимость неисполненных обязательств составила 93 205 тыс. руб. По контракту № 2470606441224000025 на 27.05.2024 были исполнены обязательства на сумму 42 343,4 тыс. руб., стоимость неисполненных обязательств составила 253 267,4 тыс. руб. По контракту № 2470606441224000050 на 26.12.2024 были исполнены обязательства на сумму 9 977,6 тыс. руб., стоимость неисполненных обязательств составила 18 900,1 тыс. руб.

Таким образом, внесение изменений в контракты осуществлялось без учета стоимости фактически исполненных обязательств, вследствие чего заказчиком были нарушены требования части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Следует отметить, что вследствие просрочки подрядчиком выполнения работ по разработке проектной документации по контракту № 2470606441224000016, изменения в контракт в части увеличения цены контракта внесены дополнительным соглашением № 2 от 19.12.2024 с нарушением части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, по истечении срока исполнения обязательств, предусмотренного контрактом (31.10.2024), по факту выполнения работ на объекте и при отсутствии обеспечения исполнения контракта, предоставленного в соответствии с требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

⁶⁸ Письма Минфина России № 24-06-09/2607 от 16.01.2025, № 24-06-06/116286 от 21.11.2024, № 24-06-07/87436 от 13.09.2024, № 24-06-07/95353 от 06.10.2023, № 24-06-06/4674 от 23.01.2023.

В ходе исполнения контракта № 2470606441224000054 в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 29.07.2025 в контракт внесены изменения в части увеличения цены контракта до 157 510,1 тыс. руб.

На основании части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ подрядчиком предоставлено новое обеспечение исполнения контракта в размере 15 751 тыс. руб. путем внесения изменения от 28.07.2025 в условия независимой гарантии № IGR24/DUNW/1163 от 05.08.2024 в части увеличения суммы независимой гарантии.

Согласно извещению об осуществлении закупки, пункту 4.2 электронного контракта № 2470606441224000054, пункту 3.1 контракта, сформированного без использования ЕИС, Графику выполнения работ (приложение № 3 к контракту) контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

В соответствии с частью 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

С учетом исполнения подрядчиком обязательств по 1 этапу исполнения контракта и частичного исполнения обязательств по 2 этапу на основании части 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ подрядчиком предоставлено новое обеспечение исполнения контракта на сумму 7 944,7 тыс. руб., размер которого уменьшен (изменение от 22.08.2025 в условия независимой гарантии № IGR24/DUNW/1163 от 05.08.2024).

Согласно части 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотренное частью 7.1 указанной статьи Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4.2 электронного контракта № 2470606441224000054, Графиком выполнения работ срок окончания выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) установлен 28.02.2025.

Контрактом предусмотрена приемка выполненных проектных работ в соответствии с Заданием на разработку проектной документации (приложение № 1 к Описанию объекта закупки), Графиком выполнения работ, порядок которой установлен в разделе 8.1 контракта.

Согласно документу о приемке выполненных работ № 1 от 07.08.2025, размещенному в ЕИС, приемка работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) осуществлена заказчиком 07.08.2025 (документ о приемке подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика). Согласно акту о приемке выполненных работ № 1 от 07.08.2025 работы выполнены в полном объеме и сданы подрядчиком 07.08.2025.

Таким образом, исходя из информации, содержащейся в документе о приемке, размещенном подрядчиком в ЕИС 07.08.2025, просрочка выполнения подрядчиком работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) составила 160 дней.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

На дату проверки информация и документы о применении ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» по контракту № 2470606441224000054 мер ответственности к подрядчику в связи с нарушением сроков выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) в реестре контрактов ЕИС не размещены.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» исх. № 1971-14/2025 от 01.11.2025 претензионная работа в отношении подрядчика в связи с нарушением им условий контракта № 2470606441224000054 в период с 07.08.2025 и на дату проверки **не осуществлялась.**

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в **нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000054 в связи с нарушением сроков выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) на дату проверки не применены.

Указанное **нарушение устранено** в ходе настоящего ЭАМ. В соответствии с письмом КСП ЛО (исх. № 01-21-76/2025 от 21.10.2025) ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в адрес подрядчика по контракту № 2470606441224000054 направлена претензия № 1965-14/2025 от 01.11.2025 с требованием об уплате неустоек (пеней) по факту просрочки выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) (на сумму 401 тыс. руб.) и выполнения строительно-монтажных работ на объекте (всего на общую сумму 1 978,4 тыс. руб.).

Учитывая изложенное, условие, предусмотренное частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при уменьшении размера обеспечения исполнения контракта № 2470606441224000054 в ходе его исполнения не соблюдено (требование об уплате неустоек (пеней) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ подрядчику не предъявлено и последним не исполнено), вследствие чего уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществлено ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» с **нарушением** требований частей 7.1, 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Дополнительными соглашениями **изменения в части установления в контракте условия о выплате аванса и (или) продления срока исполнения** подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных контрактом, внесены в 7 контрактов, являющихся предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ.

Дополнительным соглашением № 2 от 14.07.2025 на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ продлен срок выполнения работ по государственному контракту № 0007 от 30.01.2024 (реестровый № 2470606441224000014) (далее – контракт № 2470606441224000014)⁶⁹.

Дополнительными соглашениями № 1 от 25.12.2024, № 1 от 25.12.2024, № 1 от 20.12.2024, № 2 от 20.06.2025, № 2 от 04.08.2025, № 1 от 22.05.2025 внесены изменения соответственно в государственный контракт № 33463 от 23.07.2024 (реестровый № 2470606441224000046) (далее – контракт № 2470606441224000046)⁶⁹, государственный контракт № 5307 от 19.08.2024 (реестровый № 2470606441224000059) (далее – контракт № 2470606441224000059)⁶⁹, государственный контракт № 6528 от 16.10.2024 (реестровый № 2470606441224000074) (далее – контракт № 2470606441224000074)⁶⁹, государственный контракт № 95069 от 25.02.2025 (реестровый № 2470606441225000002) (далее – контракт № 2470606441225000002)⁶⁹, государственный контракт № 4972 от 10.06.2025 (реестровый № 2470606441225000026) (далее – контракт № 2470606441225000026)⁶⁹, государственный контракт № 1907 от 01.04.2025 (реестровый № 2470606441225000010) (далее – контракт № 2470606441225000010)⁶⁹ в части установления в контрактах условия о выплате аванса.

Дополнительным соглашением № 3 от 09.04.2025 к контракту № 2470606441224000074 на основании Постановления № 680 также продлен срок выполнения работ по контракту.

Согласно дополнительному соглашению № 2 от 04.08.2025 к контракту № 2470606441225000026 изменения в части установления в контракте условия о выплате аванса внесены в контракт на основании Постановления № 680; в дополнительных соглашениях к остальным контрактам основание для внесения в контракт изменений не указано. Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» изменения в контракты в части установления условия о выплате аванса внесены на основании Постановления № 680.

На основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается однократное изменение срока исполнения контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении), если контракт не исполнен в установленный в контракте срок по вине подрядчика либо по независящим от

⁶⁹ Здесь и далее изменения указаны на дату проверки (контракт на дату проверки в стадии исполнения).

сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» изменения в контракт № 2470606441224000014 в части продления срока выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены в связи с возникшей в ходе исполнения контракта необходимостью проведения повторных геологических изысканий и корректировки проектных решений и технологий ведения работ (работы на объекте были приостановлены на указанный период).

На дату проверки изменения в контракт № 2470606441224000014 на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ внесены с соблюдением положений указанного пункта части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в части продления срока выполнения работ на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде независимой гарантии соответственно при заключении и исполнении контрактов №№ 2470606441224000014, 2470606441225000026, обеспечивает предусмотренные контрактами обязательства в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (приложение № 3).

В соответствии с внесенными в контракты №№ 2470606441224000074, 2470606441225000002, 2470606441225000010, 2470606441224000046, 2470606441224000059 изменениями об установлении условия о выплате аванса, с учетом требований пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ о необходимости обеспечения исполнения контракта в размере не менее, чем размер аванса, размер обеспечения исполнения контрактов приведен в соответствие предусмотренному дополнительными соглашениями авансу и установлен в размере аванса.

Дополнительными соглашениями в контракты включено условие о предоставлении подрядчиком до выплаты аванса независимой гарантии на сумму аванса, обеспечивающей обязательство подрядчика по возврату аванса (обеспечения на возврат аванса).

Подрядчиками предоставлено обеспечение исполнения контрактов в размере аванса:

- изменение от 24.12.2024 в условия независимой гарантии № 55663/GI/241010 от 11.10.2024, выданной для целей обеспечения исполнения контракта № 2470606441224000074 (в части увеличения суммы независимой гарантии до размера аванса);

- изменение от 26.06.2025 в условия независимой гарантии № 59747/GI/250218 от 19.02.2025, выданной для целей обеспечения исполнения контракта № 2470606441225000002 (в части увеличения суммы независимой гарантии до размера аванса);

- новая независимая гарантия № 10982537 от 30.05.2025 на сумму аванса, выданная для целей обеспечения исполнения контракта № 2470606441225000010.

Согласно информации, представленной ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», по контракту № 2470606441224000046 обеспечение исполнения контракта в размере аванса подрядчиком не предоставлено.

Для целей обеспечения возврата аванса по контракту № 2470606441224000059 (установлен дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2024 в размере 142 375,6 тыс. руб.) подрядчиком предоставлена новая независимая гарантия № 243/2024-РГ00-00/Г300 от 27.12.2024 на сумму 91 567,9 тыс. руб., т.е. дополнительную к сумме независимой гарантии, предоставленной при заключении контракта (независимая гарантия № БГ-24/0609/5 от 15.08.2024 на сумму 50 807,7 тыс. руб.).

В соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Согласно части 2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ независимая гарантия должна содержать сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом (поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 3 части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии.

Как следует из вышеизложенного, положениями Федерального закона № 44-ФЗ предоставление двух независимых гарантий на разные суммы в разных или равных долях для обеспечения исполнения контракта не предусмотрено⁷⁰.

Таким образом, независимая гарантия № 243/2024-РГ00-00/Г300 от 27.12.2024, предоставленная для целей обеспечения возврата аванса по контракту № 2470606441224000059, не соответствует требованиям пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.5 электронного контракта, пункта 6.11 контракта, сформированного без использования ЕИС (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024), так как обеспечивает обязательства на сумму менее аванса.

⁷⁰ Письмо Минфина России № 24-03-08/3102 от 19.01.2018 по вопросу предоставления банковских гарантий для обеспечения исполнения контракта.

Основания для отказа заказчиком в принятии независимой гарантии предусмотрены частью 6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ в случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 указанной статьи, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 Правил ведения реестра независимых гарантий⁷¹ в реестр независимых гарантий ЕИС включаются в том числе сведения об отказе заказчика в принятии независимой гарантии.

Согласно пункту 12 Правил ведения реестра независимых гарантий в случае отказа в принятии независимой гарантии такие сведения формируются и включаются заказчиком в реестр независимых гарантий ЕИС в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления независимой гарантии.

С учетом пояснений, представленных ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» письмом исх. № 1971-14/2025 от 01.11.2025, при наличии оснований для отказа заказчика в принятии независимой гарантии № 243/2024-РГ00-00/Г300 от 27.12.2024 меры, предусмотренные частью 7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (информирование лица, предоставившего независимую гарантию, об отказе в принятии независимой гарантии), пунктом 12 Правил ведения реестра независимых гарантий (формирование и включение в реестр независимых гарантий ЕИС сведений об отказе в принятии независимой гарантии), заказчиком **не реализованы**, подтверждающие документы не представлены.

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» **в нарушение** части 6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ для целей обеспечения исполнения контракта № 2470606441224000059 была принята независимая гарантия № 243/2024-РГ00-00/Г300 от 27.12.2024, не соответствующая требованиям пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.5 электронного контракта, пункта 6.11 контракта, сформированного без использования ЕИС (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024).

В соответствии с пунктом 5 электронного контракта № 2470606441224000059, пунктом 3.8 контракта, сформированного без использования ЕИС (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024), заказчиком выплачен аванс в сумме 142 375,6 тыс. руб., что подтверждается размещенным в ЕИС платежным поручением № 114942 от 28.12.2024.

⁷¹ Правила ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Правила ведения реестра независимых гарантий).

Согласно информации и документам, представленным ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», подрядчиком в нарушение условий пункта 3.8 контракта, сформированного без использования ЕИС (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024), обеспечение исполнения контракта в размере аванса предоставлено после выплаты аванса: изменение от 03.02.2025 в условия независимой гарантии № 243/2024-РГ00-00/Г300 от 27.12.2024 (в части увеличения суммы независимой гарантии до размера аванса).

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» исх. № 1971-14/2025 от 01.11.2025 претензионная работа в отношении подрядчика в связи с нарушением им условий контракта № 2470606441224000059 в период с 03.02.2025 и на дату проверки не осуществлялась.

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000059 в связи с нарушением установленного пунктом 3.8 контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024) срока предоставления обеспечения исполнения контракта в размере аванса (надлежащее обеспечение исполнения контракта в размере аванса предоставлено после выплаты аванса) на дату проверки не применены.

Указанное **нарушение устранено** в ходе настоящего ЭАМ. В соответствии с письмом КСП ЛО (исх. № 01-21-76/2025 от 21.10.2025) ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в адрес подрядчика направлена претензия № 1966-14/2025 от 01.11.2025 с требованием об уплате нестойки (штрафа) на сумму 2 032,3 тыс. руб. по факту нарушения установленного контрактом срока предоставления обеспечения исполнения контракта.

Таким образом, в период с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения об установлении условия о выплате аванса до предоставления обеспечения исполнения контракта в размере аванса обеспечение исполнения контрактов №№ 2470606441224000074, 2470606441225000002, 2470606441225000010, 2470606441224000059 не соответствовало требованиям пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиям контракта (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением), так как сумма действующего обеспечения исполнения контракта менее размера, установленного контрактом (менее размера аванса): в период с 20.12.2024 до 24.12.2024 по контракту № 2470606441224000074, с 20.06.2025 до 26.06.2025 по контракту № 2470606441225000002, с 22.05.2025 до 30.05.2025 по контракту № 2470606441225000010, с 25.12.2024 до 03.02.2025 по контракту № 2470606441224000059; по контракту № 2470606441224000046 соответственно в период с 25.12.2024 и на момент проверки (обеспечение в размере аванса не предоставлено).

В связи с продлением срока окончания выполнения работ по контракту № 2470606441224000074 (с 01.12.2025 по 01.11.2026) в соответствии с пунктом 3 дополнительного соглашения № 3 от 09.04.2025 подрядчиком предоставлено

новое обеспечение исполнения контракта путем внесения изменения от 17.04.2025 в условия независимой гарантии № 55663/GI/241010 от 11.10.2024 в части продления срока действия независимой гарантии.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Как следует из положений части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде независимой гарантии, должно обеспечивать все обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках исполнения контракта, в том числе связанные с увеличением срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом⁷².

Таким образом, в период с 09.04.2025 (даты заключения дополнительного соглашения) до 17.04.2025 обеспечение исполнения контракта № 2470606441224000074 не соответствовало требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиям пункта 7.9 контракта, так как срок действия независимой гарантии менее срока, предусмотренного требованиями указанной части статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (срок окончания действия независимой гарантии № 55663/GI/241010 - 02.02.2026, должен быть в соответствии с требованиями части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (с учетом продления срока окончания выполнения работ, предусмотренного контрактом) не ранее 01.12.2026). Действующая в указанный период независимая гарантия не обеспечивала обязательства подрядчика, предусмотренные контрактом, в период исполнения контракта с 02.02.2026 по 01.12.2026.

В силу части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении, в том числе по основанию, предусмотренному Постановлением № 680, осуществляется при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2024 к контракту № 2470606441224000074, дополнительное соглашение № 2 от 20.06.2025 к контракту № 2470606441225000002, дополнительное соглашение № 1 от 22.05.2025 к контракту № 2470606441225000010, дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2024 к контракту № 2470606441224000046,

⁷² Письмо Минфина России № 24-06-07/95353 от 06.10.2023.

дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2024 к контракту № 2470606441224000059 заключены **с нарушением** требований части 1.3 статьи 95, пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда установление в контракте условия о выплате аванса влечет возникновение новых обязательств подрядчика (по возврату аванса в случае неисполнения контракта), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта, предусмотренное требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в размере аванса), при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

Аналогично дополнительное соглашение № 3 от 09.04.2025 к контракту № 2470606441224000074 заключено **с нарушением** требований части 1.3 статьи 95, части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда продление срока исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, влечет возникновение обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта (в период исполнения контракта с 02.02.2026 по 01.12.2026), обеспечение исполнения контракта с новым сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

Данный вывод подтверждается позицией Минфина России по вопросу изменения обеспечения исполнения контракта в случае изменения существенных условий контракта⁷³, решениями контрольных органов в сфере закупок⁷⁴.

Следует также отметить, что заключение дополнительного соглашения об авансировании в отсутствие предоставленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта влечет за собой риски, связанные с ненадлежащим обеспечением обязательств по возврату аванса (невозможность заказчику предъявить требование гаранту в размере аванса, риск невозврата аванса в случае неисполнения контракта).

Установление в контракте условия о предоставлении обеспечения исполнения контракта до выплаты аванса и о выплате аванса при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ влечет за собой риски как нарушения требований части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено после заключения дополнительного соглашения об авансировании), так и неисполнения заказчиком обязательства по

⁷³ Письма Минфина России № 24-06-06/4674 от 23.01.2023, № 24-06-07/95353 от 06.10.2023, № 24-06-06/116286 от 21.11.2024.

⁷⁴ Постановление ФАС России от 04.06.2025 по делу № 28/04/7.32-3111/2025, постановление Марийского УФАС России от 14.02.2024 по делу № 012/04/7.32-49/2024, решение Алтайского республиканского УФАС России № 004/10/99-479/2023 от 25.10.2023.

авансированию, являющегося существенным условием контракта (в случае, если обеспечение исполнения контракта не предоставлено).

Так, при установлении дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2024 к контракту № 2470606441224000046 условия об авансировании обеспечение исполнения контракта в размере аванса, предусмотренное требованиями пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями контракта (пункта 4.5 электронного контракта, пункта 3.8 контракта, сформированного без использования ЕИС, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024), подрядчиком не предоставлено. Согласно данным ЕИС, обязательство по выплате аванса, предусмотренное пунктом 5.3 электронного контракта № 2470606441224000046, пунктом 3.8 контракта, сформированного без использования ЕИС, заказчиком не исполнено.

Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», представленным письмом исх. № 895-11/2025-1 от 28.10.2025, неисполнение обязательства по выплате аванса обусловлено непредоставлением подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере аванса, обеспечивающего обязательства по его возврату, вследствие чего **заказчиком допущено нарушение** условия контракта об авансировании (пункта 5.3 электронного контракта № 2470606441224000046, пункта 3.8 контракта, сформированного без использования ЕИС).

Согласно письму исх. № 1971-14/2025 от 01.11.2025 претензионная работа в отношении подрядчика в связи с нарушением им условий контракта № 2470606441224000046 заказчиком в период с 25.12.2024 и на дату проверки не осуществлялась.

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в **нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000046 в связи с непредоставлением обеспечения исполнения контракта в размере аванса, предусмотренного требованиями пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями контракта (пункта 4.5 электронного контракта, пункта 3.8 контракта, сформированного без использования ЕИС, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024), на дату проверки не применены.

Указанное **нарушение устранено** в ходе настоящего ЭАМ. В соответствии с письмом КСП ЛО (исх. № 01-21-76/2025 от 21.10.2025) ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в адрес подрядчика направлена претензия № 1968-14/2025 от 01.11.2025 с требованием об уплате неустойки (штрафа) на сумму 2 237,9 тыс. руб. по факту непредоставления обеспечения исполнения контракта в размере аванса.

Информация об иных предпринятых мерах в целях предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» не представлена.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» исх. № 1019-11/2025-1 от 09.12.2025 механизм взыскания неустоек (штрафов,

пеней) из обеспечения исполнения контрактов, предоставленного заказчику, в рассматриваемом периоде не применялся.

Во всех заключенных контрактах, являющихся предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ, заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ установлено требование об **обеспечении гарантийных обязательств**, предусмотренных контрактами, размер предоставляемого подрядчиками обеспечения гарантийных обязательств, порядок его предоставления, требования к такому обеспечению.

На дату проверки обеспечение гарантийных обязательств предоставлено подрядчиками по контрактам №№ 2470606441224000016, 2470606441224000019, 2470606441224000025, 2470606441224000029, 2470606441224000028, 2470606441224000050, исполнение которых завершено.

В соответствии с извещением об осуществлении закупки в заключенном контракте № 2470606441224000054 требование обеспечения гарантийных обязательств установлено в размере 1 431,9 тыс. руб. или 1% от Н(М)ЦК.

Дополнительным соглашением № 2 от 29.07.2025 к контракту № 2470606441224000054 размер обеспечения гарантийных обязательств изменен и установлен 1 575,1 тыс. руб. или 1% от цены контракта (с учетом увеличения цены контракта до 157 510,1 тыс. руб.) (пункт 4.5 электронного контракта, пункт 7.13 контракта, сформированного без использования ЕИС).

Согласно части 2.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком требования обеспечения гарантийных обязательств в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ такое требование устанавливается в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта; размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% процентов от Н(М)ЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки указывается размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (в случае установления требования обеспечения гарантийных обязательств в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ проект контракта, формируемый заказчиком с использованием ЕИС по результатам проведения электронной процедуры, должен содержать в том числе информацию о размере обеспечения гарантийных обязательств, порядке предоставления такого обеспечения, требованиях к такому обеспечению (если требование обеспечения гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ), предусмотренную пунктом 17 части 1 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, в случае установления требования обеспечения гарантийных обязательств размер обеспечения гарантийных обязательств

устанавливается в контракте в соответствии с извещением об осуществлении закупки, проектом контракта.

В соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменения существенных условий контракта при его исполнении, предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Таким образом, положениями Федерального закона № 44-ФЗ установление размера обеспечения гарантийных обязательств в процентах от цены контракта и его изменение при изменении цены контракта не предусмотрено⁷⁵.

В нарушение требований части 2.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения гарантийных обязательств по контракту № 2470606441224000054 в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 29.07.2025 к контракту изменен и установлен в процентах от цены контракта.

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор «электронного правительства».

Предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ являлись 8 контрактов суммарной стоимостью 411 172,7 тыс. руб., заключенных ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» в 2024 году.

В ходе исполнения контрактов предусматривалось изменение одного или нескольких условий контракта: увеличение цены контракта, изменение срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

⁷⁵ Письма Минфина России № 24-03-08/96973 от 06.11.2020, № 24-03-07/63253 от 19.08.2019.

Сведения об изменении условий контрактов и обеспечении исполнения контрактов, предоставленном при заключении контрактов и в ходе их исполнения, приведены в приложении № 5; сведения о предоставленном обеспечении гарантийных обязательств приведены в приложении № 6.

В соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями, предусмотренными извещениями об осуществлении закупок, заключенными контрактами, участниками закупок при заключении контрактов предоставлено соответствующее обеспечение исполнения контрактов либо информация в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, содержащаяся в реестре контрактов ЕИС и подтверждающая исполнение участником закупки (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

В ходе исполнения контрактов в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями предусматривалось увеличение цены контрактов:

дополнительным соглашением № 3 от 10.03.2025 к государственному контракту № 1145 от 25.03.2024 (реестровый № 2470312595624000014) (далее – контракт № 2470312595624000014);

дополнительным соглашением № 6 от 14.03.2025 к государственному контракту № 116843 от 01.04.2024 (реестровый № 2470312595624000016) (далее – контракт № 2470312595624000016);

дополнительным соглашением № 2 от 17.03.2025 к государственному контракту № 123418 от 18.04.2024 (реестровый № 2470312595624000021) (далее – контракт № 2470312595624000021);

дополнительным соглашением № 4 от 26.05.2025 к государственному контракту № 126650 от 27.05.2024 (реестровый № 2470312595624000030) (далее – контракт № 2470312595624000030);

дополнительными соглашениями № 1 от 21.06.2024, № 3 от 10.09.2024 к государственному контракту № 124048 от 04.06.2024 (реестровый № 2470312595624000037) (далее – контракт № 2470312595624000037);
дополнительным соглашением № 3 от 10.09.2024 продлен также срок исполнения контракта;

дополнительным соглашением № 4 от 19.06.2025 к государственному контракту № 6527 от 15.10.2024 (реестровый № 2470312595624000084⁷⁶) (далее – контракт № 2470312595624000084);

дополнительным соглашением № 1 от 18.12.2024 к государственному контракту № 141587 от 08.11.2024 (реестровый № 2470312595624000093) (далее – контракт № 2470312595624000093);

дополнительным соглашением № 1 от 05.12.2024 к государственному контракту № 141172 от 29.11.2024 (реестровый № 2470312595624000101) (далее – контракт № 2470312595624000101).

⁷⁶ Здесь и далее изменения указаны на дату проверки (контракт на дату проверки в стадии исполнения).

Согласно части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных указанной частью статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Следует отметить, что в дополнительных соглашениях к вышеуказанным контрактам основание для внесения в контракты изменений (соответствующий пункт части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ) не указано.

Согласно информации, размещенной в реестре контрактов ЕИС, изменения в контракты в части увеличения цены внесены на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, положениями которого предусмотрена в том числе возможность увеличения цены контракта не более чем на 10% пропорционально дополнительному количеству товара, объему работы или услуги при увеличении предусмотренного контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на 10%.

Изменения в части увеличения цены контракта внесены в вышеуказанные контракты в пределах 10% цены контракта (по контракту № 2470312595624000084 на момент проверки).

В нарушение пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением № 1 от 05.12.2024 к контракту **№ 2470312595624000101** объем услуг по предоставлению лицензий на право использования сертифицированной системы управления базами данных и сертифицированной операционной системы, предусмотренный контрактом, увеличен на 21,7%, т.е. более чем на 10% (с 106 до 129 усл. ед., в том числе лицензий на право использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» - в 2,6 раза, с 11 до 29 усл. ед.) при увеличении цены контракта на 9,9%.

Контрактом **№ 2470312595624000037** (в первоначальной редакции) предусмотрена поставка оборудования (серверы) для расширения технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области в количестве 30 ед., срок поставки товара - в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта, т.е. не позднее 07.06.2024 (пункт 3.1 контракта, сформированного без использования ЕИС).

Поставка оборудования в полном объеме осуществлена поставщиком 08.06.2024, поставленное оборудование принято заказчиком 11.06.2024 по документу о приемке № 176 от 07.06.2024.

В соответствии с пунктом 2.7 контракта заказчику надлежало не позднее 21.06.2024 произвести оплату поставленного оборудования на основании документа о приемке № 176 от 07.06.2024.

Вместо оплаты товара в установленный контрактом срок (21.06.2024) сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2024 к контракту, согласно которому количество поставляемого оборудования увеличено на 2 ед. при увеличении цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара.

Следует отметить, что на дату заключения дополнительного соглашения № 1 обязательства по поставке товара, предусмотренные первоначальной

редакцией контракта, исполнены поставщиком в полном объеме и приняты заказчиком на основании документа о приемке № 176 от 07.06.2024. При этом оплата поставленного товара произведена с нарушением установленного срока (платежным поручением № 598731 от 27.06.2024).

10.09.2024 сторонами заключено дополнительное соглашение № 3, предусматривающее увеличение количества поставляемого оборудования еще на 1 ед. Кроме того, дополнительным соглашением № 3 внесены изменения в пункт 4.1 электронного контракта в части продления срока исполнения контракта с 28.06.2024 по 31.12.2024.

На дату заключения дополнительного соглашения № 3 обязательства по поставке дополнительного количества оборудования (2 ед.) в соответствии с изменениями, внесенными в контракт дополнительным соглашением № 1 от 21.06.2024, исполнены поставщиком в полном объеме, заказчиком осуществлена 26.06.2024 приемка и 27.06.2024 оплата поставленного оборудования (документ о приемке № 184 от 26.06.2024, платежные поручения №№ 598731, 598788 от 27.06.2024).

Таким образом, дополнительное соглашение № 3 от 10.09.2024 заключено после истечения установленного контрактом срока исполнения поставщиком обязательства по поставке товара (07.06.2024) и срока исполнения контракта (28.06.2024), т.е. фактически через 2 месяца после исполнения сторонами обязательств по поставке и оплате товара.

Следует также отметить, что поэтапная либо частичная поставка и приемка товара контрактом не предусмотрены.

Вследствие заключения дополнительных соглашений к контракту после истечения срока исполнения обязательства по поставке товара и исполнения таких обязательств в полном объеме, поставка дополнительного количества товара в соответствии с дополнительными соглашениями № 1 от 21.06.2024 и № 3 от 10.09.2024 фактически осуществлена с нарушением срока поставки товара, установленного пунктом 3.1 контракта (в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта) и являющегося существенным условием контракта⁷⁷.

В силу пункта 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта допускается в случае их изменения по соглашению сторон при исполнении контракта в случаях, установленных указанной частью статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

⁷⁷ Частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность продления срока исполнения контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (пункты 8, 9 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ), контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в определенных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях (пункт 10 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ), а также в случае изменения срока исполнения отдельного этапа (этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении (пункт 12 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

В связи с тем, что обязательства по поставке товара были исполнены в полном объеме, заказчику надлежало в установленный контрактом срок (21.06.2024) произвести оплату поставленного товара, направить поставщику требования об уплате неустоек и провести процедуру списания начисленных и неуплаченных неустоек в установленном порядке, после чего, в силу пункта 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства по контракту могли считаться выполненными (прекращенными).

Учитывая вышеизложенное, дополнительные соглашения № 1 от 21.06.2024 и № 3 от 10.09.2024 к контракту № 2470312595624000037 заключены с нарушением части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ; дополнительным соглашением № 3 от 10.09.2024 также продлен срок исполнения контракта в отсутствие правовых оснований для его изменения.

Аналогично дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2024 к контракту № 2470312595624000093 заключено с нарушением части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно, после исполнения сторонами в полном объеме обязательств по поставке и оплате товара, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 3.1 контракта № 2470312595624000093, заключенного без использования ЕИС, поставка товара осуществляется в течение 7 рабочих дней по заявке заказчика. При этом срок, в течение которого заказчик должен направить поставщику заявку, контрактом не установлен, возможность частичной поставки (по заявке) и приемки товара не предусмотрена.

В соответствии с заявкой заказчика № 01-03/3711-2024 от 29.11.2024 поставка товара в полном объеме осуществлена поставщиком 06.12.2024, поставленный товар принят заказчиком 10.12.2024 по документу о приемке № 399 от 06.12.2024 и оплачен 12.12.2024 (платежное поручение № 44450 от 12.12.2024).

18.12.2024, т.е. после исполнения сторонами обязательств в полном объеме, заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту, предусматривающее увеличение количества поставляемого товара при увеличении цены контракта пропорционально дополнительному количеству.

Поставка дополнительного количества товара в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 18.12.2024 к контракту осуществлена 23.12.2024 (документ о приемке № 419 от 23.12.2024) по заявке заказчика № 01-03/3711-2024 от 29.11.2024, т.е. фактически с нарушением установленного пунктом 3.1 контракта срока исполнения обязательств по поставке товара.

Обеспечение исполнения контракта, предоставленное соответственно при заключении и исполнении контрактов №№ 2470312595624000014, 2470312595624000016, 2470312595624000030, 2470312595624000037, 2470312595624000093, обеспечивает предусмотренные контрактами обязательства в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ (приложение № 5).

1. В соответствии с пунктом 1.1 контракта № 2470312595624000021 предметом контракта является оказание услуг по сопровождению регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения Ленинградской области.

Согласно Расчету цены контракта (приложение № 3 к контракту), информации о заключенном контракте, размещенной в реестре контрактов ЕИС, объем оказываемых по контракту услуг составляет 12 месяцев. В соответствии с пунктом 2.3 контракта исполнитель оказывает услуги поэтапно в течение 12 месяцев с даты заключения контракта.

В связи с увеличением в ходе исполнения контракта объема оказываемых услуг (с 12 до 13 месяцев) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 17.03.2025 пункт 2.3 контракта изложен в новой редакции, согласно которой срок оказания услуг продлен до 13 месяцев, т.е. срок окончания оказания услуг фактически продлен с 18.04.2025 по 18.05.2025.

Согласно информации и документам, представленным ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства», для целей обеспечения исполнения контракта № 2470312595624000021 исполнителем при заключении контракта предоставлена независимая гарантия № LM2603240990 от 16.04.2024 со сроком действия по 06.06.2025.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Как следует из положений части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде независимой гарантии, должно обеспечивать все обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках исполнения контракта, в том числе связанные с увеличением срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно информации и документам, представленным ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства», в ходе исполнения контракта № 2470312595624000021 новое обеспечение исполнения контракта (путем внесения изменений в условия независимой гарантии № LM2603240990 либо предоставления новой независимой гарантии) исполнителем не предоставлялось.

С учетом продления срока оказания услуг по контракту срок окончания действия независимой гарантии, предоставленной в целях обеспечения исполнения контракта, должен быть в соответствии с требованиями части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.9 контракта не ранее 18.06.2025.

Таким образом, в период исполнения контракта с 17.03.2025 (даты заключения дополнительного соглашения) предоставленное обеспечение исполнения контракта не соответствовало требованиям части 3 статьи 96

Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.9 контракта, так как срок действия независимой гарантии № LM2603240990 менее срока, предусмотренного требованиями указанной части статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Действующая независимая гарантия не обеспечивала обязательства исполнителя, предусмотренные контрактом, в период после 06.06.2025.

Дополнительное соглашение № 2 от 17.03.2025 к контракту № 2470312595624000021 заключено с **нарушением** требований части 1.3 статьи 95, части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда продление срока оказания услуг по контракту влечет возникновение обязательств исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением (в период с 06.06.2025 по 18.06.2025), обеспечение исполнения контракта с новым сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

В связи с оказанием исполнителем услуг по 6 этапу исполнения контракта (отчетный период с 19.02.2025 по 18.05.2025) не в полном объеме заказчиком направлен исполнителю мотивированный отказ № 01-03/1014-2025 от 17.06.2025 от приемки услуг по 6 этапу исполнения контракта.

Следует отметить, на дату направления заказчиком мотивированного отказа срок действия независимой гарантии № LM2603240990 (с даты выдачи по 06.06.2025), предоставленной в целях обеспечения исполнения контракта, уже истек.

Согласно размещенным в ЕИС документу о приемке № 197 от 18.06.2025 и техническому акту № 6 от 14.07.2025 о приемке результатов оказания услуг по 6 этапу исполнения контракта, составленному и подписанному членами приемочной комиссии, услуги по 6 этапу исполнения контракта фактически оказаны исполнителем в полном объеме 18.06.2025 и приняты заказчиком 14.07.2025 (документ о приемке подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика).

В связи с **просрочкой оказания услуг** по 6 этапу исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта (новая независимая гарантия или изменения к ранее предоставленной независимой гарантии) со сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.9 контракта, заказчиком **не истребовано**, надлежащее обеспечение обязательств на весь период исполнения контракта **не обеспечено**.

Исходя из установленного заказчиком в мотивированном отказе № 01-03/1014-2025 от 17.06.2025 срока устранения исполнителем замечаний к комплекту отчетной документации (не позднее 20.06.2025), в целях надлежащего обеспечения обязательств по контракту срок действия независимой гарантии в соответствии с требованиями части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ должен оканчиваться не ранее 20.07.2025.

Таким образом, в период исполнения контракта с 06.06.2025 по 20.07.2025 обязательства исполнителя, предусмотренные контрактом, не были обеспечены предоставленным обеспечением исполнения контракта.

Следует отметить, что условиями контракта № 2470312595624000021 обязанность исполнителя в случае просрочки исполнения обязательств по контракту предоставить до окончания срока действия обеспечения исполнения контракта новое обеспечение со сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.9 контракта, не предусмотрена.

2. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 05.12.2024 к контракту № 2470312595624000101 при увеличении объема услуг по контракту цена контракта увеличена до 21 985,9 тыс. руб. или на 1 994,4 тыс. руб. относительно первоначальной цены.

С учетом увеличения цены контракта стоимость неисполненных обязательств, подлежащих исполнению на дату заключения дополнительного соглашения № 1 от 05.12.2024, составила 21 985,9 тыс. руб. (согласно данным ЕИС, по состоянию на 05.12.2024 исполнение обязательств по контракту отсутствовало, сумма исполненных обязательств 0,0 тыс. руб.).

Согласно информации и документам, представленным ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства», обеспечение исполнения контракта предоставлено при заключении контракта путем внесения денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику (предоставлена копия платежного поручения № 39 от 20.11.2024 о перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта в сумме 1 999,2 тыс. руб.).

Обеспечение исполнения контракта на сумму 1 999,2 тыс. руб., предоставленное при заключении контракта, обеспечивает обязательства, предусмотренные контрактом, на общую сумму 19 991,6 тыс. руб.

Таким образом, увеличение цены контракта повлекло возникновение новых обязательств на сумму 1 994,4 тыс. руб., не обеспеченных ранее предоставленным при заключении контракта обеспечением исполнения контракта.

В соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменения существенных условий контракта при его исполнении, предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

При этом, если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) (пункт 4 части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

Согласно информации и документам, представленным ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства», обеспечение исполнения контракта, предусмотренное требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения № 1 от 05.12.2024 к контракту № 2470312595624000101 не предоставлено.

Таким образом, дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2024 к контракту № 2470312595624000101 заключено **с нарушением** требований части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда изменение цены контракта влечет возникновение новых обязательств исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта, предусмотренное требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

Следует отметить, что изменения в контракт № 2470312595624000101 в части увеличения размера обеспечения исполнения контракта при увеличении его цены дополнительным соглашением также не внесены.

3. В случае заключения дополнительного соглашения № 4 от 19.06.2025 к контракту № **2470312595624000084** изменения в части увеличения цены контракта на сумму 204 тыс. руб. не повлекли возникновение новых обязательств исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным при заключении контракта обеспечением исполнения контракта, и, соответственно, предоставления нового обеспечения, предусмотренного частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, не требовали. Согласно данным ЕИС, на дату заключения дополнительного соглашения (19.06.2025) по контракту исполнены обязательства на сумму 17 834,4 тыс. руб., стоимость неисполненных обязательств составила 20 078,4 тыс. руб.

Независимая гарантия № 11Ю-С-003616/24 от 09.10.2024 на сумму 3 770,9 тыс. руб., предоставленная при заключении контракта, обеспечивает обязательства, предусмотренные контрактом, на общую сумму 37 708,8 тыс. руб.

Согласно информации и документам, представленным ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства», в ходе исполнения контракта исполнителем в дополнение к независимой гарантии № 11Ю-С-003616/24 внесены денежные средства на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в сумме 20,4 тыс. руб. (предоставлена копия платежного поручения № 881 от 19.06.2025).

Следует отметить, если вносимые в контракт изменения требуют предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ и исполнение контракта обеспечивается независимой гарантией, новое обеспечение в соответствии с

требованиями пунктов 2, 3 части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предоставляется путем внесения изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии либо путем предоставления новой независимой гарантии на полную сумму обеспечения.

Обеспечение исполнения контракта одновременно (частично) независимой гарантией и внесением денежных средств положениями Федерального закона № 44-ФЗ не предусмотрено.

Таким образом, обеспечение исполнения контракта на сумму 20,4 тыс. руб. при заключении дополнительного соглашения № 4 от 19.06.2025 к контракту № 2470312595624000084 предоставлено **с нарушением** требований пунктов 2, 3 части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. Согласно письму ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» исх. № 01-03/2525-2025 от 09.12.2025 механизм взыскания неустоек (штрафов, пеней) из обеспечения исполнения контрактов, предоставленного заказчику, в рассматриваемом периоде не применялся.

В контрактах **№№ 2470312595624000037, 2470312595624000093**, являющихся предметом проверки и анализа в ходе настоящего ЭАМ, заказчиком в соответствии с частью 2.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ установлено требование об **обеспечении гарантийных обязательств**, предусмотренных контрактами, размер предоставляемого поставщиками обеспечения гарантийных обязательств, порядок его предоставления, требования к такому обеспечению. На дату проверки исполнение контрактов завершено, поставщиками предоставлено обеспечение гарантийных обязательств.

В целях обеспечения гарантийных обязательств по контракту **№ 2470312595624000037** поставщиком предоставлена независимая гарантия № 7M-551GHBV-940 от 07.06.2024 со сроком действия по 14.07.2027.

В соответствии с заключенными к контракту дополнительными соглашениями № 1 от 21.06.2024 и № 3 от 10.09.2024 количество поставляемого по контракту оборудования увеличено соответственно на 2 ед. и 1 ед. при увеличении цены контракта (пропорционально дополнительному количеству товара) на 10%.

Приемка дополнительно поставленного оборудования осуществлена заказчиком 26.06.2024 и 19.09.2024 (документы о приемке № 184 от 26.06.2024, № 290 от 18.09.2024 подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика).

Согласно пункту 5.4 контракта, сформированного без использования ЕИС, разделу 5 Описания объекта закупки (приложение № 1 к контракту) гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет не менее 36 месяцев (срок официальной гарантии производителя); поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока (пункт 5.3 Описания объекта закупки).

Таким образом, гарантийный срок на дополнительно поставленное оборудование длится не ранее, чем по 19.09.2027.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Вместе с тем предоставленное обеспечение гарантийных обязательств не соответствует требованиям к сроку его действия, установленным частью 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок действия независимой гарантии № 7М-551ГНВУ-940, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств по контракту № 2470312595624000037 (14.07.2027), менее срока, предусмотренного требованиями части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (должен быть, с учетом гарантийного срока на дополнительно поставленное оборудование, не ранее 19.10.2027). Независимая гарантия № 7М-551ГНВУ-940 не обеспечивает гарантийные обязательства на весь период гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

Таким образом, заказчиком **в нарушение** части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ для целей обеспечения гарантийных обязательств по контракту № 2470312595624000037 принята независимая гарантия, срок действия которой не соответствует требованиям указанной части статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

Контрактами №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093 предусмотрены положения в соответствии с частью 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ об оформлении документа о приемке после предоставления соответствующего обеспечения гарантийных обязательств (пункты 3.7, 7.13 контракта № 2470312595624000037, пункты 3.6, 7.13 контракта № 2470312595624000093).

Вместе с тем **в нарушение** части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ срок предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств контрактами №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093 не установлен.

В ходе проверки *соблюдения иных требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (на выборочной основе)* при исполнении контрактов установлено следующее.

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия».

1. Контракт № 2470315158624000003 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Особняк Я.Я. Пантелеева», в составе: 1. Главный дом (1863-1871), 2. Флигель (1863-1871), расположенного по адресу Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 6, д. 8, цена контракта 37 548,6 тыс. руб.

1.1. Срок выполнения работ в соответствии с пунктом 1.4 контракта № 2470315158624000003 установлен с даты заключения контракта по 11.04.2025 (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 21.11.2024); при этом в срок выполнения работ включается окончательная приемка результата выполненных работ в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы по контракту выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (согласно приложению № 1 к контракту), Расчетом цены контракта (согласно приложению № 2), календарным планом выполнения работ (согласно приложению № 3) (пункт 1.2 контракта). Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с заказчиком график производства работ с указанием сроков их выполнения (пункт 14 Описания объекта закупки).

Разделом 4 контракта «Порядок сдачи-приемки работ» предусмотрена промежуточная (при промежуточном выполнении работ) и окончательная (при выполнении работ в полном объеме) приемка работ по контракту.

В соответствии с пунктом 4.1 контракта подрядчик при выполнении работ в полном объеме формирует документ о приемке с использованием ЕИС не позднее 3 календарных дней с даты окончания срока выполнения работ по контракту, установленного в пункте 1.4 контракта, т.е. не позднее 14.04.2025.

Одновременно подрядчик предоставляет комплект отчетной документации в составе и объеме, предусмотренном пунктом 15 Описания объекта закупки (пункт 4.3 контракта), с сопроводительным письмом (пункт 15 Описания объекта закупки).

Документ об окончательной приемке работ по контракту № 2470315158624000003 сформирован подрядчиком с использованием ЕИС, подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещен в ЕИС 07.05.2025. Согласно документу (акту) о приемке выполненных работ № 6 от 07.05.2025 работы выполнены в полном объеме; дата сдачи работ - 07.05.2025.

Заказчиком 20.05.2025 направлен мотивированный отказ от подписания документа о приемке № 6 от 07.05.2025, согласно которому подрядчиком в нарушение пункта 4.3 контракта комплект отчетной документации представлен не в полном объеме.

По запросу КСП ЛО ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» письмом исх. № 813 от 10.10.2025 представлены пояснения по факту выполнения подрядчиком работ по контракту с направлением копии сопроводительного письма подрядчика к комплекту отчетной документации (исх. № 38 от 11.04.2025), представленной заказчику

при окончательной приемке работ по контракту (вх. № 517 от 11.04.2025 в ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»), актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 11.04.2025, акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия № 05-23/25-9 от 11.04.2025, соответствующих сроку окончания выполнения работ, установленному контрактом.

Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» мотивированный отказ от подписания документа о приемке направлен заказчиком в связи с недостатками комплекта отчетной документации (отсутствие электронной версии документов, ее несоответствие бумажному комплекту), которые были устранены подрядчиком (представлена копия письма подрядчика исх. № 56 от 30.05.2025); документ об окончательной приемке работ по контракту повторно размещен подрядчиком в ЕИС 30.05.2025.

Заказчиком 03.06.2025 осуществлена окончательная приемка выполненных работ по контракту (документ о приемке подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика).

Учитывая изложенное, документ об окончательной приемке работ по контракту № 2470315158624000003 сформирован подрядчиком и размещен в ЕИС 07.05.2025 с нарушением срока, установленного пунктом 4.1 контракта (не позднее 14.04.2025).

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 6 Правил определения размера штрафа, пунктом 7.3 контракта № 2470315158624000003 установлена ответственность подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

На дату проверки информация и документы о применении ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» по контракту № 2470315158624000003 мер ответственности к подрядчику в связи с нарушением им условий контракта в реестре контрактов ЕИС не размещены.

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.3 контракта № 2470315158624000003 меры ответственности к подрядчику в виде штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательства, предусмотренного пунктом 4.1 контракта, по формированию и размещению в ЕИС документа о приемке не применены.

1.2. В соответствии с пунктом 6.7 контракта № 2470315158624000003 в случае невыполнения работ по контракту в указанный в контракте срок подрядчик обязуется за две недели до окончания срока действия обеспечения исполнения контракта переоформить его на срок, превышающий не менее чем

на один месяц срок, указанный в заключении заказчика об отказе в приемке выполненных работ по контракту.

Следует отметить, что на дату направления заказчиком (20.05.2025) мотивированного отказа от подписания документа о приемке № 6 от 07.05.2025 срок действия независимой гарантии № M00-24-22482/EG, предоставленной в целях обеспечения исполнения контракта, уже истек (срок действия – с даты выдачи по 13.05.2025).

Таким образом, в период исполнения контракта после истечения срока исполнения обязательств, установленного пунктом 1.4 контракта, а именно, с 14.04.2025 по 07.05.2025 и с 20.05.2025 по 30.05.2025 обеспечение исполнения контракта не соответствовало требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчиком **в нарушение** пункта 6.7 контракта срок для устранения выявленных при приемке нарушений в мотивированном отказе от подписания документа о приемке не указан, а также не обеспечено предоставление подрядчиком надлежащего обеспечения исполнения контракта со сроком действия, соответствующим сроку, установленному в соответствии с требованиями части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, на весь период исполнения контракта.

Таким образом, контроль за исполнением пункта 6.7 контракта № 2470315158624000003 с целью своевременного продления подрядчиком срока действия независимой гарантии заказчиком не осуществлялся.

2. В связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств по **контрактам №№ 2470315158624000002, 2470315158624000004** ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» направлены в адрес подрядчика требование № 999 от 27.12.2024 об оплате пеней за нарушение обязательств по контракту № 2470315158624000002, требование № 60 от 30.01.2025 об оплате пеней за нарушение обязательств по контракту № 2470315158624000004, согласно которым подрядчику требуется оплатить стоимость штрафных санкций с представлением копии платежного поручения о произведенной оплате.

Размер начисленной пени по контракту № 2470315158624000002 составил 181,7 тыс. руб. (0,7% от цены контракта), по контракту № 2470315158624000004 – 61,5 тыс. руб. (0,2% от цены контракта).

По факту выполнения работ по контрактам 06.02.2025 между заказчиком и подрядчиком заключены соглашения о расторжении контрактов №№ 2470315158624000002, 2470315158624000004, согласно которым работы выполнены подрядчиком в полном объеме и оплачены заказчиком, стороны не имеют друг к другу претензий в связи с расторжением контрактов.

Согласно пункту 2 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней)⁷⁸ списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)

⁷⁸ Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 (далее – Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней)).

осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в порядке, установленном указанными Правилами.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов в реестр контрактов ЕИС подлежат включению в том числе информация и документы о размере списанной заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени), документ, подтверждающий списание неустойки, в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, реквизиты такого документа.

На дату проверки информация и документы об уплате подрядчиком начисленных по контрактам №№ 2470315158624000002, 2470315158624000004 неустоек (пеней) либо о списании заказчиком начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) по указанным контрактам в реестре контрактов ЕИС не размещены.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» исх. № 813 от 10.10.2025 уплата подрядчиком начисленных неустоек (пеней) по контрактам не производилась, списание начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) заказчиком не осуществлялось. Заказчиком запрошены лимиты бюджетных обязательств для оплаты государственной пошлины при обращении в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в целях дальнейшего взыскания сумм неустоек (пеней) в судебном порядке.

Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», а также информации, представленной комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области (письмо исх. № 01-06-10742/2025-0-1 от 10.12.2025), полномочия администратора доходов областного бюджета Ленинградской области, в том числе при начислении ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным учреждением, осуществляет комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области (далее также – Комитет), исполняющий в отношении учреждения функции учредителя.

Регламентом реализации полномочий комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням, штрафам по ним, утвержденным распоряжением Комитета от 02.10.2023 № 01-04/23-184 (с изменениями), определено, что Комитет в отношении учреждения осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в областной бюджет Ленинградской области, пеней, штрафов по ним

с последующим уведомлением учреждения о фактическом зачислении и погашении платежей в областной бюджет Ленинградской области.

Согласно Правилам списания сумм неустоек (штрафов, пеней) списание начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) в случаях и порядке, установленными указанными Правилами, является обязанностью заказчика.

В соответствии с пунктом 6 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае если заказчик не осуществляет полномочия администратора доходов бюджета, полученных в результате применения мер гражданско-правовой ответственности по контракту в части образовавшейся начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), информация о зачислении уплаченных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сумм неустоек (штрафов, пеней) направляется заказчику администратором доходов бюджета, наделенным соответствующими полномочиями, в порядке, установленном правовым актом соответствующего главного администратора доходов бюджета.

Согласно пункту 12 вышеуказанных Правил заказчик, не осуществляющий полномочия администратора доходов бюджета, полученных в результате применения мер гражданско-правовой ответственности по контракту в части образовавшейся начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), не позднее 3 рабочих дней после осуществления списания начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) направляет администратору доходов бюджета, указанному в пункте 6 Правил, информацию о произведенном списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) с указанием списанной суммы неустоек (штрафов, пеней) и кода классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» **в нарушение** Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней) обязанность по списанию начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) в рассматриваемом периоде не исполнялась.

Порядок взаимодействия заказчика с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области как администратором доходов бюджета по вопросу начисления, списания начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», правовым актом ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» не определен.

3. В соответствии с пунктом 3.4.3 контракта № 2470315158624000012 оплата принятых работ по контракту производится в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

Оплата выполненных работ по актам о приемке работ № 2 от 11.07.2025, № 3 от 08.08.2025, подписанным заказчиком 31.07.2025 и 18.08.2025, произведена соответственно платежными поручениями № 718634 от 28.08.2025 и № 755555 от 12.09.2025, т.е. **с нарушением** срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктами 3.4.3 контрактов, на 13 и 12 рабочих дней соответственно.

Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», представленным письмом исх. № 813 от 10.10.2025, исполнение контракта № 2470315158624000012 осуществляется в рамках отраслевого проекта «Развитие имущественного комплекса музеев» в 2025 году в том числе за счет средств федерального бюджета. Платежи в системе АЦК «Финансы» были отклонены по причине отсутствия свободного остатка предельных объемов финансирования и направлены получателю после информирования о наличии свободного остатка.

4. Согласно информации и документам, размещенным в реестре контрактов ЕИС, обязательства по выполнению работ, предусмотренные **контрактами №№ 2470315158624000003, 2470315158624000002, 2470315158624000004**, подрядчиками исполнены, заказчиком осуществлена окончательная приемка и оплата выполненных работ.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов в реестр контрактов ЕИС подлежит включению в том числе информация о прекращении обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспеченных независимой гарантией, и дата такого прекращения.

Информация об исполнении контрактов №№ 2470315158624000003, 2470315158624000002, 2470315158624000004, размещенная в реестре контрактов ЕИС, не содержит информацию о прекращении обязательств подрядчиков, обеспеченных независимыми гарантиями, и о датах такого прекращения. Документы, подтверждающие размещение указанной информации, не представлены.

В нарушение подпункта «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов информация о прекращении обязательств подрядчика, обеспеченных независимой гарантией, и о дате такого прекращения по контрактам №№ 2470315158624000003, 2470315158624000002, 2470315158624000004 в реестре контрактов ЕИС заказчиком не размещена; документы, подтверждающие размещение информации, не представлены.

5. Согласно данным ЕИС дополнительное соглашение № 1 от 10.10.2024 к **контракту № 2470315158624000004** направлено заказчиком для включения в реестр контрактов ЕИС 18.10.2024 (размещено 21.10.2024), тогда как следовало направить в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее 17.10.2024.

Требование № 376 от 29.04.2025 о предоставлении обеспечения исполнения **контракта № 2470315158624000012** и начислении штрафных санкций, требование № 60 от 30.01.2025 об оплате пеней за нарушение обязательств по **контракту № 2470315158624000004** направлены для включения в реестр контрактов ЕИС соответственно 19.05.2025 (размещено 20.05.2025) и 07.02.2025 (размещено 12.02.2025), тогда как следовало направить в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов соответственно не позднее 12.05.2025 и 06.02.2025.

Таким образом, вышеуказанная информация и документы об изменении контракта № 2470315158624000004, о применении мер ответственности в

случае нарушения подрядчиками условий контрактов №№ 2470315158624000012, 2470315158624000004 направлены для включения в реестр контрактов ЕИС с нарушением срока, установленного соответственно частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов (от 1 до 5 рабочих дней).

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дирекция дорожного строительства».

1. Контракт № 2470606441224000074 на проведение работ по разработке проектной документации и выполнение работ по объекту: «Реконструкция моста через реку Михалевка на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском районе Ленинградской области», цена контракта 135 179,1 тыс. руб.

Согласно извещению об осуществлении закупки, пункту 4.2 электронного контракта № 2470606441224000074, пункту 3.1 контракта, сформированного без использования ЕИС, Графику выполнения работ (приложение № 3 к контракту) контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

В соответствии с пунктом 4.2 электронного контракта № 2470606441224000074, Графиком выполнения работ срок окончания выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) установлен 31.05.2025.

Контрактом предусмотрена приемка выполненных проектных работ в соответствии с Заданием на разработку проектной документации (приложение № 1 к Описанию объекта закупки), Графиком выполнения работ, порядок которой установлен в разделе 8.1 контракта.

Согласно пунктам 8.1.2, 8.1.4 контракта в течение 2 рабочих дней после выполнения проектных работ в полном объеме в соответствии с Графиком выполнения работ подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и не позднее срока выполнения работ, указанного в Графике выполнения работ, размещает в ЕИС документ о приемке.

На 21.10.2025⁷⁹ информация и документы об исполнении контракта № 2470606441224000074 в ЕИС не размещены, приемка работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) заказчиком не осуществлялась. Таким образом, просрочка выполнения подрядчиком работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) на 21.10.2025 составляет 143 дня.

Информация и документы о применении ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» мер ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000074 в связи с нарушением срока выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) на дату проверки в реестре контрактов ЕИС не размещены.

⁷⁹ На дату направления в адрес ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» информационного письма КСП ЛО исх. № 01-21-76/2025 от 21.10.2025 о выявленных в ходе ЭАМ нарушениях.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» исх. № 1971-14/2025 от 01.11.2025 претензионная работа в отношении подрядчика в связи с нарушением им условий контракта № 2470606441224000074 в период с 31.05.2025 и на дату проверки не проводилась.

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000074 в связи с нарушением срока выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) на дату проверки не применены.

Указанное нарушение **устранено** в ходе настоящего ЭАМ. В соответствии с письмом КСП ЛО (исх. № 01-21-76/2025 от 21.10.2025) ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в адрес подрядчика направлена претензия № 1956-14/2025 от 01.11.2025 с требованием об уплате нестойки (пени) на сумму 387,5 тыс. руб. по факту просрочки выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту).

2. Контракт № 2470606441224000028 на выполнение работ по объекту: *«Капитальный ремонт моста через реку Градуевка на автомобильной дороге «Зверево – Малиновка» в Выборгском районе Ленинградской области», цена контракта 26 473,3 тыс. руб.*

Контракт № 2470606441224000019 на выполнение работ по объекту: *«Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Бокситогорском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах». ЛОТ 2, а/д «Б. Двор – Пакшеево – Самойлово», цена контракта 38 828,5 тыс. руб.*

В соответствии с пунктом 2.1 контрактов №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019, Графиком выполнения строительно-монтажных работ на объекте (приложение № 3 к контрактам) срок выполнения работ по разработке рабочей документации по контракту № 2470606441224000028 установлен «не позднее 91 дня с момента заключения контракта» или не позднее 12.07.2024; сроки окончания выполнения работ по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 установлены соответственно 05.12.2024 и 31.07.2025.

Согласно документу о приемке выполненных работ № 1 от 30.08.2024 по контракту № 2470606441224000028, размещенному в ЕИС, работы по разработке рабочей документации сданы подрядчиком и приняты заказчиком 30.08.2024 (документ о приемке подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика).

Согласно документу о приемке выполненных работ № 3 от 23.12.2024 по контракту № 2470606441224000028, документу о приемке выполненных работ № 9 от 11.09.2025 по контракту № 2470606441224000019 выполненные в полном объеме работы по контрактам сданы подрядчиками соответственно 23.12.2024 и 11.09.2025.

Таким образом, исходя из информации, содержащейся в документах о приемке, размещенных подрядчиками в ЕИС соответственно 30.08.2024, 23.12.2024 и 11.09.2025, просрочка выполнения работ по разработке рабочей документации по контракту № 2470606441224000028 составила 49 дней, просрочка выполнения работ в полном объеме по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 составила соответственно 18 дней по контракту № 2470606441224000028 и 42 дня по контракту № 2470606441224000019.

На дату проверки информация и документы о применении ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 мер ответственности к подрядчикам в связи с просрочкой выполнения работ (в том числе по разработке рабочей документации по контракту № 2470606441224000028), в реестре контрактов ЕИС не размещены.

Согласно письму ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» исх. № 1971-14/2025 от 01.11.2025 претензионная работа в отношении подрядчиков в связи с нарушением ими условий контрактов №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 в период с 12.07.2024 (по контракту № 2470606441224000028), с 31.07.2025 (по контракту № 2470606441224000019) и на дату проверки не проводилась.

Таким образом, ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в **нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчикам по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 в связи с просрочкой выполнения работ по контрактам, в том числе работ по разработке рабочей документации по контракту № 2470606441224000028, на дату проверки не применены.

Нарушения **частично устранены** в ходе настоящего ЭАМ. В соответствии с письмом КСП ЛО (исх. № 01-21-76/2025 от 21.10.2025) ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в адрес подрядчиков по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 направлены соответственно претензия № ВН-809/2025-1 от 30.10.2025 с требованием об уплате неустойки (пени) на сумму 252,3 тыс. руб. (1% от цены контракта) по факту просрочки выполнения работ по контракту № 2470606441224000028 и претензия № 1950-14/2025 от 30.10.2025 с требованием об уплате неустойки (пени) на сумму 61,2 тыс. руб. (0,2% от цены контракта) по факту просрочки выполнения работ по контракту № 2470606441224000019.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000028 в связи с просрочкой выполнения работ по разработке рабочей документации по объекту ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» по состоянию на 19.11.2025 не применены. Сумма неустойки (пени) составляет (расчётно) 87,9 тыс. руб. (3 259,7 тыс. руб. x 49 x 16,5% x 1/300).

Следует отметить, что согласно пункту 2 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек

(штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5% цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в порядке, установленном указанными Правилами.

Информация и документы о списании заказчиком начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 по состоянию на 19.11.2025 в реестре контрактов ЕИС не размещены.

3. Согласно порядку сдачи и приемки выполненных работ, установленному разделом 8 контрактов №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019, заказчик после получения сообщения подрядчика о готовности к сдаче объекта в эксплуатацию в срок не позднее 10 дней создает приемочную комиссию (пункт 8.4 контрактов); приемка выполненных работ в полном объеме по контракту осуществляется приемочной комиссией в установленном порядке на основании документов, предусмотренных в главе 3 Описания объекта закупки (приложение № 1 к контрактам) (пункт 8.5 контрактов).

В соответствии с пунктом 1.3 раздела 3 «Порядок приемки работ» Описания объекта закупки, заказчик в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, подписывает документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС (либо формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке).

Документы об окончательной приемке работ по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 размещены подрядчиками в ЕИС соответственно 23.12.2024 и 11.09.2025.

В соответствии с пунктом 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается усиленными электронными подписями членов приемочной комиссии, после чего подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещается в ЕИС.

При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке без использования усиленных электронных подписей и ЕИС (подпункт «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов (подпункт «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

Документ о приемке выполненных работ № 3 от 23.12.2024 по контракту № 2470606441224000028, документ о приемке выполненных работ № 9 от 11.09.2025 по контракту № 2470606441224000019 подписаны соответственно 23.12.2024 и 25.09.2025 усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и не содержат усиленных электронных подписей членов приемочной комиссии.

Согласно распоряжениям ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» № 40-р от 19.12.2024 о назначении приемочной комиссии по контракту № 2470606441224000028, № 21-р от 16.07.2025 о назначении приемочной комиссии по контракту № 2470606441224000019 приемочные комиссии включают в том числе членов, не являющихся работниками заказчика.

В нарушение требований подпункта «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ акт № 3 от 23.12.2024 о приемке выполненных работ по форме КС-2, прилагаемый к электронному документу о приемке (в структурированной форме) № 3 от 23.12.2024 по контракту № 2470606441224000028, содержит подписи не всех членов приемочной комиссии; акт от 26.08.2025 о приемке выполненных работ по форме КС-2, прилагаемый к электронному документу о приемке (в структурированной форме) № 9 от 11.09.2025 по контракту № 2470606441224000019 подписей членов приемочной комиссии не содержит.

4. Согласно данным ЕИС, обязательства по выполнению работ, предусмотренные контрактами №№ 2470606441224000016, 2470606441224000019, 2470606441224000025, 2470606441224000029, 2470606441224000028, 2470606441224000050, исполнены, заказчиком осуществлена окончательная приемка и оплата выполненных работ.

В нарушение подпункта «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов информация об исполнении контрактов №№ 2470606441224000016, 2470606441224000019, 2470606441224000025, 2470606441224000029, 2470606441224000028, 2470606441224000050, размещенная в реестре контрактов ЕИС, не содержит информацию о прекращении обязательств подрядчика, обеспеченных независимой гарантией, и дату такого прекращения.

Представленные скриншоты страниц «личного кабинета» заказчика в ЕИС содержат соответственно информацию о применении мер ответственности по контракту № 2470606441224000016, о расторжении контрактов №№ 2470606441224000019, 2470606441224000025, 2470606441224000029, об оплате контрактов №№ 2470606441224000028, 2470606441224000050 и как таковую информацию о прекращении обязательств подрядчика, обеспеченных независимой гарантией, и дату такого прекращения не содержат.

5. Согласно документу о приемке выполненных работ № 4 от 04.04.2025 по контракту № 2470606441224000033, размещенному в ЕИС, 07.04.2025 заказчиком осуществлена приемка выполненных работ на сумму 7 312,3 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестр контрактов ЕИС включается информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о

стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта).

На дату проверки информация и документы об оплате выполненных работ, принятых по акту о приемке № 4 от 04.04.2025, в реестре контрактов ЕИС не размещены.

На запрос КСП ЛО ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» представлены копии платежных поручений №№ 322201, 322251 от 09.04.2025 об оплате выполненных работ, принятых по акту о приемке № 4 от 04.04.2025.

Согласно пояснениям ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства», представленным письмом исх. № 895-11/2025-1 от 28.10.2025, в связи с техническим сбоем информация об оплате не выгрузилась в ЕИС. В соответствии с письмом КСП ЛО исх. № 01-21-76/2025 от 21.10.2025 ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в ходе ЭАМ (28.10.2025) направлено обращение в службу поддержки «АЦК – Финансы» с целью размещения информации в реестре контрактов ЕИС.

Учитывая, что формирование информации об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по контрактам в настоящее время осуществляется в ЕИС автоматически, **надлежащий контроль** за выгрузкой и своевременным размещением указанных сведений в реестре контрактов ЕИС в целях соблюдения требований пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком **не осуществлялся**.

6. В соответствии с подпунктом «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов в реестр контрактов ЕИС подлежат включению в том числе информация и документы о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов информация о применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта направляется для включения в реестр контрактов ЕИС не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком документа, формируемого (составляемого) заказчиком и подлежащего включению в реестр, или за днем получения заказчиком информации или документа, формируемых (составляемых) иными лицами и подлежащих включению в реестр.

Согласно данным ЕИС уведомление № 6 от 07.04.2025 о списании начисленной и неуплаченной суммы неустойки (штрафа, пени) по контракту № 2470606441224000016 направлено заказчиком для включения в реестр контрактов ЕИС 15.04.2025 (размещено 16.04.2025), тогда как следовало направить в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов не позднее 14.04.2025.

Таким образом, информация и документы о списании начисленной и неуплаченной суммы неустойки (штрафа, пени) по контракту

№ 2470606441224000016 направлены для включения в реестр контрактов ЕИС с **нарушением** установленного срока на 1 рабочий день.

Согласно претензии № И-1996/2024 от 26.12.2024 по контракту № 2470606441224000016, размещенной в реестре контрактов ЕИС, претензия направлена взамен ранее направленной претензии № И-1630/2024 от 05.11.2024.

Претензия № И-1630/2024 от 05.11.2024 на дату проверки в реестре контрактов ЕИС не размещена, что свидетельствует о **нарушении** требований подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов.

Согласно «журналу событий» ЕИС информация по контракту № 2470606441224000016 в период с 03.10.2024 по 20.12.2024 в реестре контрактов ЕИС не размещалась, подтверждающие документы заказчиком не представлены.

В нарушение подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов информация и документы о применении мер ответственности к подрядчикам по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 (претензии № ВН-809/2025-1 и № 1950-14/2025 от 30.10.2025) по состоянию на 19.11.2025 в реестре контрактов ЕИС не размещены.

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор «электронного правительства».

1. Контракт № 2470312595624000084 на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Современное образование Ленинградской области», цена контракта 37 912,8 тыс. руб.

Согласно извещению об осуществлении закупки, пункту 4.2 электронного контракта № 2470312595624000084, пункту 2.3 контракта, сформированного без использования ЕИС, пункту 1.5 Описания объекта закупки (приложение № 1 к контракту), контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

Заказчиком 13.08.2025 приняты результаты оказания услуг по 3 этапу исполнения контракта (за отчетный период с 16.04.2025 по 15.07.2025) (документ о приемке № 43 от 15.07.2025 подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика).

Согласно размещенному в ЕИС техническому акту № 3 от 13.08.2025 о приемке результатов оказания услуг по 3 этапу исполнения контракта, составленному и подписанному членами приемочной комиссии, услуги оказаны не в полном соответствии с требованиями Описания объекта закупки, а именно, исполнителем с нарушением сроков выполнены заявки №№ 21063, 21067, 21145, 21198 и т.д.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

На дату проверки информация и документы о применении ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» мер ответственности к

исполнителю по контракту № 2470312595624000084 в связи с ненадлежащим исполнением им обязательств по 3 этапу исполнения контракта в реестре контрактов ЕИС не размещены.

Согласно письму ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» исх. № 01-03/2277-2025 от 14.11.2025 претензионная работа в отношении исполнителя в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 3 этапу исполнения контракта № 2470312595624000084 в период с 13.08.2025 и на дату проверки не проводилась.

Таким образом, ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» **в нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к исполнителю по контракту № 2470312595624000084 в связи с ненадлежащим исполнением им обязательств по 3 этапу исполнения контракта на дату проверки не применены.

Указанное нарушение **устранено** в ходе настоящего ЭАМ. В соответствии с письмом КСП ЛО (исх. № 01-21-96/2025 от 07.11.2025) ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» в адрес исполнителя направлено требование № 01-03/2244-2025 от 12.11.2025 об уплате неустойки (штрафа) на сумму 5 тыс. руб. (представлено письмом исх. № 01-03/2277-2025 от 14.11.2025).

2. Контракт № 2470312595624000037 на поставку серверов для расширения технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области, цена контракта 241 348,3 тыс. руб.

Предметом контракта является поставка оборудования (серверы) для расширения технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области (пункт 3 электронного контракта, пункт 1.1 контракта, сформированного без использования ЕИС).

В соответствии с пунктом 3.1 контракта срок поставки товара – в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта, т.е. не позднее 07.06.2024.

При поставке товара поставщик передает заказчику подтверждающие факт поставки документы, указанные в пункте 3.21 контракта (товарную накладную, (товарно-транспортную накладную) или универсальный передаточный документ).

Согласно представленной заказчиком копии товарно-транспортной накладной № 176 от 07.06.2024, а также прилагаемому к документу о приемке № 176 от 07.06.2024, размещенному в ЕИС, техническому акту № 5/124048 от 11.06.2024, составленному и подписанному членами приемочной комиссии, оборудование поставлено 08.06.2024, т.е. с нарушением срока, установленного пунктом 3.1 контракта, на 1 день.

В соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, заказчиком начисляется пеня.

Заказчиком направлено поставщику и размещено в реестре контрактов ЕИС требование об уплате неустойки (штрафа) № 01-03/1587-1-2024 от 24.06.2024.

В нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 6.2.2 контракта по факту просрочки исполнения поставщиком обязательства по поставке товара, предусмотренного контрактом № 2470312595624000037, заказчиком начислен штраф в размере 100 тыс. руб., а не пеня.

В соответствии с порядком расчета, установленным частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 6.2.2 контракта, на дату направления требования об уплате неустойки (24.06.2024) размер пени составляет (расчетно) 117 тыс. руб. (219 407,5 тыс. руб. x 1 x 16% x 1/300).

Таким образом, сумма предъявленной неустойки по контракту № 2470312595624000037 **занижена** на 17 тыс. руб.

3. Согласно извещению об осуществлении закупки, пункту 4.2 электронного контракта № 2470312595624000030, пунктам 2.3, 6.1, 6.3 контракта, сформированного без использования ЕИС, разделу 4 Описания объекта закупки (приложение № 1 к контракту) контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

В соответствии с пунктом 6.1 контракта исполнитель в течение 5 рабочих дней после окончания оказания услуг по каждому этапу представляет заказчику отчетные документы и направляет с использованием ЕИС документ о приемке оказанных услуг по этапу исполнения контракта. Приемка результатов оказания услуг по каждому этапу осуществляется приемочной комиссией в течение 15 рабочих дней со дня получения заказчиком документа о приемке (пункт 6.3 контракта).

С учетом изменений, внесенных в контракт № 2470312595624000030 дополнительным соглашением № 4 от 26.05.2025, продолжительность оказания услуг по контракту фактически продлена с 12 до 13 месяцев, в том числе продолжительность оказания услуг по 4 этапу исполнения контракта – с 3 до 4 месяцев (период оказания услуг с 27.02.2025 до 27.06.2025).

Исполнителем в нарушение пункта 6.1 контракта 27.05.2025, т.е. до оказания услуг в полном объеме по 4 этапу исполнения контракта, направлен заказчику с использованием ЕИС документ о приемке № 1 от 27.05.2025 по результатам оказания услуг за 3 месяца 4 этапа.

В нарушение пункта 6.3 контракта заказчиком 09.06.2025, т.е. до оказания исполнителем услуг в полном объеме по 4 этапу исполнения контракта, осуществлена частичная приемка оказанных услуг за 3 месяца 4 этапа (документ о приемке № 1 от 27.05.2025 подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика).

Приемка оказанных услуг за четвертый (последний) месяц этапа осуществлена заказчиком 16.07.2025 (документ о приемке № 2 от 27.06.2025 подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика).

Таким образом, приемка оказанных услуг по 4 этапу исполнения контракта № 2470312595624000030 осуществлена заказчиком **с нарушением**

порядка приемки, установленного в разделе 6 контракта, разделе 4 Описания объекта закупки.

4. Согласно прилагаемым к документам о приемке и размещенным в ЕИС техническим актам приемка поставленного товара по контрактам №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093, 2470312595624000101 осуществлена приемочной комиссией заказчика, образованной в соответствии с условиями контракта.

Документы о приемке по контрактам №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093, 2470312595624000101 подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и не содержат усиленных электронных подписей членов приемочной комиссии.

Прилагаемые к документам о приемке и размещенные в ЕИС технические акты о приемке поставленного товара по контрактам №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093, 2470312595624000101 составлены и подписаны членами приемочной комиссии также без использования усиленных электронных подписей.

Согласно распоряжениям ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» о создании приемочной комиссии для приемки поставленных товаров по указанным контрактам (распоряжения № 255 от 06.06.2024, № 605 от 02.12.2024, № 629 от 10.12.2024 представлены письмом исх. № 01-03/2277-2025 от 14.11.2025) приемочная комиссия не включает членов, которые не являются работниками заказчика.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ подписание документа о приемке допускается осуществлять без использования усиленных электронных подписей и ЕИС в случае, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика.

В нарушение подпункта «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, когда приемочная комиссия не включает членов, не являющихся работниками заказчика, документы о приемке по контрактам №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093, 2470312595624000101 не подписаны усиленными электронными подписями членов приемочной комиссии.

Согласно условиям контрактов №№ 2470312595624000016, 2470312595624000021, 2470312595624000084 приемка результатов оказания услуг, в том числе по этапам исполнения контрактов, осуществляется приемочной комиссией.

В нарушение подпункта «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ размещенные в ЕИС мотивированные отказы от приемки (подписания документов о приемке) результатов оказания услуг по соответствующим этапам исполнения контрактов не содержат подписей членов приемочной комиссии:

мотивированные отказы № 01-03/1183-2024 от 17.05.2024, № 01-03/1752-2024 от 08.07.2024, № 01-03/842-2025 от 23.05.2025 от подписания соответственно документа о приемке № 1 от 08.05.2024 по 1 этапу,

документа о приемке № 2 от 10.06.2024 по 2 этапу, документа о приемке № 6 от 13.05.2025 по 6 этапу исполнения контракта № 2470312595624000016;

мотивированные отказы № 01-03/1775-2024 от 10.07.2024, № 01-03/3425-2024 от 05.11.2024, № 01-03/3994-2024 от 26.12.2024 и № 01-03/68-2025 от 23.01.2025, № 01-03/1014-2025 от 17.06.2025 от подписания соответственно документа о приемке № 66 от 19.06.2024 по 1 этапу, документа о приемке № 253 от 21.10.2024 по 3 этапу, документов о приемке № 422 от 19.12.2024 и № 22 от 13.01.2025 по 4 этапу, документа о приемке № 197 от 19.05.2025 по 6 этапу исполнения контракта № 2470312595624000021;

мотивированный отказ № 01-03/205-2025 от 14.02.2025 от подписания документа о приемке № 1 от 17.01.2025 по 1 этапу исполнения контракта № 2470312595624000084.

5. В соответствии с пунктом 2.7 контракта № 2470312595624000037, пунктом 3.5 контракта № 2470312595624000016 расчеты между заказчиком и поставщиком (оплата за каждый этап оказания услуг) производятся не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа(ов) о приемке.

Оплата поставленного товара по контракту № 2470312595624000037 на основании документа о приемке № 176 от 07.06.2024, подписанного заказчиком 11.06.2024, произведена платежным поручением № 598731 от 27.06.2024, т.е. **с нарушением** срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 2.7 контракта, на 4 рабочих дня.

Оплата оказанных услуг по 3 этапу исполнения контракта № 2470312595624000016 на основании документа о приемке № 3 от 26.07.2024, подписанного заказчиком 16.08.2024, произведена платежным поручением № 753250 от 29.08.2024, т.е. **с нарушением** срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 3.5 контракта, на 2 рабочих дня.

6. В ходе проведения ЭАМ ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» представлены копии платежных поручений № 1673 от 19.12.2024, № 139 от 20.02.2025, № 725 от 22.08.2025 об уплате неустоек (пеней, штрафов) на общую сумму 716,5 тыс. руб. по контракту № 2470312595624000016.

В нарушение подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов информация и документы о размере уплаченных неустоек (штрафов, пеней) на сумму 616 тыс. руб., а также документы, подтверждающие уплату неустоек (платежные поручения № 1673 от 19.12.2024, № 139 от 20.02.2025), на дату проверки в реестре контрактов ЕИС не размещены.

Указанное **нарушение устранено** в ходе ЭАМ. В соответствии с письмом КСП ЛО исх. № 01-21-96/2025 от 07.11.2025 информация и документы о размере уплаченных неустоек (штрафов, пеней) по контракту № 2470312595624000016 размещены 14.11.2025 в реестре контрактов ЕИС.

Согласно размещенным в ЕИС требованиям об уплате неустоек (штрафов) **по контракту № 2470312595624000037** (требования № 01-03/1587-1-2024 от 24.06.2024, № 01-03/2720-2024 от 23.08.2024) по факту ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных

контрактом, заказчиком начислены штрафы, общая сумма которых составила 300 тыс. руб. или 0,14% от цены контракта.

Информация и документы об уплате поставщиком начисленных неустоек (штрафов) по контракту № 2470312595624000037 либо о списании начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов) на дату проверки в реестре контрактов ЕИС не размещены.

В соответствии с запросом КСП ЛО ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» письмом исх. № 01-03/2277-2025 от 14.11.2025 представлена информация об уплате поставщиком начисленной по контракту № 2470312595624000037 неустойки (штрафа) в соответствии с требованием № 01-03/2720-2024 от 23.08.2024 (копия платежного поручения № 894 от 28.08.2024) и списании начисленной и неуплаченной неустойки (штрафа) в соответствии с требованием № 01-03/1587-1-2024 от 24.06.2024 (копия уведомления о списании неустойки (штрафа) № 01-03/2379-2024 от 06.08.2024).

В нарушение подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов информация и документы о размере уплаченной неустойки (штрафа), о размере списанной неустойки (штрафа), документы, подтверждающие уплату и списание неустойки, по состоянию на 21.11.2025 в реестре контрактов ЕИС не размещены.

По контракту № 2470312595624000021 заказчиком начислены неустойки (пени) на общую сумму 582,5 тыс. руб. или 1,3% от цены контракта (требования № 01-03/3878-1-2024 от 16.12.2024 и № 01-03/1837-2025 от 29.09.2025).

Информация об уплате исполнителем начисленных неустоек (пеней) по контракту № 2470312595624000021 либо списании начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) на дату проверки в реестре контрактов ЕИС **не размещена**.

В соответствии с запросом КСП ЛО ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» письмом исх. № 01-03/2277-2025 от 14.11.2025 представлена информация о произведенном **в ходе ЭАМ списании** начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) по контракту № 2470312595624000021 (уведомление о списании неустойки № 01-03/2231-2025 от 11.11.2025); информация и документы о размере списанной неустойки 14.11.2025 размещены в реестре контрактов ЕИС.

В нарушение подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов информация и документы о применении мер ответственности к исполнителю по контракту № 2470312595624000084 в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 3 этапу исполнения контракта (требование № 01-03/2244-2025 от 12.11.2025 об уплате неустойки (штрафа), направленное в ходе проведения ЭАМ), по состоянию на 21.11.2025 в реестре контрактов ЕИС не размещены.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктом «а» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов в случае, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ документ о приемке подписан с использованием ЕИС, такой документ, а также информация, содержащаяся в

нем и подлежащая включению в реестр контрактов ЕИС, направляется с использованием ЕИС для включения в реестр контрактов ЕИС в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в день подписания документа о приемке.

Согласно данным ЕИС, документ о приемке № 11 от 26.06.2024 по 1 этапу исполнения контракта № **2470312595624000014**, документ о приемке № 176 от 07.06.2024 по контракту № **2470312595624000037** подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, соответственно 22.07.2024 и 11.06.2024, направлены для включения в реестр контрактов ЕИС и размещены 24.07.2024 и 13.06.2024, тогда как следовало направить в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктом «а» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов 22.07.2024 и 11.06.2024 соответственно.

Корректировочный документ № 2 от 09.07.2024 к документу о приемке № 1 от 11.06.2024 по контракту № **2470312595624000016**, корректировочный документ № 1 от 12.08.2025 к документу о приемке № 44 от 15.07.2025 по контракту № **2470312595624000084** подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, соответственно 09.07.2024 и 13.08.2025, направлены для включения в реестр контрактов ЕИС и размещены 16.07.2024 и 15.08.2025, тогда как следовало направить 09.07.2024 и 13.08.2025 соответственно.

Требования № 01-03/3878-1-2024 от 16.12.2024 и № 01-03/1837-2025 от 29.09.2025 об уплате неустойки (пени) по контракту № **2470312595624000021** направлены для включения в реестр контрактов ЕИС соответственно 24.12.2024 (размещено 25.12.2024) и 30.10.2025 (размещено 30.10.2025), тогда как следовало направить в соответствии с подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов не позднее 23.12.2024 и 06.10.2025 соответственно.

Требования № 01-03/590-2025 от 17.04.2025, № 01-03/1493-2025 от 13.08.2025 об уплате неустоек (штрафов) по контракту № **2470312595624000084** направлены для включения в реестр контрактов ЕИС соответственно 23.05.2025 (размещено 26.05.2025) и 25.08.2025 (размещено 26.08.2025), тогда как следовало направить соответственно не позднее 24.04.2025 и 20.08.2025.

Таким образом, вышеуказанная информация и документы о приемке поставленного товара (оказанной услуги), отдельных этапов исполнения контракта, а также применении мер ответственности в случае нарушения исполнителем условий контракта направлены для включения в реестр контрактов ЕИС **с нарушением** сроков, установленных соответственно частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктами «а» и «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов (от 1 до 18 рабочих дней).

7. Согласно данным ЕИС, обязательства по оказанию услуг (поставке товара), предусмотренные контрактами №№ **2470312595624000021**, **2470312595624000030**, **2470312595624000093**, **2470312595624000037**, исполнены; заказчиком осуществлена окончательная приемка и оплата оказанных услуг (поставленных товаров).

В нарушение подпункта «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов на дату проверки информация об исполнении контрактов №№ 2470312595624000021, 2470312595624000037, размещенная в реестре контрактов ЕИС, не содержит информацию о прекращении обязательств исполнителя (поставщика), обеспеченных независимой гарантией, и дату такого прекращения.

Указанные нарушения устранены в ходе настоящего ЭАМ. В соответствии с письмом КСП ЛО исх. № 01-21-96/2025 от 07.11.2025 информация о прекращении обязательств исполнителя (поставщика), обеспеченных независимой гарантией, по контрактам №№ 2470312595624000021, 2470312595624000037 размещена 19.11.2025 в реестре контрактов ЕИС⁸⁰.

По контрактам №№ 2470312595624000030, 2470312595624000093 в реестре контрактов ЕИС размещены соответственно справка № ОЭП-вн-1004/2025 от 25.07.2025 о прекращении обязательств по независимой гарантии № ЭГ-1430970/24 от 17.05.2024 и справка № ОЭП-вн-41/2025 от 23.01.2025 о прекращении обязательств по независимой гарантии № IGR24/NIBR/6208 от 05.11.2024, в которых указано об окончании срока действия независимых гарантий, выданных в целях обеспечения исполнения обязательств по указанным контрактам.

Вместе с тем справки **не содержат дату** прекращения обязательств исполнителя (поставщика), обеспеченных независимой гарантией.

В соответствии с абзацем 4 подпункта «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов информация, предусмотренная подпунктом «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, направляется заказчиком для включения в реестр контрактов ЕИС не позднее 5-го рабочего дня со дня, следующего за днем подписания заказчиком документа, формируемого (составляемого) заказчиком и подлежащего включению в реестр, или за днем получения заказчиком информации или документа, формируемых (составляемых) иными лицами и подлежащих включению в реестр.

Следует отметить, что в силу пункта 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Согласно позиции Минфина России⁸¹ обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспеченные независимой гарантией, могут считаться прекращенными после размещения им в ЕИС документа о приемке, который впоследствии подписан заказчиком; при этом датой прекращения таких обязательств считается дата передачи товара, окончания выполнения работ или оказания услуг, указанная в документе о приемке, формируемом поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

⁸⁰ Справка № ОЭП-вн-1712/2025 от 14.11.2025 о прекращении обязательств по независимой гарантии № LM2603240990 от 16.04.2024, справка № ОЭП-вн-1715/2025 от 14.11.2025 о прекращении обязательств по независимой гарантии № 9991-4R1/1625057 от 22.05.2024.

⁸¹ Письмо Минфина России № 24-06-06/127983 от 18.12.2024 по вопросу прекращения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, обеспеченных независимой гарантией.

Окончательная приемка оказанных услуг (поставленного товара) по контракту № 2470312595624000030 осуществлена заказчиком 16.07.2025 (документ о приемке № 2 от 27.06.2025 подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика), по контракту № 2470312595624000093 - 24.12.2024 (документ о приемке № 419 от 23.12.2024 подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика). Таким образом, исполнение обязательств, предусмотренных контрактами, подтверждается подписанными заказчиком и размещенными в ЕИС документами о приемке.

Информация о прекращении обязательств по независимой гарантии № ЭГ-1430970/24 от 17.05.2024 по контракту № 2470312595624000030⁸² направлена заказчиком для включения в реестр контрактов ЕИС 20.08.2025, размещена 22.08.2025, тогда как следовало направить, принимая во внимание позицию Минфина России по вопросу прекращения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспеченных независимой гарантией, не позднее 23.07.2025.

Информация о прекращении обязательств по независимой гарантии № IGR24/NIBR/6208 от 05.11.2024 по контракту № 2470312595624000093⁸³ направлена заказчиком для включения в реестр контрактов ЕИС 23.01.2025, размещена 28.01.2025, тогда как следовало направить не позднее 09.01.2025.

Таким образом, информация о прекращении обязательств исполнителя (поставщика), обеспеченных независимой гарантией, по контрактам №№ 2470312595624000030, 2470312595624000093 направлена заказчиком для включения в реестр контрактов ЕИС с **нарушением** срока, установленного абзацем 4 подпункта «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов, на 20 и 10 рабочих дней соответственно.

Таким образом, по результатам проверки и анализа соблюдения заказчиками требований Федерального закона № 44-ФЗ при **установлении** в 2024 году и истекшем периоде 2025 года в извещениях об осуществлении закупок, проектах контрактов и заключенных контрактах **требования обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств** (на выборочной основе) установлены следующие нарушения:

- при осуществлении закупки путем проведения конкурса или электронного аукциона в случае, когда расчеты по контракту не подлежат казначейскому сопровождению, требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта не установлено (нарушение части 1 статьи 96, части 64.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ);

- в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта и, соответственно, заключенном контракте обеспечение исполнения контракта установлено в размере, не соответствующем требованиям Федерального закона

⁸² Информация об исполнении контракта №24703125956240000300125 (19) от 22.08.2025 размещена в ЕИС.

⁸³ Информации об исполнении контракта № 24703125956240000930058 (11) от 17.03.2025 размещена в ЕИС.

№ 44-ФЗ (в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса, обеспечение установлено в размере менее аванса) (нарушение пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ);

- в извещении об осуществлении закупки порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению установлены ненадлежащим образом (нарушение пункта 17 части 1 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ);

- антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, применены заказчиком при проведении запроса котировок в электронной форме (обеспечение исполнения контракта установлено в контракте в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения, указанный в извещении об осуществлении закупки, не выплачен аванс поставщику (подрядчику) (нарушение частей 2, 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ);

- вследствие неправомерного применения антидемпинговых мер, предусмотренных частью 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчиком не исполнено обязательство по авансированию, предусмотренное контрактом (нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта);

- порядком оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результата) не установлен срок осуществления авансового платежа по контракту (нарушение пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

- в контракт, заключенный по результатам проведения электронного аукциона и предусматривающий авансирование, не включено обязательное условие о порядке оплаты товаров, работ, услуг с учетом положений части 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ (нарушение требований пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ);

- в контракт, заключенный по результатам проведения электронного аукциона, не включено условие, предусмотренное частью 6.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, о предоставлении участником закупки в случае демпинга цен обеспечения исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, т.е. применения антидемпинговых мер.

По результатам проверки, анализа и оценки **обеспечения исполнения контрактов, предоставленного** при заключении и в ходе исполнения контрактов, а также **обеспечения гарантийных обязательств**, предоставленного в ходе исполнения контрактов (на выборочной основе), установлены следующие нарушения и недостатки:

- изменения, предусматривающие увеличение цены контракта, внесены в контракт с нарушением требований части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ; в случае, когда изменение цены контракта влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечение, предусмотренное требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено;

изменения в контракт в части увеличения размера обеспечения исполнения контракта дополнительным соглашением не внесены;

- изменения в контракт в части размера обеспечения исполнения контракта дополнительным соглашением не внесены, при этом подрядчиком в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предоставлено новое обеспечения исполнения контракта (нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

- не размещена в реестре контрактов ЕИС информация об изменении размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренном дополнительным соглашением (нарушение подпункта «б» пункта 12 Правил ведения реестра контрактов);

- изменения, предусматривающие продление срока исполнения обязательств по выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных контрактом, внесены в контракт с нарушением требований части 1.3 статьи 95, части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ; в случае, когда продление срока исполнения обязательств влечет возникновение обязательств подрядчика (исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта (в период исполнения контракта после окончания срока действия независимой гарантии), обеспечение с новым сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено;

- надлежащее обеспечение исполнения контракта со сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, на весь период исполнения контракта, в том числе в случае просрочки выполнения работ (оказания услуг), не обеспечено;

- заказчиком не осуществлен контроль за исполнением условий контракта с целью своевременного продления подрядчиком срока действия независимой гарантии (в случае невыполнения работ в установленный срок), новое обеспечение (независимая гарантия или изменения к ранее предоставленной независимой гарантии) со сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не истребовано;

- условиями контракта не предусмотрена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае просрочки исполнения обязательств предоставить до окончания срока действия независимой гарантии новое обеспечение со сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

- дополнительное соглашение к контракту, устанавливающее условие об авансировании, заключено с нарушением требований части 1.3 статьи 95, пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (обеспечение исполнения контракта в размере аванса при заключении дополнительного соглашения не предоставлено);

в период с даты заключения дополнительного соглашения об авансировании до предоставления обеспечения в размере аванса (и на момент проверки в случае, если обеспечение в размере аванса не предоставлено) обеспечение исполнения контракта не соответствовало требованиям пункта 1

части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиям контракта, так как сумма действующего обеспечения менее размера, установленного контрактом (менее аванса);

- в дополнительное соглашение к контракту включено положение, противоречащее требованиям части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, о предоставлении подрядчиком обеспечения исполнения контракта в сумме, установленной дополнительным соглашением (в размере аванса), после заключения дополнительного соглашения к контракту;

- подрядчику выплачен аванс в отсутствие предоставленного надлежащего обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; выявлены **риски**, связанные с необеспечением обязательств подрядчика по возврату аванса в случае неисполнения контракта;

- при установлении в контракте условия о предоставлении обеспечения исполнения контракта до выплаты аванса и о выплате аванса при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ выявлены **риски** нарушения требований части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено после заключения дополнительного соглашения об авансировании) и риски неисполнения заказчиком обязательства по авансированию, являющегося существенным условием контракта (в случае, если обеспечение исполнения контракта не предоставлено);

- обеспечение исполнения контракта (при внесении в контракт изменений) одновременно независимой гарантией и внесением денежных средств (на часть суммы обеспечения) (нарушение требований пунктов 2, 3 части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта в ходе исполнения контракта с нарушением требований частей 7.1, 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (требование об уплате неустоек (пеней) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ подрядчику не предъявлено и последним не исполнено);

- для целей обеспечения исполнения контракта в ходе его исполнения принята независимая гарантия, не соответствующая требованиям пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, как обеспечивающая обязательства на сумму менее аванса (предоставлена на дополнительную сумму к сумме независимой гарантии, предоставленной при заключении контракта) (нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ);

- при наличии оснований для отказа заказчика в принятии независимой гарантии меры, предусмотренные частью 7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (информирование лица, предоставившего независимую гарантию, об отказе в принятии независимой гарантии), пунктом 12 Правил ведения реестра независимых гарантий (формирование и включение в реестр независимых гарантий ЕИС сведений об отказе в принятии независимой гарантии), заказчиком не реализованы;

- не осуществлялась своевременно претензионная работа в связи с нарушением подрядчиком условий контракта в части предоставления нового обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств (новое обеспечение (в размере аванса), предусмотренное требованиями пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями контракта, не предоставлено подрядчиком, либо предоставлено с нарушением установленного срока (после выплаты аванса); подрядчиком нарушен установленный контрактом срок предоставления обеспечения гарантийных обязательств);

- меры ответственности к подрядчику в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом, не применены (нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта);

- не осуществлялся надлежащий контроль за соблюдением условий контракта в части предоставления подрядчиком нового обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств;

- размер обеспечения гарантийных обязательств изменен дополнительным соглашением к контракту (при изменении цены контракта) и установлен в процентах от цены контракта (нарушение требований части 2.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ);

- в контракте не установлен срок предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренного контрактом (нарушение части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ);

- для целей обеспечения гарантийных обязательств принята независимая гарантия со сроком действия, не соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ; независимая гарантия не обеспечивает гарантийные обязательства на весь период гарантийного срока (с учетом гарантийного срока на дополнительно поставленное в соответствии с дополнительным соглашением оборудование) (нарушение части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

По результатам проверки ***соблюдения иных требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (на выборочной основе)*** при исполнении контрактов установлены следующие нарушения и недостатки:

- в дополнительном соглашении к контракту, предусматривающем изменение существенных условий контракта (цены контракта, срока исполнения обязательств по поставке товара (выполнению работ, оказанию услуг), срока исполнения контракта, установление условия о выплате аванса), основание для внесения в контракт изменений указано некорректно либо не указано;

- количество товара (объем работы или услуги), предусмотренное контрактом, увеличено дополнительным соглашением к контракту более чем на 10% при увеличении цены контракта (пропорционально дополнительному

количеству товара, объему работы или услуги) в пределах 10% (нарушение пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

- дополнительное соглашение к контракту заключено после истечения срока исполнения обязательств по поставке товара и исполнения сторонами обязательств по поставке, приемке и оплате товара, предусмотренных контрактом; срок исполнения контракта продлен дополнительным соглашением в отсутствие правовых оснований для его изменения (нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ);

- не осуществлялась претензионная работа в отношении подрядчика в связи с нарушением им условий контракта, что свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны заказчика за исполнением условий контракта (в связи с нарушением срока выполнения работ, в том числе по этапу исполнения контракта, ненадлежащим исполнением обязательства по формированию и размещению в ЕИС документа о приемке);

- меры ответственности к подрядчику в связи с нарушением им условий контракта (срока выполнения работ в полном объеме, в том числе по этапу исполнения контракта, других условий контракта) не применены (нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта);

- по факту просрочки исполнения поставщиком обязательства по поставке товара начислен штраф, а не пеня, в связи с чем сумма начисленной неустойки занижена (нарушение части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта);

- не осуществлено списание начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) по контракту в случае, предусмотренном Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней) (нарушение подпункта «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней);

- нарушение порядка осуществления приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, установленного контрактом (нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ);

- нарушение порядка оформления результатов приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги: акт о приемке выполненных работ, прилагаемый к электронному документу о приемке, мотивированный отказ от приемки (подписания документов о приемке) результата оказания услуг по соответствующим этапам исполнения контракта не содержит подписей членов приемочной комиссии, либо содержит подписи не всех членов приемочной комиссии (нарушение подпункта «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ); документы о приемке не подписаны усиленными электронными подписями членов приемочной комиссии (нарушение подпункта «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ);

- оплата поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги с нарушением срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями контракта;

- ненаправление для включения в реестр контрактов ЕИС информации о прекращении обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя),

обеспеченных независимой гарантией, и о дате такого прекращения, либо направление информации с нарушением установленного срока (нарушение соответственно подпункта «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов, подпункта «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов);

- ненаправление для включения в реестр контрактов ЕИС информации и документов, подлежащих включению в реестр, либо направление информации и документов с нарушением установленного срока (информации и документов об изменении контракта, о применении мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, о размере уплаченных неустоек (штрафов, пеней), о размере списанных заказчиком неустоек (штрафов, пеней), документов, подтверждающих уплату и списание неустоек, информации и документов о приемке поставленного товара (результата оказания услуг), отдельных этапов исполнения контракта (нарушение соответственно части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктов «а» и «б» пункта 15, подпункта «е» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов);

- заказчиком не осуществлен надлежащий контроль за выгрузкой и своевременным размещением в реестре контрактов ЕИС сведений об оплате в целях соблюдения требований пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выводы

1. По результатам анализа основных изменений в сфере правового регулирования осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области установлено следующее:

1.1. В 2025 году вступили в силу изменения, внесенные в законодательство о контрактной системе в сфере закупок, касающиеся применения национального режима в сфере закупок, действия антикризисных мер, направленных на поддержку поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.2. В соответствии с предложениями КСП ЛО по результатам проведения в 2024 году экспертно-аналитического мероприятия «Обобщение результатов анализа и оценки информации об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам» приказом Управления делами Правительства Ленинградской области от 11.03.2025 № 2 внесены изменения в приказ Управления делами Правительства Ленинградской области от 31.10.2022 № 14 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Ленинградской области» в части определения порядка расчета нормативных затрат на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ленинградской области, проходящих гражданскую службу в органах исполнительной власти Ленинградской области и аппаратах мировых судей

Ленинградской области, а также лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленинградской области, нормативных затрат на обеспечение программой добровольного медицинского страхования лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области, а также иных нормативных затрат на приобретение товаров и услуг, в отношении которых порядок расчета таких затрат Правилами определения нормативных затрат не установлен.

1.3. В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие федеральному законодательству Комитетом государственного заказа Ленинградской области в соответствии с предложениями КСП ЛО в IV квартале 2025 года разработан проект постановления Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Ленинградской области», которым вносятся изменения в постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2015 № 531 и от 30.12.2015 № 530 в части наделения государственных органов Ленинградской области, не относящихся к органам исполнительной власти Ленинградской области, правом самостоятельно утверждать нормативные затраты на обеспечение своих функций и требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. По результатам анализа показателей объемов, структуры и эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ленинградской области за 2024 год и 1 полугодие 2025 года установлено следующее:

2.1. За 2024 год:

2.1.1. В 2024 году по сравнению с 2023 годом общее количество закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской области увеличилось на 19,1% (50 168 ед.) при росте суммарной стоимости закупок в 1,6 раза (94 125,8 млн. руб.)

2.1.2. Доля конкурентных закупок в общем количестве закупок по сравнению с 2023 годом повысилась с 32,6% до 36,6% (в суммарной стоимости закупок с 86,2% до 86,4%) при соответствующем снижении доли закупок у единственных поставщиков.

2.1.3. В 2024 году выросла доля проведенных запросов котировок в электронной форме (в общем количестве закупок) – с 4,6% в 2023 году до 7,8% в 2024 году. При этом в суммарной стоимости закупок наиболее значительно увеличилась доля закупок, осуществленных путем проведения электронного конкурса, - с 21,8% в 2023 году до 31,8% в 2024 году.

2.1.4. В 2024 году проведено 10 644 конкурентных процедур, участниками которых являлись только СМП и СОНКО, на сумму Н(М)ЦК 11 283,1 млн. руб., что больше, чем в 2023 году, по количеству – на 29,2%, по стоимости – на 35,3%.

Доля указанных процедур в общем количестве завершенных конкурентных процедур составила 59,8% (в 2023 году – 61,3%), в суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур – 14,5% (в 2023 году – 17,8%).

2.1.5. Доля несостоявшихся конкурентных процедур в 2024 году повысилась относительно показателей 2023 года и составила 57,1% от общего количества и 72,4% от суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур (в 2023 году соответственно 54,4% и 68,4%).

В основном конкурентные процедуры были признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в торгах, которая была признана соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок – 79,5% от общего количества и 87,2% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур (в 2023 году соответственно 78,8% и 83,1%).

2.1.6. Доля процедур, признанных несостоявшимися и завершившихся заключением контрактов (договоров) с единственными участниками (8 414 процедур на сумму Н(М)ЦК 50 758,3 млн. руб.), в общем количестве завершенных конкурентных процедур увеличилась по сравнению с 2023 годом – с 45,5% в 2023 году до 47,3% в 2024 году, в суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур - с 59,1% в 2023 году до 65,4% в 2024 году.

2.1.7. В 2024 году заказчиками Ленинградской области заключено контрактов (договоров) 48 801 ед. на общую сумму 81 780,5 млн. руб., что больше, чем в 2023 году, по количеству – на 16,9%, по суммарной стоимости (цене) - в 1,7 раза.

2.1.8. По результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заключено 34,8% от общего количества контрактов и 84,3% от их суммарной стоимости (цены).

Доля контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур, повысилась в общем количестве контрактов (договоров) с 32% в 2023 году до 34,8% в 2024 году, в суммарной стоимости (цене) контрактов (договоров) - с 83,3% в 2023 году до 84,3% в 2024 году.

2.1.9. В структуре суммарной стоимости (цены) контрактов (договоров) наибольшая доля в 2024 году (60,6%) приходится на несостоявшиеся конкурентные процедуры, по результатам которых контракты заключены с единственными участниками процедур, 23,7% - на состоявшиеся конкурентные процедуры, 15,7% - прямые закупки у единственных поставщиков.

2.1.10. По сравнению с 2023 годом отмечен рост доли несостоявшихся конкурентных процедур, по результатам которых контракты заключены с единственными участниками процедур, как в общем количестве (с 16,6% в 2023 году до 18,2% в 2024 году), так и в суммарной стоимости (цене) контрактов (с 56,6% в 2023 году до 60,6% в 2024 году).

2.1.11. Доля контрактов (договоров), заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, и единственными участниками процедур, составила в 2024 году 76,3% от

суммарной стоимости (цены) всех заключенных контрактов (договоров) (в 2023 году - 73,3%).

2.1.12. В 2024 году совокупный объем закупок, осуществленных заказчиками Ленинградской области у СМП в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, включая в том числе объемы привлечения СМП к исполнению контрактов, составил 27 787,8 млн. руб. или 40,3% от суммарной стоимости заключенных контрактов (в 2023 году - 17 303,1 млн. руб. или 45% от суммарной стоимости контрактов).

С учетом стоимости контрактов, заключенных с СМП по результатам проведения конкурентных процедур на общих основаниях (без установления преимущества СМП, СОНКО), указанная доля составила в 2024 году 59,3% (в 2023 году – 64,2%).

2.1.13. Количество закупок малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ увеличилось в 2024 году на 6,7% при росте их стоимости в 1,3 раза.

В электронном виде с использованием информационного ресурса автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» - агрегатора торговли Ленинградской области осуществлено 25 981 ед. закупок суммарной (начальной) стоимостью 3 111,7 млн. руб.

2.1.14. Экономия бюджетных средств при заключении контрактов (договоров) по результатам закупок, осуществленных в электронном виде с использованием агрегатора торговли Ленинградской области, составила 113,3 млн. руб. или 3,6% от суммарной (начальной) стоимости таких закупок (в 2023 году - 75,8 млн. руб. или 2,8% от суммарной (начальной) стоимости закупок).

2.1.15. В 2024 году расторгнуто всего 1 522 ед. контрактов (договоров) суммарной стоимостью 2 661,4 млн. руб. из числа контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Вследствие одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов расторгнуто 48 контрактов (договоров) на общую сумму 39,4 млн. руб. (3,2% от общего количества и 1,5% от суммарной стоимости (цены) расторгнутых контрактов (договоров)).

2.1.16. В 2024 году в УФАС по Ленинградской области поступило 387 обращений заказчиков регионального и муниципального уровня о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, что на 36,3% больше, чем в 2023 году.

2.1.17. Из общего количества обращений 61,5% (в 2023 году – 57,7%) составили обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (238 обращений).

Количество таких обращений по сравнению с 2023 года увеличилось в 1,5 раза. В 58,8% случаев по указанным обращениям были приняты решения о

включении информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков.

2.1.18. Более половины (56,6%) от общего количества обращений в 2024 году о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков поступило от заказчиков регионального уровня (219 обращений).

2.1.19. Среднее количество заявок на 1 закупку (лот), поданных участниками конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), составило в 2024 году 2,2 заявки против 2,3 заявок в 2023 году.

2.2. За 1 полугодие 2025 года (январь-сентябрь 2025 года):

2.2.1. В 1 полугодии 2025 года заказчиками Ленинградской области осуществлено закупок товаров, работ, услуг на 3,4% меньше, чем в 1 полугодии 2024 года (24 192 ед.), суммарная стоимость закупок меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, на 21,7% (37 185,7 млн. руб.).

2.2.2. Доля конкурентных процедур увеличилась в общем количестве закупок (с 34,7% в 1 полугодии 2024 года до 35,9% в 1 полугодии 2025 года) при снижении соответствующей доли в суммарной стоимости закупок (соответственно с 89,9% до 84,3%).

2.2.3. В 1 полугодии 2025 года заказчиками Ленинградской области размещены среди СМП и СОНКО (с установлением соответствующего преимущества участникам) закупки, составившие 70% от общего количества и 24% от суммарной стоимости всех завершенных конкурентных процедур (в 1 полугодии 2024 года – 62,7% от общего количества и 13% от суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур).

По сравнению с 1 полугодием 2024 года количество конкурентных процедур, проведенных среди СМП и СОНКО, увеличилось на 7,5%, суммарная стоимость таких процедур увеличилась на 34,1%.

2.2.4. Доля несостоявшихся конкурентных процедур в 1 полугодии 2025 года составила 57% от общего количества и 70,5% от суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур и незначительно повысилась по сравнению с 1 полугодием 2024 года (55,6% от общего количества и 69,9% от суммарной стоимости завершенных конкурентных процедур).

2.2.5. Увеличилась доля иных оснований для признания торгов несостоявшимися: торгов, в которых не было подано ни одной заявки, либо одна заявка из двух или более поданных заявок была признана соответствующей требованиям извещения (документации) и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, либо отклонены все заявки (в 1 полугодии 2024 года – соответственно 20,7% от общего количества и 12,8% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур, в 1 полугодии 2025 года - 24,6% от общего количества и 25,9% от суммарной стоимости несостоявшихся конкурентных процедур).

2.2.6. По итогам 45,9% завершенных конкурентных процедур, стоимость которых составила 56,9% от суммарной стоимости указанных процедур, контракты (договоры) были заключены с единственными участниками этих

процедур на основании пунктов 24, 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.2.7. В 1 полугодии 2025 года заказчиками Ленинградской области заключено 23 668 контрактов (договоров) на общую сумму 35 716,5 млн. руб., что по количеству меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года, на 4,6%, по суммарной стоимости (цене) больше на 9,7%.

2.2.8. 34,4% от общего количества контрактов (83,6% от их суммарной стоимости (цены)) заключено по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Доля контрактов (договоров), заключенных по результатам конкурентных процедур, незначительно увеличилась по сравнению с 1 полугодием 2024 года (с 34,1% до 34,4% от общего количества заключенных контрактов (договоров)) при некотором снижении указанной доли в суммарной стоимости (цене) заключенных контрактов (договоров) (с 85,2% до 83,6%).

2.2.9. В структуре суммарной стоимости (цены) заключенных контрактов (договоров) 59,7% приходилось на несостоявшиеся конкурентные процедуры, по результатам которых контракты заключены с единственными участниками процедур, 23,9% - на состоявшиеся конкурентные процедуры, 16,4% - прямые закупки у единственных поставщиков.

2.2.10. По сравнению с 1 полугодием 2024 года отмечено увеличение количества и стоимости контрактов, заключенных с единственными участниками по результатам несостоявшихся конкурентных процедур, а также их доли в общем количестве и суммарной стоимости (цене) заключенных контрактов: в общем количестве заключенных контрактов (договоров) соответственно с 18% до 18,9%, в суммарной стоимости (цене) контрактов (договоров) - с 55,9% до 59,7%.

2.2.11. Доля контрактов (договоров), заключенных с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, и единственными участниками процедур составила 76,1% от суммарной стоимости (цены) всех заключенных контрактов (договоров) (в 1 полугодии 2024 года – 70,7% от суммарной стоимости (цены) контрактов (договоров)).

2.2.12. Количество закупок малого объема в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ сократилось на 5,3%, при этом стоимость таких закупок увеличилась на 14,7%.

2.2.13. Осуществлено в электронном виде с использованием агрегатора торговли Ленинградской области 17 535 ед. закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ суммарной (начальной) стоимостью 2 221,8 млн. руб.

Экономия бюджетных средств при заключении контрактов (договоров) по результатам закупок у единственных поставщиков в электронном виде составила в январе-сентябре 2025 года 63,9 млн. руб. или 2,9% от суммарной (начальной) стоимости закупок, осуществленных в электронном виде с использованием агрегатора торговли Ленинградской области (в январе-

сентябре 2024 года - 83,5 млн. руб. или 3,9% от суммарной (начальной) стоимости закупок).

2.2.14. Уровень конкурентности закупок составил 2,2 заявки, поданных участниками конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 1 закупку (лот) в 1 полугодии 2025 года (2,3 заявки на 1 закупку (лот) в 1 полугодии 2024 года).

2.2.15. В 1 полугодии 2025 года расторгнут 131 контракт (договор) на общую сумму 152,9 млн. руб. из числа заключенных по результатам конкурентных процедур, из них заказчиками в одностороннем порядке – 7 контрактов (договоров) на общую сумму 10,2 млн. руб.

2.2.16. В январе-сентябре 2025 года совокупный объем закупок, осуществленных заказчиками Ленинградской области у СМП в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, включая в том числе объемы привлечения СМП к исполнению контрактов, составил 21 695,5 млн. руб. или 48,9% от суммарной стоимости заключенных контрактов (в январе-сентябре 2024 года – 18 864,5 млн. руб. или 34,6%).

С учетом стоимости контрактов, заключенных заказчиками с СМП по результатам проведения конкурентных процедур на общих основаниях (без установления преимущества СМП, СОНКО), указанная доля составила в январе-сентябре 2025 года 66,1% (в январе-сентябре 2024 года - 47,9%).

2.2.17. Всего в январе-сентябре 2025 года в УФАС по Ленинградской области поступило 304 обращения заказчиков регионального и муниципального уровня о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков, что на 7,4% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

2.2.18. Из общего количества обращений 59,9% (в аналогичном периоде 2024 года – 58,7%) составили обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов в связи с существенным нарушением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (182 обращения).

Количество таких обращений по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилось на 9,6%. В 52,2% случаев по указанным обращениям были приняты решения о включении информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков.

2.2.19. Более половины (57,6%) от общего количества обращений в январе-сентябре 2025 года о включении информации об участниках закупок, о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр недобросовестных поставщиков поступило от заказчиков регионального уровня (175 обращений).

2.2.20. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года от заказчиков регионального уровня поступило на 17% больше обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты были расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчиков от исполнения контрактов.

3. По результатам анализа информации о результатах контроля и аудита в сфере закупок в Ленинградской области за 2024 год установлено следующее:

3.1. В 2024 году увеличилось общее количество проверок, проведенных органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок: в 2024 году – 79 проверок, в 2023 году – 71 проверка.

По результатам проверок нарушения установлены у 37 заказчиков регионального уровня (в 2023 году – у 30 заказчиков регионального уровня).

3.2. По результатам контроля в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ установлено 147 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок; по результатам контроля в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ - 37 нарушений на общую сумму 715,2 тыс. руб. (в 2023 году – 97 нарушений на общую сумму 1 371,5 тыс. руб.).

3.3. По результатам проверок в 2024 году объектам контроля выдано 5 представлений и 5 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок (в 2023 году – 15 представлений и 4 предписания), которые исполнены.

3.4. В 2024 году возбуждено 158 дел об административных правонарушениях, из них 96 - в отношении должностных лиц заказчиков регионального уровня и 62 - в отношении должностных лиц муниципальных заказчиков (в 2023 году – 109 дел, из них 62 - в отношении должностных лиц заказчиков регионального уровня и 47 - в отношении должностных лиц муниципальных заказчиков); вынесено 122 постановления о назначении административного наказания (в 2023 году – 85 постановлений).

Сумма наложенных административных штрафов составила 240 тыс. руб. (в 2023 году – 203,4 тыс. руб.). В консолидированный бюджет Ленинградской области (по постановлениям с наступившим сроком для оплаты) поступило 120 тыс. руб. (в 2023 году – 114,2 тыс. руб.).

3.5. Органами исполнительной власти Ленинградской области в 2024 году проведено 79 проверок ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков (в 2023 году – 117 проверок).

3.6. По результатам проверок ведомственного контроля в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков выявлено 454 нарушения на общую сумму 1 540,2 тыс. руб. (в 2023 году – 833 нарушения на общую сумму 3 448,8 тыс. руб.).

3.7. В 2024 году направлено в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях 47 материалов проверок ведомственного контроля, содержащих признаки административного правонарушения, что меньше, чем в 2023 году (в 2023 году – 84).

3.8. Общее количество поступивших в 2024 году в УФАС по Ленинградской области жалоб на закупки заказчиков регионального и муниципального уровня по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 11,8%.

3.9. Среди поступивших жалоб на закупки заказчиков, как и в 2023 году, преобладали жалобы на закупки муниципальных заказчиков, доля которых составила 60,3% от общего количества поступивших жалоб и 65,5% от количества обоснованных жалоб.

3.10. Количество обоснованных жалоб значительно сократилось (в 3,6 раза) по сравнению с 2023 годом (в 2024 году – 348 ед., в 2023 году - 1 253 ед.).

3.11. Доля обоснованных жалоб в общем количестве рассмотренных жалоб составила в 2024 году 37,4% (в 2023 году – 57,2%). Доля обоснованных жалоб в отношении закупок муниципальных заказчиков выше (43,8%), чем в отношении закупок заказчиков регионального уровня (29,3%).

3.12. По итогам рассмотрения жалоб и проведения при их рассмотрении внеплановых проверок выявлено нарушений в 3,6 раза меньше, чем в 2023 году (в 2024 году – 264 нарушения, в 2023 году – 960 нарушений).

3.13. Количество выданных предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок сократилось в 2,7 раза (в 2024 году – 231 предписание, в 2023 году – 618 предписаний).

3.14. Количество возбужденных антимонопольным органом дел об административных правонарушениях по фактам выявленных нарушений сократилось по сравнению с 2023 годом в 1,2 раза: в 2024 году вынесено 727 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 2 195 тыс. руб. (в 2023 году – 880 постановлений на общую сумму 955 тыс. руб.).

3.15. В 2024 году наибольшее количество обоснованных жалоб приходилось на закупки комитета Ленинградской области по транспорту и комитета по здравоохранению Ленинградской области, а также на закупки учреждений, подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области, комитету по строительству Ленинградской области, комитету по социальной защите населения Ленинградской области, комитету цифрового развития Ленинградской области, комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области.

3.16. КСП ЛО в 2024 году в рамках реализации полномочия по осуществлению аудита в сфере закупок выявлено 129 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, из них финансовых нарушений – 23 на общую сумму 28 605,3 тыс. руб. (в 2023 году – 333 нарушения, из них финансовых – 14 на общую сумму 70 258,4 тыс. руб.).

3.17. Основная сумма выявленных финансовых нарушений (23 нарушения на общую сумму 28 605,3 тыс. руб.) приходилась на нарушения в части приемки и (или) оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг в случае несоответствия этих товаров, работ, услуг либо результатов выполненных работ условиям контрактов (договоров) (9 726,7 тыс. руб.), а также в части обоснования начальной (максимальной) цены контракта (18 386,6 тыс. руб.).

3.18. По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в проверяемые органы (организации) внесено 3

представления, направлены информационные письма в адрес соответствующих заказчиков. Объектами контроля приняты соответствующие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе разработаны и представлены в КСП ЛО планы мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе соответствующих контрольных мероприятий.

3.19. Муниципальными контрольно-счетными органами Ленинградской области в 2024 году в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 420 нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на общую сумму 167,2 млн. руб. (в 2023 году - 737 нарушений на общую сумму 315,7 млн. руб.).

4. По результатам проверки и анализа соблюдения заказчиками требований Федерального закона № 44-ФЗ при установлении в 2024 году и истекшем периоде 2025 года в извещениях об осуществлении закупок, проектах контрактов и заключенных контрактах требования обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств (на выборочной основе) установлено следующее:

4.1. Согласно информации, полученной с использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС, требование обеспечения исполнения контракта установлено заказчиками в 88,7% от общего количества извещений об осуществлении закупок, размещенных в ЕИС в 2024 году (96,9% от суммарной Н(М)ЦК указанных закупок).

В 18,5% от общего количества заключенных контрактов обеспечение исполнения контракта предоставлено при заключении контракта в виде независимой гарантии, при этом независимой гарантией было обеспечено 65,1% от суммарной стоимости (цены) заключенных контрактов.

В 35,6% от общего количества контрактов (13,6% от суммарной стоимости (цены) контрактов) исполнение контрактов обеспечивалось внесением денежных средств.

4.2. Анализ данных о распределении контрактов, заключенных в 2024 году, по способам обеспечения исполнения контракта показал, что исполнение 45,7% контрактов, заключенных по результатам проведения электронных аукционов (преимущественно), обеспечивалось путем внесения денежных средств, при этом 76,2% от суммарной стоимости (цены) контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, было обеспечено независимой гарантией.

При заключении контрактов по результатам конкурсов применялся преимущественно способ обеспечения «независимая гарантия» (обеспечено 47,5% от общего количества и 78,7% от общей стоимости (цены) контрактов, заключенных по результатам конкурсов).

4.3. В 12 закупках на общую сумму Н(М)ЦК 24 440,7 тыс. руб. выявлены нарушения в части установления в извещениях об осуществлении закупок, проектах контрактов, а также заключенных контрактах обеспечения исполнения контракта в размере, не соответствующем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ (менее аванса в случае, когда контрактом

предусмотрена выплата аванса) (**нарушение** пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ) (заказчики - ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ», ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»).

ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ» претензионная работа по факту неисполнения контракта № 2472100336525000011 не осуществлена своевременно. На дату направления заказчиком уведомления о расторжении контракта в одностороннем порядке срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, уже истек, в связи с чем реализовались риски, связанные с ненадлежащим обеспечением исполнения контракта (невозможность предъявить требование гаранту в размере аванса, риск невозврата аванса в случае неисполнения контракта).

4.4. При проведении запросов котировок в электронной форме (извещения №№ 0345200006025000005, 0345200006025000012) ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ» применены антидемпинговые меры в **нарушение** частей 2, 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контрактов №№ 2472100336525000004, 2472100336525000010 обязательства по авансированию заказчиком не исполнены.

4.5. Предусмотренным в контрактах №№ 2472100336525000004, 2472100336525000010 (заказчик - ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ») порядком оплаты поставленных товаров, выполненных работ в **нарушение** пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ не установлены сроки осуществления авансовых платежей по контрактам.

4.6. В 3 контрактах, заключенных по результатам проведения электронных аукционов (извещения № 0345200015725000015 (заказчик – ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»), №№ 0345200006025000003, 0345200006025000004 (заказчик – ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ»)), отсутствовало обязательное условие о порядке оплаты товаров, работ, услуг с учетом положений части 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ (**нарушение** требований пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ).

4.7. **В нарушение** части 1 статьи 96, части 64.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области», ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района» при осуществлении в 2025 году некоторых закупок путем проведения электронного аукциона, в случаях, когда расчеты по контрактам не подлежали казначейскому сопровождению, в извещениях об осуществлении закупок, проектах контрактов требование обеспечения исполнения контракта не установлено.

По выявленным фактам нарушений применено дисциплинарное взыскание к контрактному управляющему ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области» в виде замечания.

4.8. ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» в извещениях о проведении электронных аукционов №№ 0845200001425000061, 0845200001425000064 порядок предоставления обеспечения исполнения

контракта, требования к обеспечению фактически не установлены (**нарушение** пункта 17 части 1 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ).

5. По результатам проверки, анализа и оценки обеспечения исполнения контрактов, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контрактов, а также обеспечения гарантийных обязательств, предоставленного в ходе исполнения контрактов (на выборочной основе), установлено следующее:

5.1. ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»:

5.1.1. Дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2024 к контракту № 2470315158624000012 заключено с **нарушением** требований части 1.3 статьи 95, пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (при установлении дополнительным соглашением условия об авансировании обеспечение исполнения контракта в размере аванса при заключении дополнительного соглашения подрядчиком не предоставлено). Заказчиком выплачен подрядчику аванс в отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Претензионная работа в целях обеспечения исполнения подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта (в размере аванса) заказчиком не осуществлялась своевременно.

5.1.2. В период исполнения контракта № 2470315158624000003 после истечения срока исполнения обязательств, установленного пунктом 1.4 контракта, обеспечение исполнения контракта не соответствовало требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, предъявляемым к сроку действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта.

Контроль за исполнением пункта 6.7 контракта № 2470315158624000003 с целью своевременного продления подрядчиком срока действия независимой гарантии заказчиком не осуществлялся.

5.1.3. В ходе исполнения контракта № 2470315158624000003 подрядчиком в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ предоставлено новое обеспечение в виде независимой гарантии на сумму 3 428,3 тыс. руб., т.е. увеличенную пропорционально стоимости новых обязательств.

В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при внесении дополнительным соглашением № 1 от 21.11.2024 изменений в контракт № 2470315158624000003 в части изменения его существенных условий (видов и объемов работ, предусмотренных контрактом, срока выполнения работ) изменение (увеличение) в соответствии с частью 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта сторонами не согласовано, изменения в контракт в части увеличения размера обеспечения исполнения контракта дополнительным соглашением не внесены.

5.1.4. **В нарушение** подпункта «б» пункта 12 Правил ведения реестра контрактов при размещении в реестре контрактов ЕИС информации об изменении контракта № 24703151586240000120012 от 12.12.2024 информация

об изменении размера обеспечения исполнения контракта в реестре не размещена.

5.1.5. Претензионная работа в отношении подрядчика в связи с нарушением установленного контрактами №№ 2470315158624000004, 2470315158624000002 срока предоставления обеспечения гарантийных обязательств в период соответственно с 28.11.2024 и с 13.12.2024 заказчиком не осуществлялась.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктов 7.3 контрактов №№ 2470315158624000002, 2470315158624000004 меры ответственности к подрядчику в виде штрафов в связи с нарушением установленного контрактами срока предоставления обеспечения гарантийных обязательств при расторжении контрактов не применены. Контроль за соблюдением установленного контрактами срока предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств заказчиком не осуществлен.

5.2. ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства»:

5.2.1. Дополнительное соглашение № 2 от 28.03.2025 к контракту № 2470606441224000041, дополнительное соглашение № 2 от 15.05.2024 к контракту № 2470606441224000025, дополнительное соглашение № 2 от 19.12.2024 к контракту № 2470606441224000050 заключены **с нарушением** требований части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда изменение цены контракта влечет возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта, предусмотренное требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

Новое обеспечение исполнения контракта № 2470606441224000041 (изменение от 08.08.2025 в условия независимой гарантии № LM2106249921 от 28.06.2024) фактически предоставлено только при последующем внесении в контракт изменений дополнительным соглашением № 4 от 11.08.2025.

Внесение изменений в контракты осуществлялось без учета стоимости фактически исполненных обязательств, вследствие чего заказчиком были нарушены требования части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.2.2. Дополнительное соглашение № 1 от 20.12.2024 к контракту № 2470606441224000074, дополнительное соглашение № 2 от 20.06.2025 к контракту № 2470606441225000002, дополнительное соглашение № 1 от 22.05.2025 к контракту № 2470606441225000010, дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2024 к контракту № 2470606441224000046, дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2024 к контракту № 2470606441224000059 заключены **с нарушением** требований части 1.3 статьи 95, пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда установление в контракте условия о выплате аванса влечет возникновение новых обязательств подрядчика (по возврату аванса в случае неисполнения контракта), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта, предусмотренное требованиями части 1.3

статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в размере аванса), при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

При исполнении контрактов №№ 2470606441224000074, 2470606441225000002, 2470606441225000010, 2470606441224000046, 2470606441224000059 выявлены риски, связанные с ненадлежащим обеспечением обязательств по возврату аванса.

Вследствие непредоставления подрядчиком в ходе исполнения контракта № 2470606441224000046 обеспечения исполнения контракта в размере аванса заказчиком допущено **нарушение** условия контракта об авансировании, предусмотренного пунктом 5.3 электронного контракта.

5.2.3. Дополнительное соглашение № 3 от 09.04.2025 к контракту № 2470606441224000074 заключено с **нарушением** требований части 1.3 статьи 95, части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда продление срока исполнения обязательств, предусмотренного контрактом, влечет возникновение обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта (в период исполнения контракта с 02.02.2026 по 01.12.2026), обеспечение исполнения контракта с новым сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

5.2.4. В ходе исполнения контракта № 2470606441224000046 обеспечение исполнения контракта в размере аванса в соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2024 к контракту подрядчиком не представлено.

Обеспечение исполнения контракта № 2470606441224000059 в размере аванса предоставлено подрядчиком в нарушение условий пункта 3.8 контракта (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024) после выплаты аванса.

Претензионная работа в отношении подрядчиков в связи с нарушением условий контрактов №№ 2470606441224000046, 2470606441224000059 соответственно в период с 25.12.2024, 03.02.2025 и на дату проверки не осуществлялась.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчикам по контрактам №№ 2470606441224000046, 2470606441224000059 в связи с непредоставлением (нарушением установленного контрактом срока предоставления) обеспечения исполнения контракта в размере аванса, предусмотренного требованиями пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями контракта, на дату проверки не применены.

Нарушения устранены в ходе ЭАМ: ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в адрес подрядчика по контракту № 2470606441224000046 направлена претензия № 1968-14/2025 от 01.11.2025 с требованием об уплате нестойки (штрафа) на сумму 2 237,9 тыс. руб. по факту непредоставления обеспечения исполнения контракта в размере аванса; в адрес подрядчика по контракту № 2470606441224000059 направлена претензия № 1966-14/2025 от 01.11.2025 с требованием об уплате нестойки (штрафа) на сумму 2 032,3 тыс.

руб. по факту нарушения установленного контрактом срока предоставления обеспечения исполнения контракта.

5.2.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта № 2470606441224000054 в ходе его исполнения (в части уменьшения суммы независимой гарантии до 7 944,7 тыс. руб.) осуществлено **с нарушением** требований частей 7.1, 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (требование об уплате неустоек (пеней) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ подрядчику не предъявлено и последним не исполнено).

В ходе ЭАМ установлено, что просрочка выполнения подрядчиком работ по 1 этапу исполнения контракта № 2470606441224000054 (разработка проектной документации по объекту) составила 160 дней (исходя из информации, содержащейся в документе о приемке, размещенном подрядчиком в ЕИС 07.08.2025). Претензионная работа в отношении подрядчика в связи с нарушением им условий контракта № 2470606441224000054 в период с 07.08.2025 и на дату проверки не осуществлялась.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000054 в связи с нарушением срока выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) на дату проверки не применены.

Нарушение устранено в ходе ЭАМ: ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» в адрес подрядчика направлена претензия № 1965-14/2025 от 01.11.2025 с требованием об уплате неустоек (пеней) по факту просрочки выполнения работ по 1 этапу исполнения контракта (разработка проектной документации по объекту) на сумму 401 тыс. руб. и выполнения строительно-монтажных работ на объекте (всего на общую сумму 1 978,4 тыс. руб.).

5.2.6. **В нарушение** части 6 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ для целей обеспечения исполнения контракта № 2470606441224000059 была принята независимая гарантия, не соответствующая требованиям пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.5 электронного контракта, пункта 6.11 контракта, сформированного без использования ЕИС (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2024), обеспечивающая обязательства на сумму менее аванса (предоставлена на сумму дополнительную к сумме независимой гарантии, предоставленной при заключении контракта).

При наличии оснований для отказа заказчика в принятии независимой гарантии меры, предусмотренные частью 7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (информирование лица, предоставившего независимую гарантию, об отказе в принятии независимой гарантии), пунктом 12 Правил ведения реестра независимых гарантий (формирование и включение в реестр независимых гарантий ЕИС сведений об отказе в принятии независимой гарантии), заказчиком не реализованы.

5.2.7. **В нарушение** требований части 2.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размер обеспечения гарантийных обязательств по контракту № 2470606441224000054 в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 29.07.2025 к контракту изменен и установлен в процентах от цены контракта

(с учетом увеличения цены контракта в соответствии с дополнительным соглашением).

5.3. ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства»:

5.3.1. В связи с увеличением в ходе исполнения контракта объема оказываемых услуг (с 12 до 13 месяцев) в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 17.03.2025 к контракту № 2470312595624000021 срок окончания оказания услуг фактически продлен с 18.04.2025 по 18.05.2025.

Дополнительное соглашение № 2 от 17.03.2025 к контракту № 2470312595624000021 заключено **с нарушением** требований части 1.3 статьи 95, части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда продление срока оказания услуг по контракту влечет возникновение обязательств исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта (в период с 06.06.2025 по 18.06.2025), обеспечение исполнения контракта с новым сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

В связи с просрочкой оказания услуг по 6 этапу исполнения контракта (услуги фактически оказаны исполнителем в полном объеме 18.06.2025) новое обеспечение исполнения контракта со сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.9 контракта, заказчиком также не истребовано, надлежащее обеспечение обязательств на весь период исполнения контракта не обеспечено.

В период исполнения контракта с 06.06.2025 по 20.07.2025 обязательства исполнителя, предусмотренные контрактом, не были обеспечены предоставленным обеспечением исполнения контракта.

5.3.2. Дополнительное соглашение № 1 от 05.12.2024 к контракту № 2470312595624000101 заключено **с нарушением** требований части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, когда изменение цены контракта влечет возникновение новых обязательств исполнителя, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта, предусмотренное требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, при заключении дополнительного соглашения не предоставлено).

5.3.3. Обеспечение исполнения контракта на сумму 20,4 тыс. руб. предоставлено при заключении дополнительного соглашения № 4 от 19.06.2025 к контракту № 2470312595624000084 в дополнение к независимой гарантии № 11Ю-С-003616/24 путем внесения денежных средств **с нарушением** требований пунктов 2, 3 части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.3.4. **В нарушение** части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ для целей обеспечения гарантийных обязательств по контракту № 2470312595624000037 принята независимая гарантия, срок действия которой не соответствует требованиям указанной части статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Таким образом, независимая гарантия не обеспечивает гарантийные обязательства на весь период гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

5.3.5. **В нарушение** части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ срок предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств контрактами №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093 не установлен.

6. В ходе проверки соблюдения иных требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (на выборочной основе) при исполнении контрактов установлено следующее:

6.1. ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»:

6.1.1. **В нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 7.3 контракта № 2470315158624000003 меры ответственности к подрядчику в виде штрафа в связи с ненадлежащим исполнением обязательства, предусмотренного пунктом 4.1 контракта, по формированию и размещению в ЕИС документа о приемке не применены.

6.1.2. Размер начисленной неустойки (пени) по контракту № 2470315158624000002 составил 181,7 тыс. руб. (0,7% от цены контракта), по контракту № 2470315158624000004 – 61,5 тыс. руб. (0,2% от цены контракта).

В нарушение Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней) обязанность по списанию начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) заказчиком в рассматриваемом периоде не исполнялась.

Порядок взаимодействия заказчика с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области, исполняющим полномочия администратора доходов областного бюджета Ленинградской области, в том числе при начислении ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным учреждением, по вопросам списания начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) правовым актом ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» не определен.

6.1.3. Оплата выполненных работ по контракту № 2470315158624000012 по актам о приемке работ № 2 от 11.07.2025, № 3 от 08.08.2025 произведена с **нарушением** срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктами 3.4.3 контрактов, на 13 и 12 рабочих дней соответственно.

6.1.4. **В нарушение** подпункта «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов информация о прекращении обязательств подрядчика, обеспеченных независимой гарантией, и о дате такого прекращения по контрактам №№ 2470315158624000003, 2470315158624000002, 2470315158624000004 в реестре контрактов ЕИС не размещена (документы, подтверждающие размещение информации, не представлены).

6.1.5. В отдельных случаях информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов ЕИС, направлены для включения в реестр с нарушением сроков, установленных соответственно частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов (от 1 до 5 рабочих дней): информация и документы об изменении контракта № 2470315158624000004 (дополнительное соглашение № 1 от 10.10.2024), о применении мер ответственности в случае нарушения подрядчиками условий контрактов №№ 2470315158624000012,

2470315158624000004 (требование № 376 от 29.04.2025 о предоставлении обеспечения исполнения контракта и начислении штрафных санкций, требование № 60 от 30.01.2025 об оплате пеней).

6.2. ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства»:

6.2.1. В ходе ЭАМ установлено, что просрочка выполнения подрядчиками работ по 1 этапу исполнения контракта № 2470606441224000074 (разработка проектной документации по объекту), работ по разработке рабочей документации по контракту № 2470606441224000028, работ в полном объеме по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 составила на дату проверки от 18 до 143 дней.

ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» претензионная работа в отношении подрядчиков в связи с нарушением ими условий контрактов №№ 2470606441224000074, 2470606441224000028, 2470606441224000019 соответственно в период с 31.05.2025 (по контракту № 2470606441224000074), с 12.07.2024 (по контракту № 2470606441224000028), с 31.07.2025 (по контракту № 2470606441224000019) и на дату проверки не осуществлялась.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчикам по контрактам №№ 2470606441224000074, 2470606441224000028, 2470606441224000019 в связи с нарушением сроков выполнения работ ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» на дату проверки не применены.

Нарушения частично устранены в ходе ЭАМ: в адрес подрядчиков по контрактам №№ 2470606441224000074, 2470606441224000028, 2470606441224000019 направлены претензии (№ 1956-14/2025 от 01.11.2025, № ВН-809/2025-1 от 30.10.2025, № 1950-14/2025 от 30.10.2025) с требованием об уплате нестоек (пеней) на общую сумму 701 тыс. руб.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000028 в связи с просрочкой выполнения работ по разработке рабочей документации по объекту ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства» по состоянию на 19.11.2025 не применены (сумма пени (расчётно) - 87,9 тыс. руб.).

6.2.2. В ходе ЭАМ установлено, что претензионная работа по фактам нарушения подрядчиками условий контрактов (нарушение срока выполнения работ, срока предоставления обеспечения исполнения контракта в размере аванса, непредоставление обеспечения исполнения контракта в размере аванса) не осуществлялась заказчиком по 6 контрактам, являющимся предметом проверки и анализа в ходе ЭАМ (контракты №№ 2470606441224000054, 2470606441224000059, 2470606441224000046, 2470606441224000074, 2470606441224000028, 2470606441224000019); всего не предъявлены неустойки (штрафы, пени) на общую сумму 7 037,5 тыс. руб., устранены нарушения в ходе ЭАМ на общую сумму 6 949,6 тыс. руб.

6.2.3. **В нарушение** требований подпункта «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ акт № 3 от 23.12.2024 о приемке выполненных работ по форме КС-2, прилагаемый к электронному документу о приемке № 3 от 23.12.2024 по контракту № 2470606441224000028, содержит

подписи не всех членов приемочной комиссии; акт от 26.08.2025 о приемке выполненных работ по форме КС-2, прилагаемый к электронному документу о приемке № 9 от 11.09.2025 по контракту № 2470606441224000019, подписей членов приемочной комиссии не содержит.

6.2.4. В **нарушение** подпункта «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов информация о прекращении обязательств подрядчика, обеспеченных независимой гарантией, и о дате такого прекращения по контрактам №№ 2470606441224000016, 2470606441224000019, 2470606441224000025, 2470606441224000029, 2470606441224000028, 2470606441224000050 в реестре контрактов ЕИС не размещена (документы, подтверждающие размещение информации, не представлены).

6.2.5. В отдельных случаях информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов ЕИС, не направлены для включения в реестр либо направлены с нарушением срока, установленного подпунктом «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов:

- информация и документы о применении мер ответственности к подрядчикам по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019 (претензии № ВН-809/2025-1, № 1950-14/2025 от 30.10.2025), № 2470606441224000016 (претензия № И-1630/2024 от 05.11.2024) по состоянию на 19.11.2025 не размещены;

- информация и документы о списании начисленной и неуплаченной неустойки (штрафа, пени) по контракту № 2470606441224000016 (уведомление № 6 от 07.04.2025) направлены с **нарушением** установленного срока на 1 рабочий день.

6.2.6. Надлежащий контроль за выгрузкой и своевременным размещением в реестре контрактов ЕИС сведений об оплате выполненных работ по контракту № 2470606441224000033, принятых по акту о приемке № 4 от 04.04.2025 (платежные поручения №№ 322201, 322251 от 09.04.2025), в целях соблюдения требований пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком не осуществлен.

6.3. ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства»:

6.3.1. В **нарушение** пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением № 1 от 05.12.2024 к контракту № 2470312595624000101 объем услуг по предоставлению лицензий на право использования сертифицированной системы управления базами данных и сертифицированной операционной системы, предусмотренный контрактом, увеличен более чем на 10% (на 21,7%), в том числе лицензий на право использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» - в 2,6 раза, при увеличении цены контракта на 9,9%.

6.3.2. Дополнительные соглашения № 1 от 21.06.2024 и № 3 от 10.09.2024 к контракту № 2470312595624000037, дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2024 к контракту № 2470312595624000093, предусматривающие увеличение количества поставляемого товара при увеличении пропорционально цены контракта, заключены с **нарушением** части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно, после истечения установленного

контрактом срока исполнения поставщиком обязательства по поставке товара, а также после исполнения сторонами обязательств по поставке, приемке и оплате товара, предусмотренных контрактом (дополнительные соглашения № 3 от 10.09.2024, № 1 от 18.12.2024 к контрактам №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093). Дополнительное соглашение № 1 от 21.06.2024 к контракту № 2470312595624000037 заключено в день, когда заказчиком должно быть исполнено обязательство по оплате поставленного товара, при этом оплата произведена с нарушением установленного срока. Дополнительным соглашением № 3 от 10.09.2024 к контракту № 2470312595624000037 продлен срок исполнения контракта в отсутствие правовых оснований для его изменения, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Вследствие допущенных нарушений поставка дополнительного количества товара в соответствии с дополнительными соглашениями фактически осуществлена с нарушением установленного контрактами срока поставки.

6.3.3. В ходе ЭАМ установлено, что согласно размещенному в ЕИС техническому акту № 3 от 13.08.2025 о приемке результатов оказания услуг по 3 этапу исполнения контракта № 2470312595624000084, составленному и подписанному членами приемочной комиссии, услуги оказаны не в полном соответствии с требованиями Описания объекта закупки.

ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» претензионная работа в отношении исполнителя в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 3 этапу исполнения контракта № 2470312595624000084 в период с 13.08.2025 и на дату проверки не осуществлялась. **В нарушение** части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ меры ответственности к исполнителю по контракту № 2470312595624000084 на дату проверки не применены.

Нарушение устранено в ходе ЭАМ: в адрес исполнителя по контракту № 2470312595624000084 направлено требование № 01-03/2244-2025 от 12.11.2025 об уплате неустойки (штрафа) на сумму 5 тыс. руб.

6.3.4. **В нарушение** части 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 6.2.2 контракта № 2470312595624000037 по факту просрочки исполнения поставщиком обязательства по поставке товара, предусмотренного контрактом, заказчиком начислен штраф в размере 100 тыс. руб., а не пеня. Сумма начисленной неустойки занижена на 17 тыс. руб.

6.3.5. Приемка оказанных услуг по 4 этапу исполнения контракта № 2470312595624000030 осуществлена заказчиком с **нарушением** порядка приемки, установленного в разделе 6 контракта, разделе 4 Описания объекта закупки (приложение № 1 к контракту).

6.3.6. **В нарушение** подпункта «а» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, когда приемочная комиссия не включает членов, не являющихся работниками заказчика, документы о приемке по контрактам №№ 2470312595624000037, 2470312595624000093, 2470312595624000101 не подписаны усиленными электронными подписями членов приемочной комиссии.

В нарушение подпункта «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ размещенные в ЕИС мотивированные отказы от приемки (подписания документов о приемке) результатов оказания услуг по соответствующим этапам исполнения контрактов №№ 2470312595624000016, 2470312595624000021, 2470312595624000084 не содержат подписей членов приемочной комиссии.

6.3.7. Оплата поставленного товара по контракту № 2470312595624000037, оказанных услуг по 3 этапу исполнения контракта № 2470312595624000016 произведена соответственно платежным поручением № 598731 от 27.06.2024, платежным поручением № 753250 от 29.08.2024, т.е. **с нарушением** срока, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями контрактов, на 4 и 2 рабочих дня соответственно.

6.3.8. В отдельных случаях информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов ЕИС, не направлены для включения в реестр либо направлены с нарушением сроков, установленных соответственно частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпунктами «а» и «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов:

- информация и документы о размере уплаченных неустоек (штрафов, пеней) по контракту № 2470312595624000016 (платежные поручения № 1673 от 19.12.2024, № 139 от 20.02.2025) на дату проверки в реестре контрактов ЕИС не размещены; нарушение устранено в ходе ЭАМ;

- информация и документы о применении мер ответственности к исполнителю по контракту № 2470312595624000084 (требование № 01-03/2244-2025 от 12.11.2025 об уплате неустойки (штрафа), направленное в ходе проведения ЭАМ), о размере уплаченной в соответствии с требованием № 01-03/2720-2024 от 23.08.2024 неустойки (штрафа) (платежное поручение № 894 от 28.08.2024), о размере списанной неустойки (штрафа) по контракту № 2470312595624000037, начисленной в соответствии с требованием № 01-03/1587-1-2024 от 24.06.2024 (уведомление о списании неустойки (штрафа) № 01-03/2379-2024 от 06.08.2024), документы, подтверждающие уплату и списание неустоек, по состоянию на 21.11.2025 в реестре контрактов ЕИС не размещены;

- в ряде случаев информация и документы о приемке поставленного товара (оказанной услуги), отдельных этапов исполнения контракта, а также применении мер ответственности в случае нарушения исполнителем условий контракта направлены для включения в реестр контрактов ЕИС **с нарушением** установленных сроков от 1 до 18 рабочих дней.

6.3.9. Информация об уплате исполнителем начисленных неустоек (пеней) по контракту № 2470312595624000021 либо списании начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) на дату проверки в реестре контрактов ЕИС не размещена.

В соответствии с запросом КСП ЛО ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» письмом исх. № 01-03/2277-2025 от 14.11.2025 представлена информация о произведенном в ходе ЭАМ списании начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) по контракту № 2470312595624000021

(уведомление о списании неустойки № 01-03/2231-2025 от 11.11.2025); информация и документы о размере списанной неустойки 14.11.2025 размещены в реестре контрактов ЕИС.

6.3.10. В **нарушение** подпункта «г» пункта 11 Правил ведения реестра контрактов на дату проверки информация об исполнении контрактов №№ 2470312595624000021, 2470312595624000037, размещенная в реестре контрактов ЕИС, не содержит информацию о прекращении обязательств исполнителя (поставщика), обеспеченных независимой гарантией, и дату такого прекращения; нарушения устранены в ходе ЭАМ.

Информация о прекращении обязательств исполнителя (поставщика), обеспеченных независимой гарантией, по контрактам №№ 2470312595624000030, 2470312595624000093 направлена заказчиком для включения в реестр контрактов ЕИС с **нарушением** срока, установленного абзацем 4 подпункта «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов, на 20 и 10 рабочих дней соответственно.

Рекомендации и предложения

1. Комитету государственного заказа Ленинградской области обеспечить своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Ленинградской области о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Ленинградской области в целях их приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства.

2. Заказчикам Ленинградской области при осуществлении закупок для обеспечения нужд Ленинградской области:

2.1. Не допускать:

2.1.1. заключения дополнительного соглашения к контракту, предусматривающего изменение существенных условий контракта (увеличение цены контракта, продление срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, установление условия о выплате аванса), в отсутствие предоставленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения контракта, предусмотренного требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта;

2.1.2. включения в контракт условия о предоставлении нового обеспечения исполнения контракта, предусмотренного требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, после заключения дополнительного соглашения к контракту;

2.1.3. принятия для целей обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств обеспечения, не соответствующего требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

2.1.4. обеспечения исполнения контракта одновременно двумя независимыми гарантиями (на часть суммы обеспечения), либо независимой гарантией и внесением денежных средств (на часть суммы обеспечения), в том

числе при предоставлении нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

2.1.5. изменения в ходе исполнения контракта размера обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренного контрактом.

2.2. При определении стоимости обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, принимать во внимание разъяснения Минфина России по вопросу обеспечения обязательств, предусмотренных контрактом, изложенные в письмах № 24-06-09/2607 от 16.01.2025, № 24-06-06/116286 от 21.11.2024, № 24-06-07/87436 от 13.09.2024.

2.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта в ходе его исполнения (при поэтапном исполнении контракта) осуществлять с соблюдением требований частей 7.1, 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.4. Обеспечивать:

2.4.1. установление требования обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки (документации о закупке, приглашении), проекте контракта при осуществлении закупок путем проведения конкурса или электронного аукциона в случае, когда расчеты по контракту не подлежат казначейскому сопровождению;

2.4.2. соблюдение требований пункта 1 части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ в части установления обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки (документации о закупке, приглашении), проекте контракта, а также в заключенном контракте в случае, если контрактом предусмотрена выплата аванса, в размере не менее чем размер аванса;

2.4.3. соблюдение требований части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ при внесении в контракты изменений в случае, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта;

2.4.4. изменение дополнительным соглашением размера обеспечения исполнения контракта при изменении такого обеспечения в соответствии с требованиями части 1.3 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

2.4.5. надлежащее обеспечение исполнения контракта (обеспечение гарантийных обязательств) на весь период исполнения контракта (гарантийных обязательств), в том числе в случае его изменения (продления) в соответствии с законодательством о контрактной системе (продления гарантийного срока, например, в случае поставки дополнительного количества товара), а также просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;

2.4.6. установление в контракте порядка и срока предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательств;

2.4.7. реализацию мер, предусмотренных частью 7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, пунктом 12 Правил ведения реестра независимых гарантий при наличии оснований для отказа заказчика в принятии независимой гарантии (информирование лица, предоставившего независимую гарантию, об отказе в принятии независимой гарантии, формирование и включение в реестр независимых гарантий ЕИС сведений об отказе в принятии независимой гарантии);

2.4.8. своевременное ведение претензионной работы и применение мер ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств; своевременное принятие указанных мер при расторжении контрактов, в том числе по соглашению сторон, а также в целях обеспечения возможности применения механизма взыскания неустоек (штрафов, пеней) из обеспечения исполнения контракта, предоставленного заказчику;

2.4.9. соблюдение требований законодательства о контрактной системе при применении мер ответственности к поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств, предусмотренных контрактом;

2.4.10. применение механизма взыскания неустоек (штрафов, пеней) из обеспечения исполнения контракта, предоставленного заказчику;

2.4.11. направление для включения в реестр контрактов ЕИС в установленные сроки информации о прекращении обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспеченных независимой гарантией, и о дате такого прекращения;

2.4.12. включение в контракты, заключаемые по результатам проведения конкурсов или электронных аукционов и предусматривающие авансирование, обязательного условия, предусмотренного требованиями пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, о порядке оплаты товаров, работ, услуг с учетом положений части 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ;

2.4.13. установление в контракте, предусматривающем авансирование, порядка оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги с учетом срока осуществления авансовых платежей по контракту;

2.4.14. внесение изменений в контракты с соблюдением требований части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;

2.4.15. соблюдение порядка осуществления приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, установленного контрактом;

2.4.16. соблюдение установленного пунктом 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ порядка оформления результатов приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги в случае создания приемочной комиссии;

2.4.17. соблюдение срока оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, установленного частью 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями контракта;

2.4.18. списание начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) по контракту в порядке и случаях, предусмотренных Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней);

2.4.19. направление для включения в реестр контрактов ЕИС в установленные сроки информации и документов, подлежащих включению в реестр: информации и документов об изменении контракта, о применении мер ответственности в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, о размере уплаченных неустоек (штрафов, пеней), о размере списанных заказчиком неустоек (штрафов, пеней), документов, подтверждающих уплату и списание неустоек, информации и документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

2.5. Предусматривать в контракте условие об обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, предоставить до окончания срока действия независимой гарантии новое обеспечение со сроком действия, соответствующим требованиям части 3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, с установлением срока предоставления такого обеспечения.

2.6. В целях минимизации рисков невозврата аванса в случае неисполнения контракта предусматривать в контракте промежуточный срок, в который поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должны быть исполнены обязательства на сумму аванса.

3. ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»:

3.1. Обеспечить применение мер ответственности к подрядчику по контракту № 2470315158624000003 в связи с ненадлежащим исполнением обязательства, предусмотренного пунктом 4.1 контракта, по формированию и размещению в ЕИС документа о приемке с представлением в КСП ЛО копий подтверждающих документов.

3.2. Представить информацию о принятых мерах по взысканию с подрядчика по контракту № 24703151586240000120012 в судебном порядке обеспечения исполнения контракта в размере аванса с направлением копий подтверждающих документов.

3.3. Принять меры по устранению выявленных нарушений в части неразмещения в реестре контрактов ЕИС информации о прекращении обязательств подрядчика, обеспеченных независимой гарантией, по контрактам №№ 2470315158624000003, 2470315158624000002, 2470315158624000004 и о дате такого прекращения, а также недопущению указанных нарушений в дальнейшем.

3.4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в положение о контрактной службе ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», предусмотрев мероприятия, обеспечивающие своевременное ведение претензионно-исковой работы и применение мер ответственности к

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, а также иных обязательств, предусмотренных контрактами, с представлением в КСП ЛО копий подтверждающих документов.

3.5. Усилить контроль за предоставлением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в ходе исполнения контрактов обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с условиями контрактов.

3.6. Рассмотреть совместно с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области вопрос о наделении ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия» полномочиями администратора доходов областного бюджета Ленинградской области в целях осуществления начисления, отражения в бухгалтерском учете, взыскания, списания неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», либо о разработке правового акта ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», определяющего порядок взаимодействия учреждения (как заказчика) с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области (как администратором доходов областного бюджета Ленинградской области) в целях осуществления списания начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, заключенным ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия», с представлением в КСП ЛО копий подтверждающих документов.

3.7. Обеспечить утверждение плана мероприятий по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений, выявленных в ходе ЭАМ, предусмотрев меры, указанные в подпунктах 2.1.1, 2.1.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.8, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.17 - 2.4.19 рекомендаций и предложений, изложенных в настоящем заключении. Копию плана мероприятий представить в КСП ЛО в срок **до 01.03.2026**. Обеспечить надлежащий контроль за реализацией плана мероприятий.

3.8. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допустившим выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

3.9. Информацию и документы в соответствии с подпунктами 3.1 – 3.8 рекомендаций и предложений, изложенных в настоящем заключении, представить в КСП ЛО в срок **до 01.03.2026**.

4. ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства»:

4.1. Обеспечить устранение и недопущение в дальнейшем (с представлением в КСП ЛО копий подтверждающих документов) нарушений в части:

- неприменения мер ответственности к подрядчику по контракту № 2470606441224000028 в связи с просрочкой выполнения работ по разработке рабочей документации по объекту;

- неосуществления списания начисленных и неуплаченных неустоек (пеней) по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019;

- неразмещения в реестре контрактов ЕИС информации о прекращении обязательств подрядчика, обеспеченных независимой гарантией, и о дате такого прекращения по контрактам №№ 2470606441224000016, 2470606441224000019, 2470606441224000025, 2470606441224000029, 2470606441224000028, 2470606441224000050;

- неразмещения в реестре контрактов ЕИС информации и документов о применении мер ответственности к подрядчикам по контрактам №№ 2470606441224000028, 2470606441224000019, 2470606441224000016 (с учетом информации, изложенной в настоящем заключении).

4.2. Обеспечить утверждение плана мероприятий по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений, выявленных в ходе ЭАМ, предусмотрев меры, указанные в подпунктах 2.1.1 - 2.1.5, 2.3, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.10, 2.4.11, 2.4.16, 2.4.19 рекомендаций и предложений, изложенных в настоящем заключении. Копию плана мероприятий представить в КСП ЛО в срок **до 01.03.2026**. Обеспечить надлежащий контроль за реализацией плана мероприятий.

4.3. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допустившим выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4.4. Информацию и документы в соответствии с подпунктами 4.1 – 4.3 рекомендаций и предложений, изложенных в настоящем заключении, представить в КСП ЛО в срок **до 01.03.2026**.

5. ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства»:

5.1. Обеспечить устранение и недопущение в дальнейшем (с представлением в КСП ЛО копий подтверждающих документов) нарушений в части ненаправления для включения в реестр контрактов ЕИС информации и документов о применении мер ответственности к исполнителю по контракту № 2470312595624000084, информации и документов о размере уплаченной неустойки (штрафа), о размере списанной неустойки (штрафа) по контракту № 2470312595624000037 (с учетом информации, изложенной в настоящем заключении).

5.2. Обеспечить утверждение плана мероприятий по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений, выявленных в ходе ЭАМ, предусмотрев меры, указанные в подпунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.4.3, 2.4.5 - 2.4.11, 2.4.14 - 2.4.19 рекомендаций и предложений, изложенных в настоящем заключении. Копию плана мероприятий представить в КСП ЛО в срок **до 01.03.2026**. Обеспечить надлежащий контроль за реализацией плана мероприятий.

5.3. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допустившим выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

5.4. Информацию и документы в соответствии с подпунктами 5.1 – 5.3 рекомендаций и предложений, изложенных в настоящем заключении, представить в КСП ЛО в срок до **01.03.2026**.

6. ГКУ «Градостроительное развитие территорий Ленинградской области», ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения», ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района», ГБУ ЛО «Центр «Молодежный», ГБУ ЛО «Ивангородский центр для детей с ОВЗ» принять меры по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявленных в ходе ЭАМ, с учетом информации, изложенной в настоящем заключении.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Ленинградской области



Д.В. Гаршин

Сведения об обеспечении исполнения контрактов, предоставленном при заключении и в ходе исполнения контрактов
(заказчик – ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»)

№	Наименование показателя	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Цена контракта с учетом внесения в контракт изменений, тыс. руб.*		Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)*	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений*
1		12.04.2024 № 003/2024-PPP	2470315 1586240 00003	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Я. Я. Пантелеева", в составе: 1. Главный дом (1863-1871), 2. Флигель (1863-1871), расположенного по адресу Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 6, д. 8	29 768,5	29 768,5	38 933,7	37 548,6	7 780,1	нет / нет***	01.12.2024 / 11.04.2025
	Реквизиты дополнительного соглашения (д/с), которым внесены изменения						д/с № 1 от 21.11.2024	д/с № 3 от 10.04.2025			д/с № 1 от 21.11.2024
	Основание внесения изменений в контракт**						пп. "б" п.п. 1, 2 Постановления № 680	пп. "б" п.п. 1, 2 Постановления № 680			п. 9 части 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ
	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					2 976,9 (10%) независимая гарантия № 1563400-2024-VBC от 10.04.2024	3 428,3 независимая гарантия № M00-24-22482/EG от 31.10.2024	-			3 428,3 независимая гарантия № M00-24-22482/EG от 31.10.2024
2		15.04.2024 № 004/2024-PPP	2470315 1586240 00002	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории (памятников Великой Отечественной войны), расположенных на территории Волховского района Ленинградской области	25 244,7	25 000,0	27 451,1	-	2 451,1	нет / нет	27.11.2024 / нет
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 1 от 22.11.2024				
	Основание внесения изменений в						п. 1.3 части 1				

[illegible]

№	Наименование показателя	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Цена контракта с учетом внесения в контракт изменений, тыс. руб.*		Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)*	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений*
	изменения									10.12.2024	
	Основание внесения изменений в контракт									пп. "д" п. 1 Постановления № 680	
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					19 204,5 (10%) независимая гарантия № 961546- БГ/24 от 25.06.2024				не предоставле но	
5		23.08.2024 № 011/202 4-PPP	2470315 1586240 00017	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Водонапорная башня", расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, город Гатчина, улица Чкалова, дом 2Б	93 511,2	87 432,9	-	-	0,0	нет / 9 267,9 (10,6%)	01.12.2025 / нет
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения									д/с № 1 от 20.12.2024	
	Основание внесения изменений в контракт									пп. "д" п. 1 Постанов- ления № 680	
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					9 351,1 (10%) независимая гарантия № 1721354 от 21.08.2024				- ****	
6		09.09.2024 № 016/202 4-PPP	2470315 1586240 00022	Проведение работ по реставрации монументальной живописи и иконостаса объекта культурного наследия федерального значения "Собор Петра и Павла" сер. XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул.	316736,8	284 999,0	-	-	0,0	нет / 75 866,7 (26,62%)	01.11.2026 / нет

№	Наименование показателя	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Цена контракта с учетом внесения в контракт изменений, тыс. руб.*		Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)*	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений*
				Соборная, д. 26							
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения									д/с № 1 от 25.12.2024	
	Основание внесения изменений в контракт									пп. "д" п. 1 Постановления № 680	
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					31 673,7 (10%) независимая гарантия № IGR24/UDN W/0423 от 04.09.2024				75 866,7 изменение к независимой гарантии № IGR24/UDN W/0423 от 25.12.2024	
7		12.04.2024 № 002/202 4-PPP	2470315 1586240 00004	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории (памятников Великой Отечественной войны), расположенных на территории Гатчинского, Ломоносовского, Тосненского, Приозерского районов Ленинградской области	27 373,9	27 000,0	27 001,3	-	1,3	нет / нет	04.11.2024 / 25.11.2024
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 2 от 22.11.2024				д/с № 1 от 10.10.2024
	Основание внесения изменений в контракт						п. 1.3 части 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ				п. 9 части 1 статьи 95 ФЗ № 44-ФЗ
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа,					2 737,4 (10%) независимая гарантия № 1572070-	- ****				- ****

№	Наименование показателя	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Цена контракта с учетом внесения в контракт изменений, тыс. руб.*		Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)*	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений*
	предоставленного в целях ОИК					2024-VBC от 08.04.2024					

* в отношении контрактов, находящихся на стадии исполнения, изменения условий контрактов указаны **на дату проверки**
** подпункт пункт часть статья нормативного правового акта, являвшегося правовым основанием для внесения изменений в контракт (согласно дополнительному соглашению к контракту)
*** здесь и далее в таблице - соответствующее условие (изменение условия) контракта не предусмотрено при заключении контракта (в ходе исполнения контракта – на дату проверки)
**** исполнение контракта обеспечивается независимой гарантией, предоставленной при заключении контракта
***** исполнение контракта обеспечивается ранее предоставленной в ходе исполнения контракта независимой гарантией на сумму аванса

**Сведения о предоставленном обеспечении гарантийных обязательств по контрактам,
заключенным ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов культурного наследия»***

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения гарантийных обязательств (ОГО) согласно извещению, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК)	Предоставлено ОГО		
						Способ ОГО	Сумма ОГО, тыс. руб.	Номер и дата документа, предоставленного в целях ОГО
1	12.04.2024 № 003/2024-PPP	2470315158624000003	Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Я. Я. Пантелеева", в составе: 1. Главный дом (1863-1871), 2. Флигель (1863-1871), расположенного по адресу Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, г. Ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 6, д. 8	29 768,5	2 381,5 (8%)	независимая гарантия	2 381,5	№ 11KY4X от 10.04.2025
2	15.04.2024 № 004/2024-PPP	2470315158624000002	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории (памятников Великой Отечественной войны), расположенных на территории Волховского района Ленинградской области	25 244,7	2 019,6 (8%)	независимая гарантия	2 019,6	№ 0WRI4X от 25.12.2024
3	12.04.2024 № 002/2024-PPP	2470315158624000004	Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия - памятников военной истории (памятников Великой Отечественной войны), расположенных на территории Гатчинского, Ломоносовского, Тосненского, Приозерского районов Ленинградской области	27 373,9	2 189,9 (8%)	независимая гарантия	2 189,9	№ 0WRH5X от 25.12.2024

* сведения указаны в отношении контрактов, исполнение которых завершено

Приложение № 3

**Сведения об обеспечении исполнения контрактов, предоставленном при заключении и в ходе исполнения контрактов
(заказчик – ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства»)**

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Цена контракта с учетом внесения изменения дополнительным соглашением тыс. руб.** Реквизиты дополнительного соглашения об увеличении цены	Сумма ОИК, предоставленного в ходе исполнения контракта, тыс. руб. Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)* Реквизиты дополнительного соглашения об установлении аванса	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений* Реквизиты дополнительного соглашения об изменении срока
1	06.03.2024 № 0014	2470606 4412240 00016	Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Сосенка на км 75+233 автомобильной дороги «Зуево-Новая Ладога» в Киришском районе Ленинградской области	41 173,8	41 173,8	4 117,4 (10%) независимая гарантия № 07111-24-10 от 04.03.2024	45 290,0 д/с № 2 от 19.12.2024	не предоставлено	4 116,2	нет*** / нет	31.10.2024 / нет
2	13.03.2024 № 0016	2470606 4412240 00019	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Бокситогорском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах». ЛОТ 2, а/д «Б. Двор – Пакшеево – Самойлово»	35 301,9	35 301,9	3 530,2 (10%) независимая гарантия № 911956-БГ/24 от 07.03.2024	37 269,5 д/с № 4 от 03.07.2025	3 726,9 изменения от 03.07.2025 к независимой гарантии № 911956-БГ/24	3 526,6	нет / нет	31.07.2025 / нет
							38 828,5 д/с № 5 от 20.08.2025	3 882,8 изменения от 19.08.2025 к независимой гарантии			

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Цена контракта с учетом внесения изменения дополнительным соглашением тыс. руб. ** Реквизиты дополнительного соглашения об увеличении цены	Сумма ОИК, предоставленного в ходе исполнения контракта, тыс. руб. Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)* Реквизиты дополнительного соглашения об установлении аванса	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений* Реквизиты дополнительного соглашения об изменении срока
								№ 911956-БГ/24			
3	27.03.2024 № 0021	2470606 4412240 00025	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах»	282 174,7	282 174,7	28 217,5 (10%) независимая гарантия № 9991-4R1/1501255 от 12.03.2024	286 736,8 д/с № 2 от 15.05.2024	не предоставлено	28 217,5	нет / нет	30.06.2025 / нет
4	29.03.2024 № 0024	2470606 4412240 00029	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к санаторию «Сяргы» во Всеволожском районе Ленинградской области	107 095,8	107 095,8	10 709,6 (10%) независимая гарантия № 51106/GI/240321 от 21.03.2024	107 201,7 д/с № 3 от 25.12.2024	10 709,6 независимая гарантия № 51106/GI/240321 от 21.03.2024	105,9	нет / нет	31.07.2025 / нет
5	12.04.2024 № 0026	2470606 4412240 00028	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт моста через реку Градуевка на автомобильной дороге «Звереве – Малиновка» в Выборгском районе Ленинградской области»	24 353,0	24 353,0	2 435,3 (10%) независимая гарантия № 9991-4R1/1564535	26 473,3 д/с № 3 от 17.12.2024	2 435,3 независимая гарантия № 9991-4R1/1564535 от 04.04.2024	2 120,2	нет / нет	05.12.2024 / нет

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Цена контракта с учетом внесения изменения дополнительным соглашением тыс. руб. ** Реквизиты дополнительного соглашения об увеличении цены	Сумма ОИК, предоставленного в ходе исполнения контракта, тыс. руб. Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)* Реквизиты дополнительного соглашения об установлении аванса	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений* Реквизиты дополнительного соглашения об изменении срока
						от 04.04.2024					
6	31.05.2024 № 6/н	2470606 4412240 00033	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Выборгском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 3. Ленинградская область, Выборгский район, автомобильная дорога общего пользования Зеленогорск-Приморск-Выборг» в границах п. Глебычево»	117 782,9	117 782,9	11 778,3 (10%) независимая гарантия № LM130524597 6 от 24.05.2024	126 116,1 д/с № 3 от 18.08.2025	12 611,6 изменения от 15.08.2025 к независимой гарантии № LM1305245976	8 333,2	нет / нет	31.10.2026 / нет
7	03.07.2024 № 130957	2470606 4412240 00040	Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах." Лот 3, а/д "Гатчина - Ополье" н.п. Молосковицы, н.п. Каложицы	47 324,2	47 324,2	4 732,4 (10%) независимая гарантия № LM2106249935 от 28.06.2024	52 056,6 д/с № 3 от 22.07.2025	5 205,7 изменения от 17.07.2025 к независимой гарантии № LM2106249935	4 732,4	нет / нет	30.09.2026 / нет
8	03.07.2024 № 130960	2470606 4412240 00042	Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах." Лот 2, а/д "Гатчина - Ополье" н.п. Большая Вруда, н.п.	103 847,5	103 847,5	10 384,8 (10%) независимая гарантия № LM1106249101	114 232,3 д/с № 3 от 18.07.2025	11 423,2 изменения от 09.07.2025 к независимой гарантии №	10 384,8	нет / нет	30.09.2026 / нет

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Цена контракта с учетом внесения изменения дополнительным соглашением тыс. руб. ** Реквизиты дополнительного соглашения об увеличении цены	Сумма ОИК, предоставленного в ходе исполнения контракта, тыс. руб. Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)* Реквизиты дополнительного соглашения об установлении аванса	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений* Реквизиты дополнительного соглашения об изменении срока
			Смердовицы, н.п. Овинцево			от 28.06.2024		LM1106249101			
9	03.07.2024 № 3909	2470606 4412240 00041	Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Волосовском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах." Лот 1, а/д "Гатчина - Ополье" н.п. Кикерино, н.п. Роговицы, н.п. Восемьдесят первый километр	93 946,2	93 946,2	9 394,6 (10%) независимая гарантия № LM2106249921 от 28.06.2024	102 107,5 д/с № 2 от 28.03.2025 103 340,8 д/с № 4 от 11.08.2025	не предоставлено 10 334,1 изменения от 08.08.2025 к независимой гарантии №LM2106249921	9 394,6	нет / нет	30.09.2026 / нет
10	26.07.2024 № 4614	2470606 4412240 00050	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах». А/д «Дублер путепровода Тосно»: н.п. Тосно	26 384,4	26 252,5	2 638,4 (10%) независимая гарантия № 9991-4S1/1672897 от 23.07.2024	28 877,7 д/с № 2 от 19.12.2024	не предоставлено	2 625,2	нет / нет	15.11.2025 / нет
11	09.08.2024 № 5022	2470606 4412240 00054	Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Ижора на автомобильной дороге «Красное Село-Гатчина-Павловск» на км 21+307 в Гатчинском районе Ленинградской	143 191,0	143 191,0	14 319,1 (10%) независимая гарантия №	157 510,1 д/с № 2 от 29.07.2025	15 751,0 изменения от 28.07.2025 к независимой	14 319,1	нет / нет	10.10.2025 / нет

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Цена контракта с учетом внесения изменения дополнительным соглашением тыс. руб.** Реквизиты дополнительного соглашения об увеличении цены	Сумма ОИК, предоставленного в ходе исполнения контракта, тыс. руб. Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)* Реквизиты дополнительного соглашения об установлении аванса	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений* Реквизиты дополнительного соглашения об изменении срока
			области»			IGR24/DUNW/1163 от 05.08.2024		гарантии № IGR24/DUNW/1163 7 944,7 изменения от 22.08.2025 к независимой гарантии № IGR24/DUNW/1163			
12	30.01.2024 № 0007	2470606 4412240 00014	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт моста через реку Саба на км 59+631 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Толмачево-а/д Нарва» в Лужском районе Ленинградской области. Автодорожные подходы»	46 237,3	46 237,3	4 623,7 (10%) независимая гарантия № M320779 от 24.01.2024	-	4 623,7 независимая гарантия № M320779 от 24.01.2024	0,0	нет / нет	30.06.2025 / 24.11.2025 д/с № 2 от 14.07.2025
13	23.07.2024 № 33463	2470606 4412240 00046	Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения "Паша – Часовенская – Кайвакса" в Волховском районе, "Подъезд к ст. Паша" в Волховском районе, "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга" в Кировском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах. 3 этап: Ленинградская область, Кировский район,	46 381,9	44 758,5	4 638,2 (10%) независимая гарантия № OONUOX от 22.07.2024	-	не предоставлено	0,0	нет / 13 427,5 (30%) д/с № 1 от 25.12.2024	31.10.2025 / нет

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Цена контракта с учетом внесения изменения дополнительным соглашением тыс. руб. ** Реквизиты дополнительного соглашения об увеличении цены	Сумма ОИК, предоставленного в ходе исполнения контракта, тыс. руб. Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)* Реквизиты дополнительного соглашения об установлении аванса	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений* Реквизиты дополнительного соглашения об изменении срока
			н.п. Мга, а/д "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга"								
14	19.08.2024 № 5307	2470606 4412240 00059	Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Мельничный ручей - Яблоновка - Приладожское" на участке км 13 - км 20 в Приозерском районе Ленинградской области"	508 077,1	508 077,1	50 807,7 (10%) независимая гарантия № БГ-24/0609/5 от 15.08.2024	-	91 567,9 независимая гарантия № 243/2024-РГ00-00/Г300 от 27.12.2024 142 375,6 изменения от 03.02.2025 к независимой гарантии № 243/2024-РГ00-00/Г300	0,0	нет / 142 375,6 (28,02%) д/с № 1 от 25.12.2024	31.10.2026 / нет
15	16.10.2024 № 6528	2470606 4412240 00074	Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: «Реконструкция моста через реку Михалевка на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Комсомольское-Приозерск» в Выборгском районе Ленинградской области»	135 179,1	135 179,1	13 517,9 (10%) независимая гарантия № 55663/GI/241010 от 11.10.2024	-	40 553,7 изменения от 24.12.2024 к независимой гарантии № 55663/GI/241010 изменения от 17.04.2025 к	0,0	нет / 40 553,7 (30%) д/с № 1 от 20.12.2024	01.12.2025 / 01.11.2026 д/с № 3 от 09.04.2025

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Цена контракта с учетом внесения изменения дополнительным соглашением тыс. руб. ** Реквизиты дополнительного соглашения об увеличении цены	Сумма ОИК, предоставленного в ходе исполнения контракта, тыс. руб. Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.*	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)* Реквизиты дополнительного соглашения об установлении аванса	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений* Реквизиты дополнительного соглашения об изменении срока
								независимой гарантии № 55663/GI/ 241010 в части продления срока действия независимой гарантии			
16	25.02.2025 № 95069	2470606 4412250 00002	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах». а/д "Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга" н.п. Шапки, н.п. Надино; а/д "Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки": н.п. Шапки (ул. Железнодорожная, ул. Куковеровой); а/д "Подъезд к дер. Ерзуново" н.п. Ерзуново; а/д "Подъезд к дер. Староселье от автодороги Павлово – Луга" н.п. Староселье	352 035,9	352 035,9	35 203,6 (10%) независимая гарантия № 59747/GI/ 250218 от 19.02.2025	-	48 580,9 изменения от 26.06.2025 к независимой гарантии № 59747/GI/ 250218	0,0	нет / 48 580,9 (13,8%) д/с № 2 от 20.06.2025	15.11.2027 / нет
17	10.06.2025 № 4972	2470606 4412250 00026	Выполнение работ по объекту: "Реконструкция моста через реку Кумбито на км 2+660 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к Октябрьской слободе до шоссе на Кондегу» в Волховском районе Ленинградской области"	105 388,9	105 388,9	10 538,9 (10%) независимая гарантия № LB0506250403 от	-	24 765,9 изменения от 04.08.2025 к независимой гарантии № LB0506250403	0,0	нет / 24 765,9 (23,5%) д/с № 2 от 04.08.2025	30.11.2026 / нет

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Цена контракта с учетом внесения изменения дополнительным соглашением тыс. руб. ** Реквизиты дополнительного соглашения об увеличении цены	Сумма ОИК, предоставленного в ходе исполнения контракта, тыс. руб. Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК	Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб. *	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)* Реквизиты дополнительного соглашения об установлении аванса	Срок (дата) окончания выполнения работ при заключении контракта / внесении изменений* Реквизиты дополнительного соглашения об изменении срока
						05.06.2025					
18	01.04.2025 № 1907	2470606441225000010	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения во Всеволожском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах». Ленинградская область, Всеволожский район: а/д "Осиновая Роща - Магистральная" н.п. Агалатово, н.п. Вартемяги». Лот 1 (н.п. Агалатово)	73 286,1	73 286,1	7 328,6 (10%) независимая гарантия № 1965407-ЭБГ1/25 от 25.03.2025	-	14 657,2 независимая гарантия № 10982537 от 30.05.2025	0,0	нет / 14 657,2 (20%) д/с № 1 от 22.05.2025	15.11.2027 / нет

* в отношении контрактов, находящихся на стадии исполнения, изменения условий контрактов указаны **на дату проверки**

** указаны изменения цены, при которых возникали необеспеченные обязательства либо предоставлено новое ОИК (на дату проверки)

*** здесь и далее в таблице - соответствующее условие (изменение условия) контракта не предусмотрено при заключении контракта (в ходе исполнения контракта – на дату проверки)

**Сведения о предоставленном обеспечении гарантийных обязательств по контрактам,
заключенным ГКУ ЛО «Дирекция дорожного строительства»***

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения гарантийных обязательств (ОГО) согласно извещению, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК)	Предоставлено ОГО		
						Способ ОГО	Сумма ОГО, тыс. руб.	Номер и дата документа, предоставленного в целях ОГО
1	06.03.2024 № 0014	2470606441224000016	Разработка проектной документации и выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт моста через р. Сосенка на км 75+233 автомобильной дороги «Зуево-Новая Ладога» в Киришском районе Ленинградской области	41 173,8	411,7 (1%)	независимая гарантия	411,7	№ 11Ц-С-1871549/24 от 20.12.2024
2	13.03.2024 № 0016	2470606441224000019	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Бокситогорском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах». ЛОТ 2, а/д «Б. Двор – Пакшеево – Самойлово»	35 301,9	353,0 (1%)	независимая гарантия	353,0	№ 374417/ЭГ-2025 от 21.08.2025
3	27.03.2024 № 0021	2470606441224000025	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Приозерском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах»	282 174,7	2 821,7 (1%)	независимая гарантия	2 821,7	№ 7122УМБ-24-Г от 19.12.2024
4	29.03.2024 № 0024	2470606441224000029	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к санаторию «Сяргы» во Всеволожском районе Ленинградской области	107 095,8	1071,0 (1%)	независимая гарантия	1071,0	№ 6761УМБ-24-Г от 29.11.2024
5	12.04.2024 № 0026	2470606441224000028	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт моста через реку Градуевка на автомобильной дороге «Зверево – Малиновка» в Выборгском районе Ленинградской области»	24 353,0	243,5 (1%)	независимая гарантия	243,5	№ 299787/ЭГ-2024 от 13.12.2024

№	Дата заключения и	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Сумма (размер)	Предоставлено ОГО		
6	26.07.2024 № 4614	2470606441224000050	Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (устройство элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Тосненском районе Ленинградской области на участках прохождения в населенных пунктах». А/д «Дублер путепровода Тосно»: н.п. Тосно	26 384,4	263,8 (1%)	независимая гарантия	263,8	№ 3461636 от 18.07.2025

* сведения указаны в отношении контрактов, исполнение которых завершено

Приложение № 5

**Сведения об обеспечении исполнения контрактов, предоставленном при заключении и в ходе исполнения контрактов
(заказчик – ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства»)**

№	Наименование показателя	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Цена контракта с учетом внесения в контракт изменений, тыс. руб.		Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)	Срок (дата) окончания оказания услуг (поставки товара) при заключении контракта / исполнении контракта
1		25.03.2024 № 1145	2470312 5956240 00014	Оказание услуг по сопровождению подсистемы диспетчерской службы скорой медицинской помощи регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения Ленинградской области	11 812,9	11 812,0	12 796,3	-	984,3	нет / нет*	25.03.2025 / 25.04.2025**
	Реквизиты дополнительного соглашения (д/с), которым внесены изменения						д/с № 3 от 10.03.2025	-			
	Сумма (размер) обеспечения исполнения контракта (ОИК), предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК)					информация в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ	-	-			
2		01.04.2024 № 116843	2470312 5956240 00016	Оказание услуг по сопровождению медицинской информационной системы «1С:Медицина.Больница» в медицинских организациях Ленинградской области с применением облачных технологий	13 053,4	13 053,4	14 141,2	-	1 087,8	нет / нет	01.04.2025 / 01.05.2025**
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 6 от 14.03.2025				
	Сумма (размер) ОИК, предоставлен-					информация	-	-			

№	Наименование показателя	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Цена контракта с учетом внесения в контракт изменений, тыс. руб.		Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)	Срок (дата) окончания оказания услуг (поставки товара) при заключении контракта / исполнении контракта
	ного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК)					в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ					
3		18.04.2024 № 123418	2470312 5956240 00021	Оказание услуг по сопровождению регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения Ленинградской области	40 068,4	40 068,4	43 407,4	-	3 339,0	нет / нет	18.04.2025 / 18.05.2025**
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 2 от 17.03.2025				
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					4 006,8 (10%) независимая гарантия №LM260324 0990 от 16.04.2024	не предоставлено с новым сроком действия	-			
4		27.05.2024 № 126650	2470312 5956240 00030	Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Ленинградской области «Региональная геоинформационная система»	6 000,0	5 996,0	6 495,7	-	499,7	нет / нет	27.05.2025 / 27.06.2025**
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 4 от 26.05.2025				
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					599,6 (10%) независимая гарантия №ЭГ-1430970/24	649,6 изменение от 10.06.2025 к независимой гарантии №ЭГ-				

№	Наименование показателя	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Цена контракта с учетом внесения в контракт изменений, тыс. руб.		Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)	Срок (дата) окончания оказания услуг (поставки товара) при заключении контракта / исполнении контракта
						от 17.05.2024	1430970/24				
5		04.06.2024 № 124048	2470312 5956240 00037	Поставка серверов для расширения технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области	222748,8	219 407,5	234 034,7	241 348,3	21 940,8	нет / нет	в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта / нет ***
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 1 от 21.06.2024	д/с № 3 от 10.09.2024			
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					22 274,9 (10%) независимая гарантия № 9991-4R1/1625057 от 22.05.2024	_****	_****			
6		15.10.2024 № 6527	2470312 5956240 00084	Оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «Современное образование Ленинградской области»	37 708,8	37 708,8	37 912,8	-	204,0	нет / нет	16.10.2025 / нет
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 4 от 19.06.2025				
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					3 770,9 (10%) независимая гарантия № 11Ю-С-003616/24 от 09.10.2024	20,4 платежное поручение № 881 от 19.06.2025				

№	Наименование показателя	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Цена контракта при заключении, тыс. руб.	Цена контракта с учетом внесения в контракт изменений, тыс. руб.		Изменение цены контракта относительно исходных условий, тыс. руб.	Сумма (размер) аванса при заключении контракта / внесении изменений, тыс. руб. (% от цены контракта)	Срок (дата) окончания оказания услуг (поставки товара) при заключении контракта / исполнении контракта
7		08.11.2024 № 141587	2470312 5956240 00093	Поставка программно-аппаратных комплексов для защищенной сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области	31 985,7	31 825,7	33 085,1	-	1 259,4	нет / нет	в течение 7 рабочих дней по заявке заказчика / нет
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 1 от 18.12.2024				
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					3 198,6 (10%) независимая гарантия № IGR24/NIB R/6208 от 05.11.2024	- ****				
8		29.11.2024 № 141172	2470312 5956 24 000101	Предоставление лицензий на право использования сертифицированной системы управления базами данных и сертифицированной операционной системы для обеспечения функционирования технологической инфраструктуры электронного правительства	19 991,6	19 991,6	21 985,9	-	1 994,4	нет / нет	в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта / нет
	Реквизиты д/с, которым внесены изменения						д/с № 1 от 05.12.2024				
	Сумма (размер) ОИК, предоставленного при заключении и в ходе исполнения контракта, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК) Наименование и реквизиты документа, предоставленного в целях ОИК					1 999,2 (10%) платежное поручение № 39 от 20.11.2024	не предоставлено				

* здесь и далее в таблице - соответствующее условие (изменение условия) контракта не предусмотрено при заключении контракта (в ходе исполнения контракта)

** в связи с увеличением объема услуг в соответствии с дополнительным соглашением к контракту

*** в соответствии с дополнительным соглашением № 3 от 10.09.2024 продлен срок исполнения контракта с 28.06.2024 по 31.12.2024

**** исполнение контракта обеспечивается предоставленным обеспечением

**Сведения о предоставленном обеспечении гарантийных обязательств по контрактам,
заключенным ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства»***

№	Дата заключения и номер контракта	Реестровый номер контракта	Предмет контракта	Н(М)ЦК, тыс. руб.	Сумма (размер) обеспечения гарантийных обязательств (ОГО) согласно извещению, тыс. руб. (% от Н(М)ЦК)	Предоставлено ОГО		
						Способ ОГО	Сумма ОГО, тыс. руб.	Номер и дата документа, предоставленного в целях ОГО
1	04.06.2024 № 124048	2470312595624000037	Поставка серверов для расширения технологической инфраструктуры электронного правительства Ленинградской области	222 748,8	22 274,9 (10% от Н(М)ЦК)	независимая гарантия	22 274,9	№ 7М-551ГНBY-940 от 07.06.2024
2	08.11.2024 № 141587	2470312595624000093	Поставка программно-аппаратных комплексов для защищённой сети ViPNet 6440 электронного правительства Ленинградской области	31 985,7	3 198,6 (10% от Н(М)ЦК)	независимая гарантия	3 198,6 125,9	№ IGR24/NIBR/6243 от 06.12.2024 № IGR24/NIBR/6267 от 20.12.2024

* сведения указаны в отношении контрактов, исполнение которых завершено
